

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの縮減 4) 工事実施段階での合理化・規制改革等 ⑰建設副産物対策 】

## 再生アスファルト合材の利用


工事名： 仙台空港ターミナル地区第一駐車場外復旧工事 他1件

概要： 舗装工のアスファルト材を再生アスファルト合材にすることにより、舗装工の縮減を図った。

効果：

- ・ 舗装工のアスファルト材の材料費を縮減。  
(縮減額 1,040千円、縮減率約 0.4%)

駐車場復旧箇所断面図

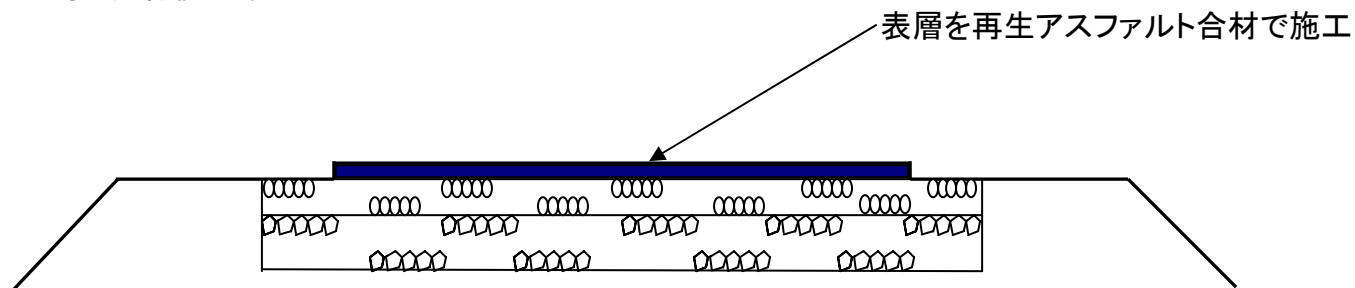

※その他、滑走路本体基層にも再生合材を使用した。
