

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ. 計画・設計・施工の最適化【2】施工の見直し】


重機等の搬入方法の見直し

工事名：一級河川文珠川災害復旧事業


概要：工事用道路による重機等搬入を予定していたが、周辺住民との交渉により、市道の交通制限が可能となり、クレーンによる搬入に変更した。

効果

- 工事用道路を設置した場合に比べ、工事費が安価となり工期も短縮される。
- 988千円(約36%)のコスト改善が図られた。

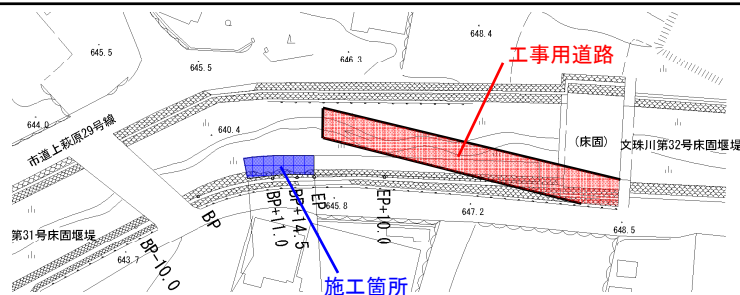

当初 工事用道路 L=46m
金額 約 1,086千円

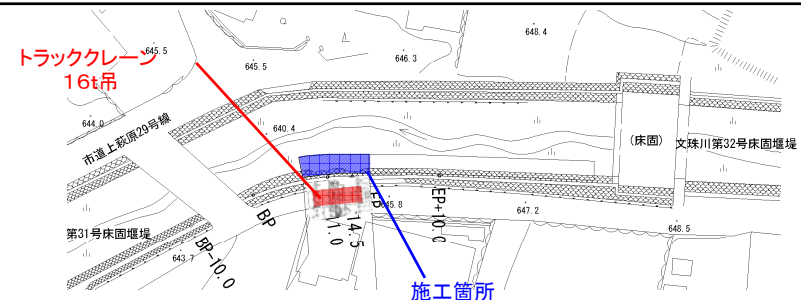

変更 クレーン搬入 一式
金額 約 98千円
(使用重機の小型化による増額分含む)
