

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道3号 鳥栖拡幅
事業主体	九州地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全事業：費用便益比（B/C）=2.1 （経済的純現在価値（B-C）=135億円）、経済的内部収益率（EIRR）=8.1% 残事業：費用便益比（B/C）=6.4 （経済的純現在価値（B-C）=215億円）、経済的内部収益率（EIRR）=27%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	区間b（当該区間／並行区間）について：国道3号鳥栖拡幅（矩方町交差点～商工団地北入口交差点） 当該区間の渋滞損失時間：44.6万人・時間/年 当該区間の渋滞損失削減率：7割削減
		■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	国道3号（矩方町交差点～原町南交差点）：約26km/h向上〔整備前16km/h⇒整備後42km/h〕
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上での踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	国道3号（当該区間）を通る路線バス（34便/日）の利便性向上
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	□ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送率が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		■ 中心市街地内で行う事業である	鳥栖市中心市街地で行う事業
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である	

1. 活力	都市の再生	☐ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		☐ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	☐ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）の位置づけあり	
		☐ 地域高規格道路の位置づけあり	
		☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		☐ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		☐ 現道等における交通不能区間を解消する	
		☐ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		☐ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	☐ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		☐ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		☐ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	
		☐ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	☐ 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての区間に於いて、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		☐ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	☐ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		☐ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できる暮らしの確保	■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	鳥栖市姫方町⇒聖マリア病院 [全事業・残事業] 約3分短縮〔整備前約30分⇒整備後約27分〕：鳥栖広幅（姫方町交差点～商工団地北入口交差点）
3. 安全	安全な生活環境の確保	☐ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	☐ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道3号：緊急輸送道路ネットワーク計画において、第一次緊急輸送道路に位置付けられている
		☐ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		☐ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	

3. 安全	災害への備え	☐ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		☐ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO ₂ 排出削減量：5,006 t-CO ₂ /年（全事業・残事業）
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（当該区間）：国道3号鳥栖拡幅（姫方町交差点～商工団地北入口交差点） 排出削減量：1.4 t-NOx/年、排出削減率：約1割削減（全事業・残事業）
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間（当該区間）：国道3号鳥栖拡幅（姫方町交差点～商工団地北入口交差点） 排出削減量：0.1 t-SPM/年、排出削減率：約1割削減（全事業・残事業）
		☐ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		☐ その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	☐ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		☐ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	☐ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道3号	鳥栖拡幅	2.4km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
34,400～44,300	4	九州地方整備局

① 費 用

	事業費	維持管理費	合 計
基 準 年	令和3年度		
単純合計	104億円	20億円	124億円
うち残事業分	35億円	20億円	55億円
基準年における 現在価値（Ｃ）	112億円	7.8億円	120億円
うち残事業分	32億円	7.8億円	40億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和3年度			
供 用 年	令和7年度			
単年便益 (初年便益)	11億円	0.48億円	0.38億円	12億円
基準年における 現在価値（Ｂ）	219億円	29億円	6.9億円	255億円
うち残事業分	219億円	29億円	6.9億円	255億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	2.1
経済的純現在価値（事業全体）	135億円
経済的内部収益率（事業全体）	8.1%
費用便益比（残事業）	6.4
経済的純現在価値（残事業）	215億円
経済的内部収益率（残事業）	27%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	34,400～44,300	±10%	1.9 ～ 2.3
事業費	104億円	±10%	2.1 ～ 2.2
事業期間	17年	±20%	2.1 ～ 2.1

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	34,400～44,300	±10%	5.8 ～ 7.0
事業費	35億円	±10%	5.9 ～ 7.0
事業期間	3年	±20%	6.2 ～ 6.4

交通状況の変化

様式－3①


事業名：一般国道3号 鳥栖拡幅

(推計時点 R12年) (事業全体・残事業)

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 〔鳥栖拡幅〕 ：2.4km		交通量	[台/日]	25,500	38,100
		走行時間	[分]	7.9	3.5
		走行時間費用	[億円/年]	39.07	25.55
②主な周辺道路	現道(国道3号) ：9.3km	交通量	[台/日]	29,200	31,900
		走行時間	[分]	18	19
		走行時間費用	[億円/年]	99.53	112.24
	九州縦貫道 ：9.6km	交通量	[台/日]	71,700	70,900
		走行時間	[分]	6.4	6.4
		走行時間費用	[億円/年]	90.17	88.99
	国道34号 ：2.6km	交通量	[台/日]	19,900	18,900
		走行時間	[分]	6.1	5.9
		走行時間費用	[億円/年]	22.12	20.61
	(主)久留米基山筑紫野線 ：6.0km	交通量	[台/日]	39,200	39,000
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	92.63	92.34
	(県)鳥栖田代線 ：2.0km	交通量	[台/日]	4,500	1,200
		走行時間	[分]	6.7	6.4
		走行時間費用	[億円/年]	5.79	1.41
	鳥栖市市道 ：2.4km	交通量	[台/日]	6,300	1,800
		走行時間	[分]	4.8	4.7
		走行時間費用	[億円/年]	5.62	1.55
③その他道路合計 ：1,767.6km		走行時間費用	[億円/年]	7,300.03	7,299.60

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,801.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	7,654.96	7,642.29	12.67

事業名：一般国道3号 鳥栖拡幅

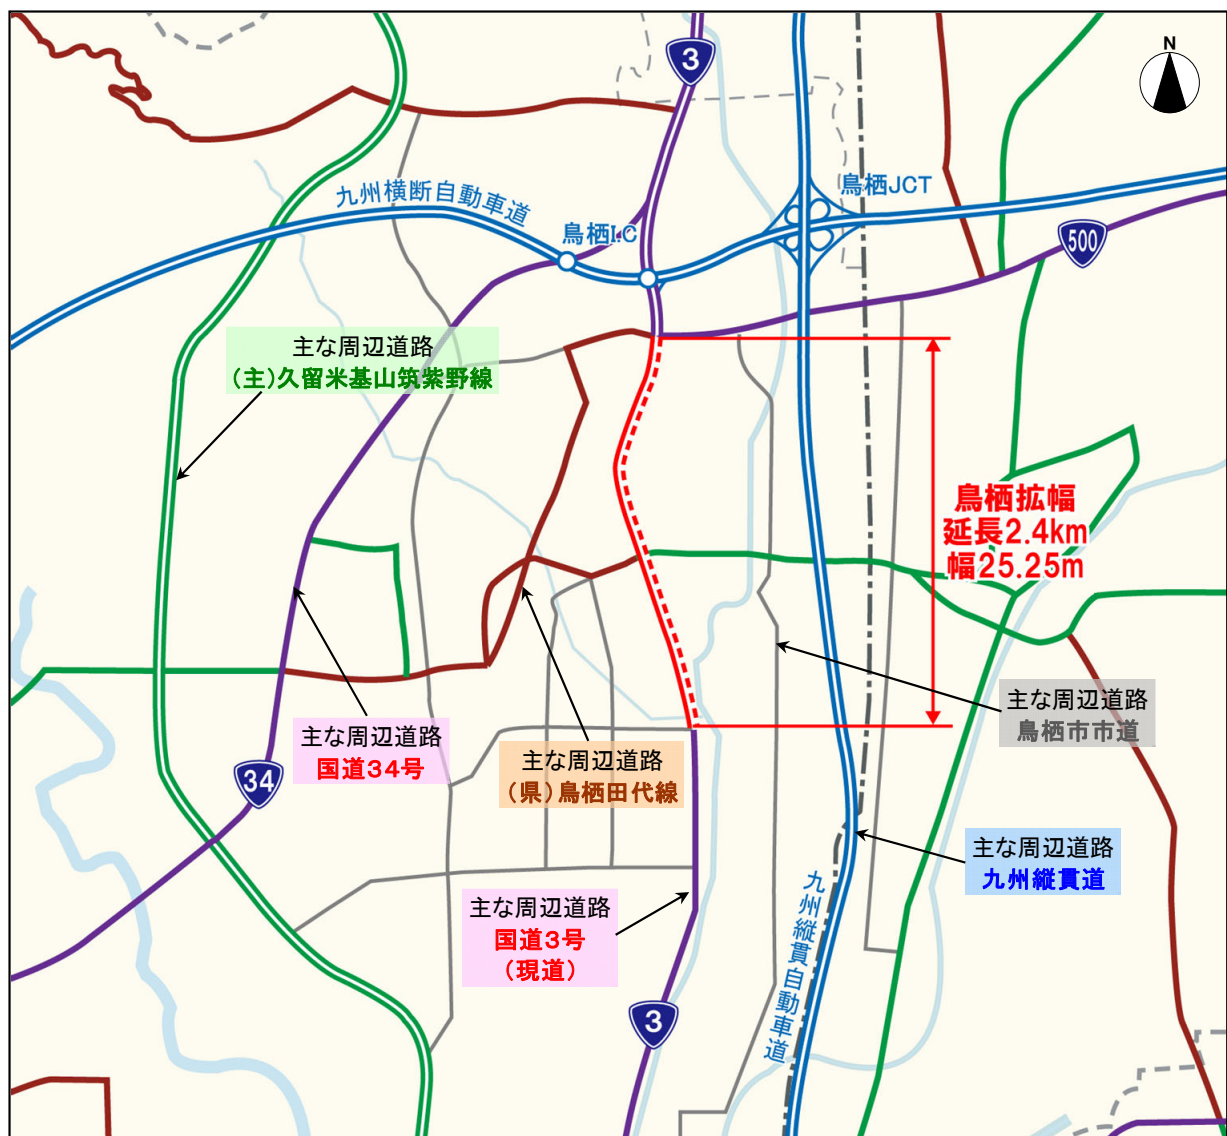

費用便益分析の条件

事業名：一般国道3号 鳥栖拡幅

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	☒
	その他	☐
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	令和3年
	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒
	整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
推計に用いた OD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H22センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐
	その他()	☐
	開発交通量の 考慮	無 有 有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
配分交通量の 推計手法	Q－V式を用いた配分	☐
	転換率式を用いた配分	☐
	Q－V式と転換率式の併用による配分	☒
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	☐
	簡易手法	☐
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	
	その他()	☐
速度設定の 考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	☒
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	
	最終配分の速度 採用理由を記載	☐
	その他()	☐

(3)

9

事業名:一般国道3号 鳥栖拡幅

(4)

項目			チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	☐	
		標準投資パターンを採用	☒	
		その他()	☐	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載		
		当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	☐	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		☒
		考慮する		☐
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	☐
			維持管理費を考慮	☐
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)				
その他				
4. その他				

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道3号 鳥栖拡幅（事業全体）					維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)		
					単価(億円)	延長(km)	単価(億円)
					0.19	2.4	0.45
年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単価	現在	単価	現在
-17年目	H 20	1.6651	101.6	0.41	0.68		
-16年目	H 21	1.6010	100.3	0.10	0.15		
-15年目	H 22	1.5395	98.6	0.38	0.60		
-14年目	H 23	1.4802	97.2	0.38	0.59		
-13年目	H 24	1.4233	96.4	2.01	3.01		
-12年目	H 25	1.3686	96.4	2.91	4.18		
-11年目	H 26	1.3159	98.7	3.34	4.51		
-10年目	H 27	1.2653	100.2	8.62	11.02		
-9年目	H 28	1.2167	100.3	5.86	7.20		
-8年目	H 29	1.1699	100.5	9.85	11.60		
-7年目	H 30	1.1249	100.4	9.86	11.18		
-6年目	R 1	1.0816	101.2	8.09	8.75		
-5年目	R 2	1.0400	101.2	8.65	8.99		
-4年目	R 3	1.0000	101.2	8.57	8.57		
-3年目	R 4	0.9615	101.2	11.86	11.40		
-2年目	R 5	0.9246	101.2	11.85	10.96		
-1年目	R 6	0.8890	101.2	11.02	9.80		
供用開始年次	R 7	0.8548	101.2			0.41	0.35
1年目	R 8	0.8219	101.2			0.41	0.34
2年目	R 9	0.7903	101.2			0.41	0.32
3年目	R 10	0.7599	101.2			0.41	0.31
4年目	R 11	0.7307	101.2			0.41	0.30
5年目	R 12	0.7026	101.2			0.41	0.29
6年目	R 13	0.6756	101.2			0.41	0.28
7年目	R 14	0.6496	101.2			0.41	0.27
8年目	R 15	0.6246	101.2			0.41	0.26
9年目	R 16	0.6006	101.2			0.41	0.25
10年目	R 17	0.5775	101.2			0.41	0.24
11年目	R 18	0.5553	101.2			0.41	0.23
12年目	R 19	0.5339	101.2			0.41	0.22
13年目	R 20	0.5134	101.2			0.41	0.21
14年目	R 21	0.4936	101.2			0.41	0.20
15年目	R 22	0.4746	101.2			0.41	0.19
16年目	R 23	0.4564	101.2			0.41	0.19
17年目	R 24	0.4388	101.2			0.41	0.18
18年目	R 25	0.4220	101.2			0.41	0.17
19年目	R 26	0.4057	101.2			0.41	0.17
20年目	R 27	0.3901	101.2			0.41	0.16
21年目	R 28	0.3751	101.2			0.41	0.15
22年目	R 29	0.3607	101.2			0.41	0.15
23年目	R 30	0.3468	101.2			0.41	0.14
24年目	R 31	0.3335	101.2			0.41	0.14
25年目	R 32	0.3207	101.2			0.41	0.13
26年目	R 33	0.3083	101.2			0.41	0.13
27年目	R 34	0.2965	101.2			0.41	0.12
28年目	R 35	0.2851	101.2			0.41	0.12
29年目	R 36	0.2741	101.2			0.41	0.11
30年目	R 37	0.2636	101.2			0.41	0.11
31年目	R 38	0.2534	101.2			0.41	0.10
32年目	R 39	0.2437	101.2			0.41	0.10
33年目	R 40	0.2343	101.2			0.41	0.10
34年目	R 41	0.2253	101.2			0.41	0.09
35年目	R 42	0.2166	101.2			0.41	0.09
36年目	R 43	0.2083	101.2			0.41	0.09
37年目	R 44	0.2003	101.2			0.41	0.08
38年目	R 45	0.1926	101.2			0.41	0.08
39年目	R 46	0.1852	101.2			0.41	0.08
40年目	R 47	0.1780	101.2			0.41	0.07
41年目	R 48	0.1712	101.2			0.41	0.07
42年目	R 49	0.1646	101.2			0.41	0.07
43年目	R 50	0.1583	101.2			0.41	0.06
44年目	R 51	0.1522	101.2			0.41	0.06
45年目	R 52	0.1463	101.2			0.41	0.06
46年目	R 53	0.1407	101.2			0.41	0.06
47年目	R 54	0.1353	101.2			0.41	0.06
48年目	R 55	0.1301	101.2			0.41	0.05
49年目	R 56	0.1251	101.2	-11.73	-1.47	0.41	0.05
合 計				92.04	111.73	20.45	7.81
単純事業費計				103.77		20.45	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的なパターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道3号 鳥栖拡幅（残事業）				維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)			
				単価(億円)		延長(km)	単価(億円)
				0.19		2.4	0.45
年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-3年目	R 4	0.9615	101.2	11.86	11.40		
-2年目	R 5	0.9246	101.2	11.85	10.96		
-1年目	R 6	0.8890	101.2	11.02	9.80		
供用開始年次	R 7	0.8548	101.2			0.41	0.35
1年目	R 8	0.8219	101.2			0.41	0.34
2年目	R 9	0.7903	101.2			0.41	0.32
3年目	R 10	0.7599	101.2			0.41	0.31
4年目	R 11	0.7307	101.2			0.41	0.30
5年目	R 12	0.7026	101.2			0.41	0.29
6年目	R 13	0.6756	101.2			0.41	0.28
7年目	R 14	0.6496	101.2			0.41	0.27
8年目	R 15	0.6246	101.2			0.41	0.26
9年目	R 16	0.6006	101.2			0.41	0.25
10年目	R 17	0.5775	101.2			0.41	0.24
11年目	R 18	0.5553	101.2			0.41	0.23
12年目	R 19	0.5339	101.2			0.41	0.22
13年目	R 20	0.5134	101.2			0.41	0.21
14年目	R 21	0.4936	101.2			0.41	0.20
15年目	R 22	0.4746	101.2			0.41	0.19
16年目	R 23	0.4564	101.2			0.41	0.19
17年目	R 24	0.4388	101.2			0.41	0.18
18年目	R 25	0.4220	101.2			0.41	0.17
19年目	R 26	0.4057	101.2			0.41	0.17
20年目	R 27	0.3901	101.2			0.41	0.16
21年目	R 28	0.3751	101.2			0.41	0.15
22年目	R 29	0.3607	101.2			0.41	0.15
23年目	R 30	0.3468	101.2			0.41	0.14
24年目	R 31	0.3335	101.2			0.41	0.14
25年目	R 32	0.3207	101.2			0.41	0.13
26年目	R 33	0.3083	101.2			0.41	0.13
27年目	R 34	0.2965	101.2			0.41	0.12
28年目	R 35	0.2851	101.2			0.41	0.12
29年目	R 36	0.2741	101.2			0.41	0.11
30年目	R 37	0.2636	101.2			0.41	0.11
31年目	R 38	0.2534	101.2			0.41	0.10
32年目	R 39	0.2437	101.2			0.41	0.10
33年目	R 40	0.2343	101.2			0.41	0.10
34年目	R 41	0.2253	101.2			0.41	0.09
35年目	R 42	0.2166	101.2			0.41	0.09
36年目	R 43	0.2083	101.2			0.41	0.09
37年目	R 44	0.2003	101.2			0.41	0.08
38年目	R 45	0.1926	101.2			0.41	0.08
39年目	R 46	0.1852	101.2			0.41	0.08
40年目	R 47	0.1780	101.2			0.41	0.07
41年目	R 48	0.1712	101.2			0.41	0.07
42年目	R 49	0.1646	101.2			0.41	0.07
43年目	R 50	0.1583	101.2			0.41	0.06
44年目	R 51	0.1522	101.2			0.41	0.06
45年目	R 52	0.1463	101.2			0.41	0.06
46年目	R 53	0.1407	101.2			0.41	0.06
47年目	R 54	0.1353	101.2			0.41	0.06
48年目	R 55	0.1301	101.2			0.41	0.05
49年目	R 56	0.1251	101.2	-0.86	-0.11	0.41	0.05
合 計				33.87	32.05	20.45	7.81
単純事業費計				34.73		20.45	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的なパターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道3号 鳥栖拡幅（事業全体・残事業）

年次	年度 (基準年) R3	総走行台キロの年次別伸び率 (北九州ブロック)				割戻率 (A)	GDP デフレート	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
		R3																			
供用開始年次	R 7	0.99862	0.98557	1.00479	0.99729	0.8548	101.2	6.19	1.80	2.88	10.87	9.29	0.32	0.06	0.10	0.48	0.41	0.38	0.33	11.73	10.03
1年目	R 8	0.99862	0.98536	1.00477	0.99728	0.8219	101.2	6.19	1.78	2.89	10.85	8.92	0.32	0.06	0.10	0.48	0.39	0.38	0.31	11.71	9.62
2年目	R 9	0.99862	0.98514	1.00475	0.99728	0.7903	101.2	6.18	1.75	2.90	10.83	8.56	0.32	0.06	0.10	0.48	0.38	0.38	0.30	11.69	9.24
3年目	R 10	0.99862	0.98491	1.00473	0.99727	0.7599	101.2	6.17	1.72	2.92	10.81	8.22	0.32	0.06	0.10	0.48	0.36	0.38	0.29	11.66	8.86
4年目	R 11	0.99861	0.98468	1.00470	0.99726	0.7307	101.2	6.16	1.70	2.93	10.79	7.88	0.31	0.06	0.10	0.48	0.35	0.38	0.27	11.64	8.51
5年目	R 12	0.99165	0.99085	0.99720	0.99229	0.7026	101.2	7.05	1.70	3.92	12.67	8.90	0.33	0.32	0.35	1.00	0.70	0.38	0.27	14.05	9.87
6年目	R 13	0.99158	0.99076	0.99720	0.99223	0.6756	101.2	6.99	1.68	3.91	12.58	8.50	0.33	0.32	0.35	1.00	0.67	0.38	0.26	13.96	9.43
7年目	R 14	0.99151	0.99067	0.99719	0.99217	0.6496	101.2	6.93	1.67	3.90	12.50	8.12	0.33	0.32	0.34	0.99	0.64	0.38	0.24	13.86	9.01
8年目	R 15	0.99144	0.99059	0.99718	0.99210	0.6246	101.2	6.91	1.85	4.02	12.79	7.99	0.85	0.49	0.80	2.13	1.33	0.40	0.25	15.32	9.57
9年目	R 16	0.99136	0.99050	0.99717	0.99204	0.6006	101.2	6.85	1.84	4.01	12.70	7.63	0.84	0.48	0.80	2.12	1.27	0.39	0.24	15.21	9.14
10年目	R 17	0.99129	0.99041	0.99717	0.99198	0.5775	101.2	6.80	1.82	4.00	12.61	7.28	0.83	0.48	0.79	2.10	1.21	0.39	0.23	15.11	8.72
11年目	R 18	0.99121	0.99031	0.99716	0.99191	0.5553	101.2	6.74	1.80	3.99	12.53	6.96	0.82	0.47	0.79	2.09	1.16	0.39	0.22	15.00	8.33
12年目	R 19	0.99113	0.99022	0.99715	0.99185	0.5339	101.2	6.68	1.78	3.98	12.44	6.64	0.82	0.47	0.79	2.07	1.11	0.39	0.21	14.90	7.95
13年目	R 20	0.99105	0.99012	0.99714	0.99178	0.5134	101.2	6.62	1.77	3.97	12.35	6.34	0.81	0.46	0.79	2.06	1.06	0.38	0.20	14.79	7.59
14年目	R 21	0.99097	0.99002	0.99713	0.99171	0.4936	101.2	6.56	1.75	3.96	12.26	6.05	0.80	0.46	0.79	2.05	1.01	0.38	0.19	14.69	7.25
15年目	R 22	0.99089	0.98992	0.99712	0.99164	0.4746	101.2	6.50	1.73	3.94	12.17	5.78	0.79	0.45	0.78	2.03	0.96	0.38	0.18	14.58	6.92
16年目	R 23	0.99081	0.98982	0.99712	0.99157	0.4564	101.2	6.44	1.71	3.93	12.09	5.52	0.79	0.45	0.78	2.02	0.92	0.37	0.17	14.48	6.61
17年目	R 24	0.99072	0.98972	0.99711	0.99150	0.4388	101.2	6.38	1.70	3.92	12.00	5.27	0.78	0.44	0.78	2.00	0.88	0.37	0.16	14.37	6.31
18年目	R 25	0.99064	0.98961	0.99710	0.99143	0.4220	101.2	6.32	1.68	3.91	11.91	5.03	0.77	0.44	0.78	1.99	0.84	0.37	0.15	14.27	6.02
19年目	R 26	0.99055	0.98950	0.99709	0.99135	0.4057	101.2	6.26	1.66	3.90	11.82	4.80	0.77	0.44	0.77	1.98	0.80	0.36	0.15	14.16	5.75
20年目	R 27	0.99046	0.98939	0.99708	0.99128	0.3901	101.2	6.20	1.64	3.89	11.73	4.58	0.76	0.43	0.77	1.96	0.77	0.36	0.14	14.06	5.48
21年目	R 28	0.99036	0.98927	0.99707	0.99120	0.3751	101.2	6.14	1.63	3.88	11.65	4.37	0.75	0.43	0.77	1.95	0.73	0.36	0.13	13.95	5.23
22年目	R 29	0.99027	0.98916	0.99707	0.99112	0.3607	101.2	6.09	1.61	3.86	11.56	4.17	0.74	0.42	0.77	1.93	0.70	0.35	0.13	13.85	4.99
23年目	R 30	0.99018	0.98904	0.99706	0.99104	0.3468	101.2	6.03	1.59	3.85	11.47	3.98	0.74	0.42	0.76	1.92	0.67	0.35	0.12	13.74	4.77
24年目	R 31	0.99008	0.98892	0.99705	0.99096	0.3335	101.2	5.97	1.57	3.84	11.38	3.80	0.73	0.41	0.76	1.90	0.64	0.35	0.12	13.64	4.55
25年目	R 32	0.98998	0.98879	0.99704	0.99088	0.3207	101.2	5.91	1.56	3.83	11.29	3.62	0.72	0.41	0.76	1.89	0.61	0.34	0.11	13.53	4.34
26年目	R 33	0.98988	0.98867	0.99703	0.99080	0.3083	101.2	5.85	1.54	3.82	11.21	3.46	0.72	0.40	0.76	1.88	0.58	0.34	0.11	13.42	4.14
27年目	R 34	0.98977	0.98854	0.99702	0.99071	0.2965	101.2	5.79	1.52	3.81	11.12	3.30	0.71	0.40	0.76	1.86	0.55	0.34	0.10	13.32	3.95
28年目	R 35	0.98967	0.98840	0.99701	0.99062	0.2851	101.2	5.73	1.50	3.80	11.03	3.14	0.70	0.39	0.75	1.85	0.53	0.34	0.10	13.21	3.77
29年目	R 36	0.98956	0.98827	0.99700	0.99053	0.2741	101.2	5.67	1.49	3.79	10.94	3.00	0.69	0.39	0.75	1.83	0.50	0.33	0.09	13.11	3.59
30年目	R 37	0.98945	0.98813	0.99699	0.99044	0.2636	101.2	5.61	1.47	3.77	10.85	2.86	0.69	0.39	0.75	1.82	0.48	0.33	0.09	13.00	3.43
31年目	R 38	0.98934	0.98799	0.99699	0.99035	0.2534	101.2	5.55	1.45	3.76	10.77	2.73	0.68	0.38	0.75	1.81	0.46	0.33	0.08	12.90	3.27
32年目	R 39	0.98922	0.98784	0.99698	0.99026	0.2437	101.2	5.49	1.43	3.75	10.68	2.60	0.67	0.38	0.74	1.79	0.44	0.32	0.08	12.79	3.12
33年目	R 40	0.98911	0.98769	0.99697	0.99016	0.2343	101.2	5.43	1.42	3.74	10.59	2.48	0.66	0.37	0.74	1.78	0.42	0.32	0.07	12.69	2.97
34年目	R 41	0.98899	0.98754	0.99696	0.99006	0.2253	101.2	5.37	1.40	3.73	10.50	2.37	0.66	0.37	0.74	1.76	0.40	0.32	0.07	12.58	2.83
35年目	R 42	0.98886	0.98738	0.99695	0.98996	0.2166	101.2	5.32	1.38	3.72	10.41	2.26	0.65	0.36	0.74	1.75	0.38	0.31	0.07	12.48	2.70
36年目	R 43	0.98874	0.98722	0.99694	0.98986	0.2083	101.2	5.26	1.36	3.71	10.33	2.15	0.64	0.36	0.74	1.74	0.36	0.31	0.06	12.37	2.58
37年目	R 44	0.98861	0.98705	0.99693	0.98976	0.2003	101.2	5.20	1.35	3.69	10.24	2.05	0.64	0.35	0.73	1.72	0.34	0.31	0.06	12.27	2.46
38年目	R 45	0.98848	0.98688	0.99692	0.98965	0.1926	101.2	5.14	1.33	3.68	10.15	1.95	0.63	0.35	0.73	1.71	0.33	0.30	0.06	12.16	2.34
39年目	R 46	0.98834	0.98671	0.99691	0.98954	0.1852	101.2	5.08	1.31	3.67	10.06	1.86	0.62	0.34	0.73	1.69	0.31	0.30	0.06	12.06	2.23
40年目	R 47	0.98821	0.98653	0.99690	0.98943	0.1780	101.2	5.02	1.29	3.66	9.97	1.78	0.61	0.34	0.73	1.68	0.30	0.30	0.05	11.95	2.13
41年目	R 48	0.98807	0.98634	0.99689	0.98932	0.1712	101.2	4.96	1.28	3.65	9.89	1.69	0.61	0.33	0.72	1.67	0.29	0.29	0.05	11.85	2.03
42年目	R 49	0.98792	0.98616	0.99688	0.98921	0.1646	101.2	4.90	1.26	3.64	9.80	1.61	0.60	0.33	0.72	1.65	0.27	0.29	0.05	11.74	1.93
43年目	R 50	0.98777	0.98596	0.99687	0.98909	0.1583	101.2	4.84	1.24	3.63	9.71	1.54	0.59	0.33	0.72	1.64	0.26	0.29	0.05	11.64	1.84
44年目	R 51	0.98762	0.98576	0.99686	0.98897	0.1522	101.2	4.78	1.23	3.62	9.62	1.46	0.58	0.32	0.72	1.62	0.25	0.28	0.04	11.53	1.76
45年目	R 52	0.98747	0.98556	0.99685	0.98884	0.1463	101.2	4.72	1.21	3.60	9.53	1.40	0.58	0.32	0.72	1.61	0.24	0.28	0.04	11.43	1.67
46年目	R 53	0.98731	0.98534	0.99684	0.98872	0.1407	101.2	4.66	1.19	3.59	9.45	1.33	0.57	0.31	0.71	1.60	0.22	0.28	0.04	11.32	1.59
47年目	R 54	0.98714	0.98513	0.99683	0.98859	0.1353	101.2	4.61	1.17	3.58	9.36	1.27	0.56	0.31	0.71	1.58	0.21	0.28	0.04	11.22	1.52
48年目	R 55	0.98698	0.98490	0.99682	0.98846	0.1301	101.2	4.55	1.16	3.57	9.27	1.21	0.56	0.30	0.71	1.57	0.20	0.27	0.04	11.11	1.45
49年目	R 56	0.98681	0.98467	0.99681	0.98832	0.1251	101.2	4.49	1.14	3.56	9.18	1.15	0.55	0.30	0.71	1.55	0.19	0.27	0.03	11.01	1.38
合 計								291.27	76.60	185.47	553.35	218.82	31.83	17.72	33.16	82.72	29.07	17.04	6.87	653.11	254.76
