


※ 資料

津和野町名賀地区の災害状況


—平成25年7月28日山口島根豪雨災害を振り返って—

島根県津和野町建設課

7月28日の大雨による被害概況

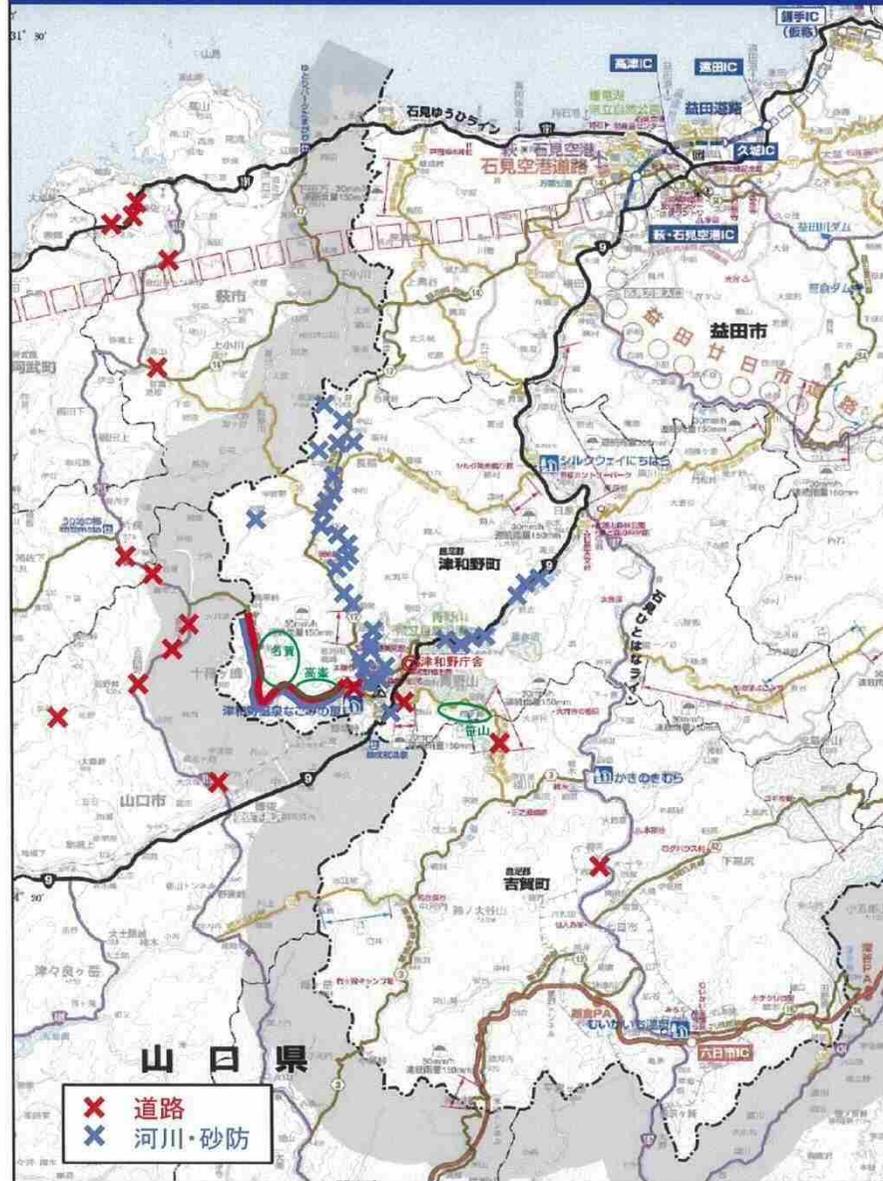

降雨の状況
 7月28日未明から夕方にかけて、太平洋高気圧の縁に沿って暖かく湿った空気が島根県西部に流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、津和野町を中心に記録的な大雨となった。
 津和野観測所 日最大24時間降水量：381mm 観測史上最大
 日最大1時間降水量：91mm (28日3:50~4:50) 観測史上最大

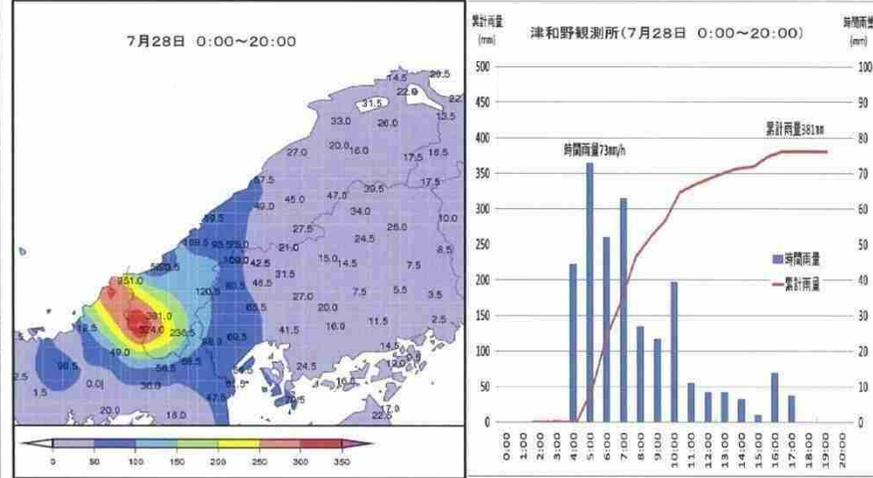

- 津和野町の被害状況 8月9日8時00分現在
1. 人的被害
 行方不明1名(名賀地区)、重傷者 1名(名賀地区白井)
 2. 孤立集落
 名賀地区 49戸、108名 → 7月31日8時30分解消
 高峯地区 13戸、28名 → 7月31日8時30分解消
 笹山地区 32戸、81名 → 7月29日17時30分解消
 3. 避難状況 避難所避難者 計19名
 4. 住家被害
 全壊:1棟(流失)1棟(倒壊)、床上浸水:18棟、床下浸水:93棟
 5. ライフライン
 停電 名賀地区木尾谷地内 10戸(復旧未定)
 簡易水道 断水(対象27戸、60人)
 情報通信 津和野町CATV:5世帯が利用不可
 6. 土木施設
 道路被害 全面通行止め 3路線6カ所(L=14.3km)→現在 1路線1カ所(L=2.0km)
 道路施設災害 122カ所(県道:25カ所、町道:97カ所)
 河川被害 河川施設災害 147カ所(県管理:95カ所、町管理:52カ所)
 土砂災害 げけ崩れ16カ所、土石流57所、砂防施設災害:23カ所
 7. 農林施設・農作物
 農地・農業用施設:692箇所、林道施設:68箇所、林地被害:44箇所、造林地:13箇所、
 作業道:3箇所、水稻等:115ha、野菜・花き・果樹:2ha
 8. 公共交通機関への影響
 JR山口線 地福(山口市)～益田駅間運転不通(復旧時期未定、8/5からバス代行実施)
 9. 教育関係施設
 文化財関係被害 一部史跡(5箇所)で土砂の流入、浸水等の被害

H25.7.28 浸水被害状況

津和野川、名賀川等各所で浸水被害が発生

【住家被害】

全壊:1棟(流失) 1棟(倒壊)
 床上浸水:18棟、床下浸水:93棟



⑦名賀川(津和野町名賀)



⑥JR山口線流失(津和野町名賀)



⑤名賀川(津和野町高峯)



①津和野川(津和野町後田)



②津和野川(津和野町鷺原)



②津和野町鷺原地区



③津和野川(津和野町山入)




④名賀川(津和野町高峯) 住家1棟流失



主要地方道 萩津和野線

道路決壊・崩土等により通行が寸断

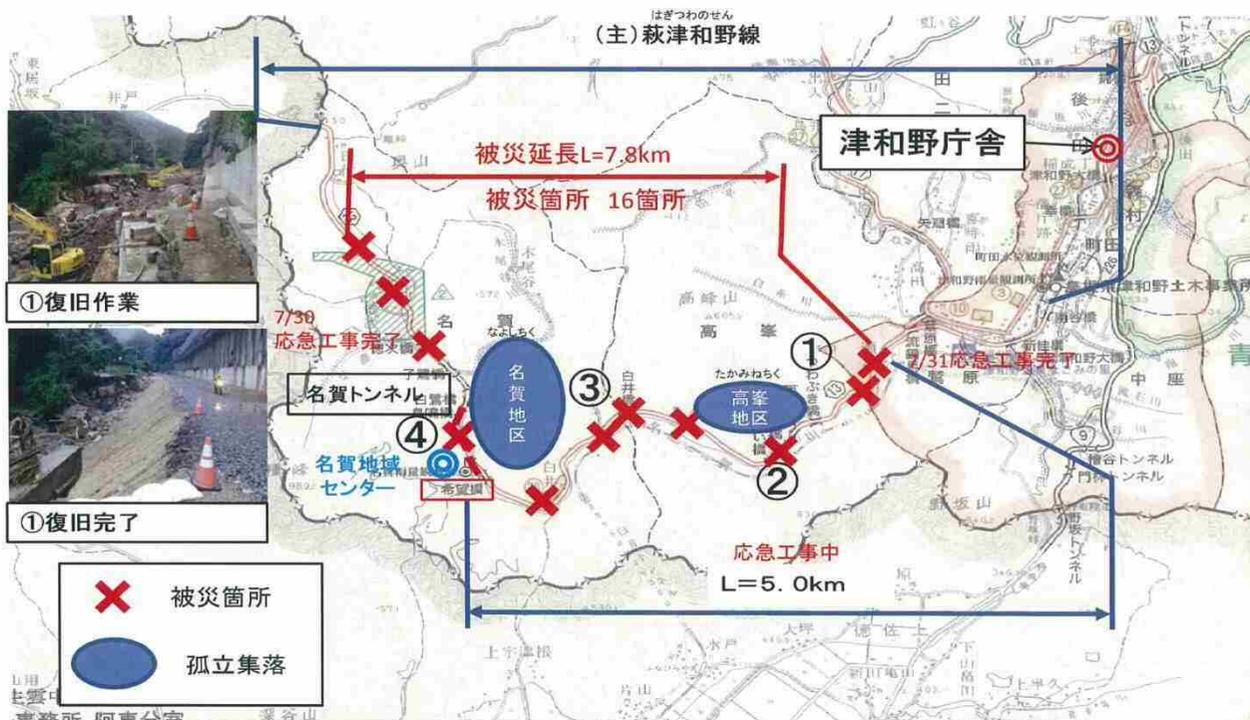

① 復旧作業



① 復旧完了



① 津和野町高峯 約100m道路決壊



② 津和野町高峯 橋台背面流出



④ 津和野町名賀 名賀トンネル津和野側から約1km道路決壊及び崩土



③ 津和野町名賀 約30m道路決壊

事務所 阿東分室
) 954-0031
) 954-0421

東 町
 武 郡

県道萩津和野線 啓開状況 8月9日 8:00現在

- ①8月4日 10:00 県境～名賀地区 供用再開(L=2.9km)
- ②8月7日 15:00 津和野中心地～高峯地区 供用再開(L=5.0km)



土石流の道路への流出



7/31 作業完了



名賀川の氾濫により土石が3m堆積



作業中



①8月4日 10:00 約2.9kmを交通解放
 ②8月7日 15:00 約5kmを交通解放
 全面通行止め (啓開作業中) 約2km



名賀川の氾濫により道路流出



作業中



名賀川の氾濫により土石が2m堆積



8/5 12:00作業完了



名賀川の氾濫により道路流出



8/4 17:00作業完了



土石流の道路への流出



8/4 10:00作業完了



名賀川の氾濫により道路流出



8/1 20:00作業完了



名賀川の増水により橋台背面土の吸い出し



8/2 17:00作業完了







上空から見た「名賀地区白井集落」

