

(再評価)

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道159号 七尾バイパス
事業区分	一般国道（二次改築）
事業主体	北陸地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比（B/C）＝0.9 （経済的純現在価値（B-C）＝-49億円、経済的内部収益率（EIRR）＝3.2%） 残事業：費用便益比（B/C）＝1.5 （経済的純現在価値（B-C）＝56億円、経済的内部収益率（EIRR）＝6.9%）
前提条件	事業の性格	以下のいずれかに該当する ■ ・国の直轄に関する事業 ・国家的な事業に関連する事業 ・先導的な施策に係る事業 ・短期間に集中的に施行する必要がある事業	
		□ 市町村道事業については、ネットワーク関連や市町村合併など特別な観点で行う事業である	

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	
	● 並行区間等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（整備後）：349.2万人・時間/年 渋滞損失削減時間：38.4万人・時間/年（349.2万人・時間/年⇒310.8万人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について 当該区間の渋滞損失時間（整備後）：28.5万人・時間/年 当該区間およびバイパス区間の渋滞損失削減時間：23.8万人・時間/年（28.5万人・時間/年⇒4.7万人・時間/年）
	■ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間（七尾バイパス現道拡幅区間）、改善見込み（旅行速度が20km/hを下回る区間が存在し、混雑拡幅により交通容量が拡大し、一般国道159号の渋滞が緩和）
	□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台/日以上の上り踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	□ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる	

国主・地域ネットワークの構築	☐ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	
	☐ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
	☐ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	
	☐ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	
	☒ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	重要港湾七尾港へのアクセスが強化されることにより、大型車などの円滑な走行や安全性が確保される。
	☐ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
	☐ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上が見込まれる	
	☐ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	
	☐ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	☐ 三大都市圏の環状道路を形成する	
	☐ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
	☐ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	☐ 中心市街地内で行う事業である	
	☐ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
	☐ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	☐ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	
	☐ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	
	☐ 地域高規格道路の位置づけあり	
	☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
	☐ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	☐ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	

2.暮らし		☐ 現道等における交通不能区間を解消する	
		☐ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		☐ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成		
		☐ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		☐ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		☐ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する	
		☐ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	
		☐ 特別立法に基づく事業である	
		☒ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	H27に整備された能登国分寺公園が隣接するアクセス道路であり、七尾市の観光や文化・交流拠点へのアクセス性の向上が期待される。
		☐ 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
	歩行者・自転車のための生活空間の形成		
		☐ 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/2h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		☐ 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成		
		☐ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		☐ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保		
		☐ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
		☐ 二次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	

3. 安全	安全な生活環境の確保	
	☐ 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる	
	☐ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
	☐ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	
	☐ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
	☒ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	石川県地域防災計画において、初動体制の確保地域間相互の連携等に対応する路線である、第1次緊急輸送道路に位置付けられている。
	☐ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
	☐ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する	
	☐ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	☐ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する	
	☐ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
	☐ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
	☐ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
	☐ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
	☐ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす	
4. 環境	地球環境の保全	
	☒ 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	費用便益分析対象範囲のCO2排出量の削減量：約0.3万t-CO2/年 整備なし：約15.5万t-CO2/年 → 整備あり：約15.2万t-CO2/年
	生活環境の改善・保全	
	☒ 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率	費用便益分析対象範囲のNOx排出量の削減量：約5.9t-NOx/年 整備なし：約300.8t-NOx/年 → 整備あり：約294.9t-NOx/年
	☒ 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率	費用便益分析対象範囲のSPM排出量の削減量：約0.3t-SPM/年 整備なし：約15.7t-SPM/年 → 整備あり：約15.4t-SPM/年
	☐ 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
5. その他	他のアクトとの関係	
	☐ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
	☒ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	高規格道路である能越自動車道（七尾IC）と接続し、一体的に整備されることが必要（H27.2にインターと接続するバイパス部と接続済み）
	☒ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	石川県の長期構想（「ダブルラダー輝きの未知」構想）に位置付けられた道路であり、南北に長い石川県の連携向上が図られる。
	☐ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道159号	七尾バイパス	L=4.3km	二次改築	現拡・ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
13,100～23,600	4	北陸地方整備局

①費用

	事業費	維持管理費	更新費	合計
基準年	令和6年度			
単純合計	227億円	111億円		339億円
うち残事業分	106億円	83億円		189億円
基準年における 現在価値（C）	296億円	62億円		358億円
うち残事業分	88億円	28億円		116億円

②便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和 6 年度			
供 用 年	平成 2 7 年度、令和 1 3 年度			
単年便益 (初年便益)	5.4億円	0.56億円	0.08億円	6.0億円
基準年における 現在価値 (B)	281億円	24億円	3.8億円	309億円
うち残事業分	163億円	8.3億円	0.53億円	172億円

③結果

【事業全体】

費用便益比 (B/C)	0.9 〔4%〕	[参考] 1.1 〔2%〕	[参考] 1.3 〔1%〕
経済的純現在価値 (B-C)	-49億円 〔4%〕	[参考] 43億円 〔2%〕	[参考] 112億円 〔1%〕
経済的内部収益率 (EIRR)	3.2%		

※ 〔 〕 内は社会的割引率

【残事業】

費用便益比 (B/C)	1.5 〔4%〕	[参考] 2.0 〔2%〕	[参考] 2.5 〔1%〕
経済的純現在価値 (B-C)	56億円 〔4%〕	[参考] 141億円 〔2%〕	[参考] 213億円 〔1%〕
経済的内部収益率 (EIRR)	6.9%		

※ 〔 〕 内は社会的割引率

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	13,100～23,600	± 1 0 %	0.8～0.9
事業費	227億円	± 1 0 %	0.8～0.9
事業期間	33年	± 2 0 %	0.9～0.9

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	13,100～23,600	± 1 0 %	1.3～1.6
事業費	106億円	± 1 0 %	1.4～1.6
事業期間	6年	± 2 0 %	1.5～1.5

交通状況の変化(事業全体)

様式－３①

事業名 一般国道159号 七尾バイパス

(推計時点 R 2 2 年)

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 L=4.3km		交通量※ ¹	[台/日]	14,300	16,700
		走行時間※ ²	[分]	3	5
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	8.80	15.09
②主な周辺道路 ※ ⁴	A. 現道 ((一)七尾鹿島羽咋線) L=2.2km	交通量	[台/日]	10,800	1,700
		走行時間	[分]	4	3
		走行時間費用	[億円/年]	8.70	1.02
	B. (都)外環状線 L=7.4km	交通量	[台/日]	5,700	4,100
		走行時間	[分]	14	14
		走行時間費用	[億円/年]	15.25	11.01
	C. (主)七尾輪島線 L=8.9km	交通量	[台/日]	7,000	6,000
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	23.97	20.37
	D. (主)七尾羽咋線 L=1.5km	交通量	[台/日]	10,000	8,100
		走行時間	[分]	4	3
		走行時間費用	[億円/年]	6.85	5.16
③その他道路合計 L=384.8km		走行時間費用	[億円/年]	403.85	401.29

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：409.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	467.42	453.94	13.48

※¹： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※²： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※³： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※⁴： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※⁵： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

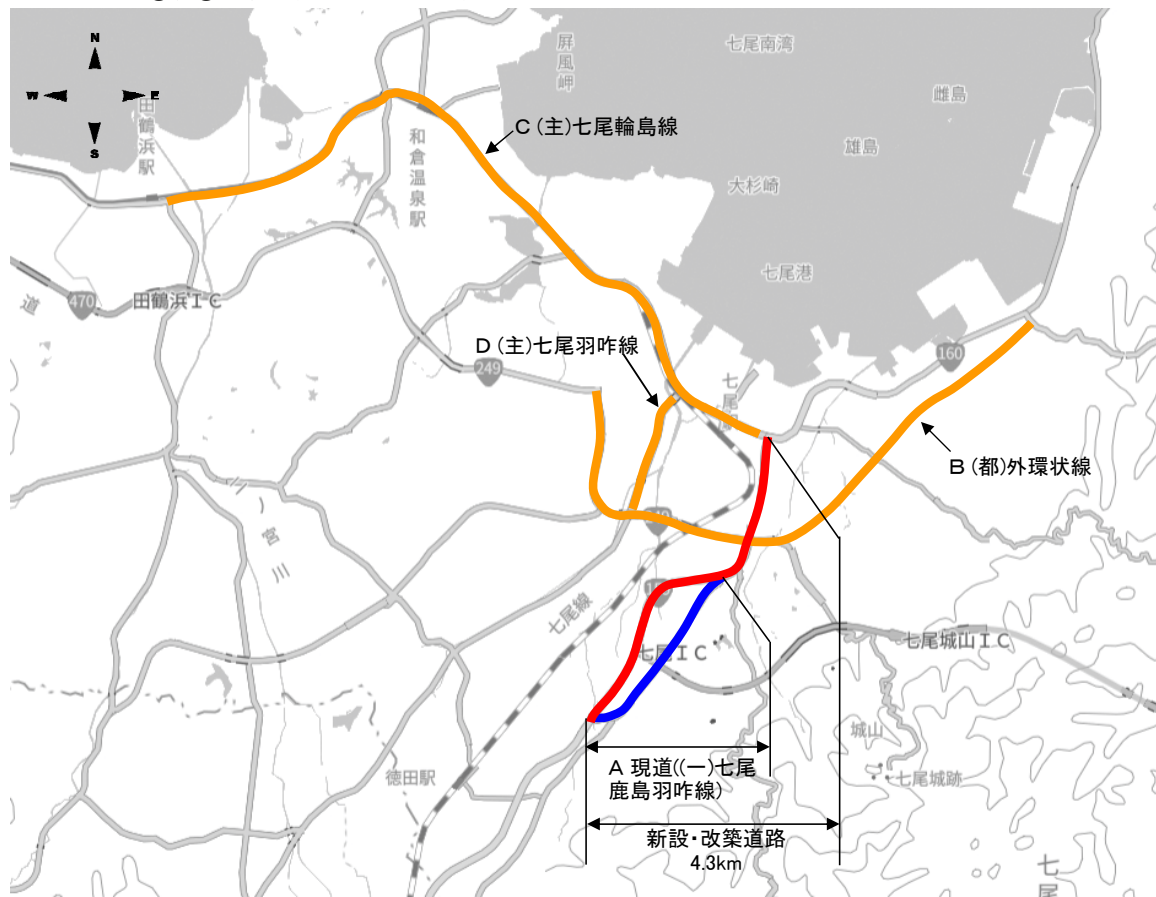

交通状況の変化(残事業)

様式－3①

事業名 一般国道159号 七尾バイパス

(推計時点 R 2 2 年)

			整備なし (A)		整備あり (B)	
①新設・改築道路 L=4.3km		交通量※ ¹	[台/日]	12,400	16,700	
		走行時間※ ²	[分]	7	5	
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	16.32	15.09	
②主な周辺道路 ※ ⁴	A. 現道 ((一)七尾鹿島羽咋線) L=2.2km	交通量	[台/日]	2,700	1,700	
		走行時間	[分]	3	3	
		走行時間費用	[億円/年]	1.62	1.02	
	B. (都)外環状線 L=7.4km	交通量	[台/日]	4,600	4,100	
		走行時間	[分]	13	14	
		走行時間費用	[億円/年]	11.58	11.01	
	C. (主)七尾輪島線 L=8.9km	交通量	[台/日]	6,600	6,000	
		走行時間	[分]	17	17	
		走行時間費用	[億円/年]	22.34	20.37	
	D. (主)七尾羽咋線 L=1.5km	交通量	[台/日]	10,100	8,100	
		走行時間	[分]	4	3	
		走行時間費用	[億円/年]	6.97	5.16	
③その他道路合計 L=384.8km		走行時間費用	[億円/年]	405.33	401.29	

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：409.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	464.16	453.94	10.22

※¹ : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※² : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※³ : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※⁴ : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※⁵ : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

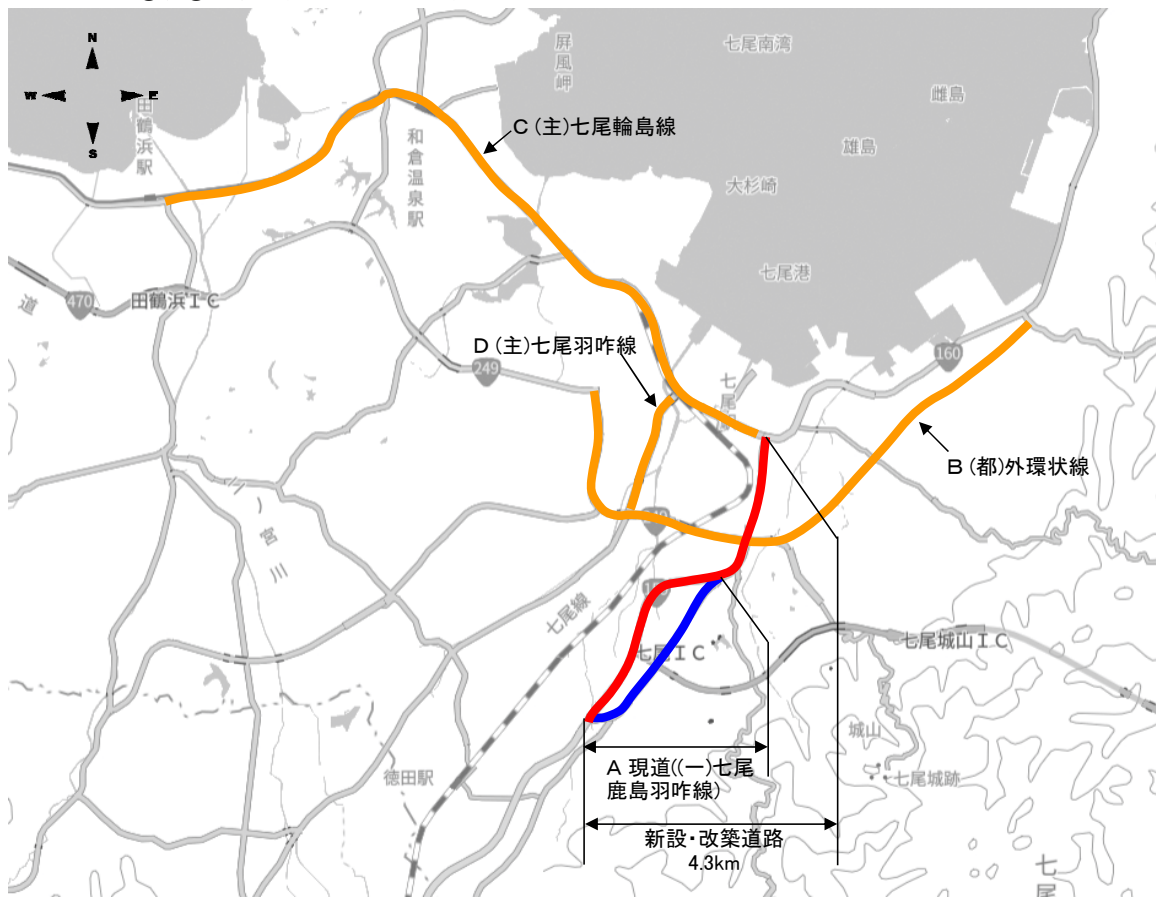

費用便益分析の条件

事業名：一般国道159号 七尾バイパス

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和5年12月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	比較のために参考とすべき値	2%、1%		
	基準年次	令和6年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☐	
		複数時点での推計	☒ (H27、R22)	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		☒
		整備の有無のいずれかのみ推計		☐ 有 ☐ 無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)		☒ (H27センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		☐
		その他()		☐
		開発交通量の考慮	無	
	有		☐	
	有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	() 台トリップ/日
	配分交通量の推計手法		Q-V式を用いた配分	
		転換率式を用いた配分		☐
		Q-V式と転換率式の併用による配分		☒
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐
		簡易手法		☐
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
			その他()	
		簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定 採用理由を記載		☐	
	最終配分の速度 採用理由を記載		☐	
	その他(最終配分でQoを超える場合、実態に即した速度で補正)		☒	

項目			チェック欄	
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	■	
		考慮する	□	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	□
			対象路線のみ考慮	□
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による 通行止めの 影響	考慮しない	■	
		考慮する	□	
		考慮する 場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	□
	冬期交通の 影響	考慮しない	□	
		考慮する	■	
		考慮する 場合のみ	採用した冬期日数(年あたり) 採用した冬期日数の考え方を記載 降雪が最初に観測された日から最後に観測された日までの日数(59日)及び降雪 日数(20日)を考慮	(59) 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
			通常期と冬期の速度比(降雪時12%低下、降雪時以外5%低下)を考慮	
	交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	■	
		その他 (		

(4)

4. その他

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
									0.68	4.3
									2.91	
ー17年目	H 10	4%	2.7725	113.6	0.19	0.48				
ー16年目	H 11	4%	2.6658	112.0	1.05	2.57				
ー15年目	H 12	4%	2.5633	110.7	5.79	13.77				
ー14年目	H 13	4%	2.4647	109.4	3.22	7.45				
ー13年目	H 14	4%	2.3699	107.6	1.48	3.35				
ー12年目	H 15	4%	2.2788	106.1	7.51	16.57				
ー11年目	H 16	4%	2.1911	105.0	3.35	7.18				
ー10年目	H 17	4%	2.1068	103.7	1.10	2.30				
ー9年目	H 18	4%	2.0258	103.0	1.71	3.45				
ー8年目	H 19	4%	1.9479	102.1	4.45	8.72				
ー7年目	H 20	4%	1.8730	101.6	4.43	8.39				
ー6年目	H 21	4%	1.8009	100.3	3.75	6.91				
ー5年目	H 22	4%	1.7317	98.6	7.44	13.42				
ー4年目	H 23	4%	1.6651	97.2	9.34	16.43				
ー3年目	H 24	4%	1.6010	96.4	25.00	42.64				
ー2年目	H 25	4%	1.5395	96.4	12.27	20.12				
ー1年目	H 26	4%	1.4802	98.7	26.87	41.38				
供用開始年次	H 27	4%	1.4233	100.2	0.19	0.28	1.33	1.94		
1年目	H 28	4%	1.3686	100.2	0.19	0.27	1.33	1.87		
2年目	H 29	4%	1.3159	100.5	0.19	0.26	1.33	1.79		
3年目	H 30	4%	1.2653	100.4	0.19	0.25	1.33	1.72		
4年目	R 1	4%	1.2167	101.2	0.18	0.22	1.33	1.64		
5年目	R 2	4%	1.1699	101.9	0.18	0.21	1.33	1.57		
6年目	R 3	4%	1.1249	101.8	0.18	0.20	1.33	1.51		
7年目	R 4	4%	1.0816	102.7	0.18	0.19	1.33	1.44		
8年目	R 5	4%	1.0400	102.7	0.18	0.19	1.33	1.38		
9年目	R 6	4%	1.0000	102.7	0.18	0.18	1.33	1.33		
10年目	R 7	4%	0.9615	102.7	1.82	1.75	1.33	1.28		
11年目	R 8	4%	0.9246	102.7	19.09	17.65	1.33	1.23		
12年目	R 9	4%	0.8890	102.7	25.96	23.08	1.33	1.18		
13年目	R 10	4%	0.8548	102.7	23.10	19.75	1.33	1.14		
14年目	R 11	4%	0.8219	102.7	18.18	14.94	1.33	1.09		
15年目	R 12	4%	0.7903	102.7	18.18	14.37	1.33	1.05		
供用開始年次	R 13	4%	0.7599	102.7			2.65	2.01		
17年目	R 14	4%	0.7307	102.7			2.65	1.94		
18年目	R 15	4%	0.7026	102.7			2.65	1.86		
19年目	R 16	4%	0.6756	102.7			2.65	1.79		
20年目	R 17	4%	0.6496	102.7			2.65	1.72		
21年目	R 18	4%	0.6246	102.7			2.65	1.66		
22年目	R 19	4%	0.6006	102.7			2.65	1.59		
23年目	R 20	4%	0.5775	102.7			2.65	1.53		
24年目	R 21	4%	0.5553	102.7			2.65	1.47		
25年目	R 22	4%	0.5339	102.7			2.65	1.41		
26年目	R 23	4%	0.5134	102.7			2.65	1.36		
27年目	R 24	4%	0.4936	102.7			2.65	1.31		
28年目	R 25	4%	0.4746	102.7			2.65	1.26		
29年目	R 26	4%	0.4564	102.7			2.65	1.21		
30年目	R 27	4%	0.4388	102.7			2.65	1.16		
31年目	R 28	4%	0.4220	102.7			2.65	1.12		
32年目	R 29	4%	0.4057	102.7			2.65	1.08		
33年目	R 30	4%	0.3901	102.7			2.65	1.03		
34年目	R 31	4%	0.3751	102.7			2.65	0.99		
35年目	R 32	4%	0.3607	102.7			2.65	0.96		
36年目	R 33	4%	0.3468	102.7			2.65	0.92		
37年目	R 34	4%	0.3335	102.7			2.65	0.88		
38年目	R 35	4%	0.3207	102.7			2.65	0.85		
39年目	R 36	4%	0.3083	102.7			2.65	0.82		
40年目	R 37	4%	0.2965	102.7			2.65	0.79		
41年目	R 38	4%	0.2851	102.7			2.65	0.76		
42年目	R 39	4%	0.2741	102.7			2.65	0.73		
43年目	R 40	4%	0.2636	102.7			2.65	0.70		
44年目	R 41	4%	0.2534	102.7			2.65	0.67		
45年目	R 42	4%	0.2437	102.7			2.65	0.65		
46年目	R 43	4%	0.2343	102.7			2.65	0.62		
47年目	R 44	4%	0.2253	102.7			2.65	0.60		
48年目	R 45	4%	0.2166	102.7			2.65	0.57		
49年目	R 46	4%	0.2083	102.7	-60.46	-12.59	2.65	0.55		
合 計					166.66	296.33	111.38	61.73	0.00	0.00
単純事業費計					227.12		111.38		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道159号 七尾バイパス

					単価(億円)		延長(km)		単価(億円)	
					0.68		4.3		2.91	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
ー17年目	H 10	4%	2.7192	113.6	0.19	0.47				
ー16年目	H 11	4%	2.6146	112.0	1.05	2.52				
ー15年目	H 12	4%	2.5140	110.7	5.79	13.50				
ー14年目	H 13	4%	2.4173	109.4	3.22	7.31				
ー13年目	H 14	4%	2.3243	107.6	1.48	3.28				
ー12年目	H 15	4%	2.2349	106.1	7.51	16.25				
ー11年目	H 16	4%	2.1490	105.0	3.35	7.04				
ー10年目	H 17	4%	2.0663	103.7	1.10	2.25				
ー9年目	H 18	4%	1.9869	103.0	1.71	3.39				
ー8年目	H 19	4%	1.9104	102.1	4.45	8.55				
ー7年目	H 20	4%	1.8370	101.6	4.43	8.23				
ー6年目	H 21	4%	1.7663	100.3	3.75	6.78				
ー5年目	H 22	4%	1.6984	98.6	7.44	13.16				
ー4年目	H 23	4%	1.6331	97.2	9.34	16.12				
ー3年目	H 24	4%	1.5702	96.4	25.00	41.82				
ー2年目	H 25	4%	1.5098	96.4	12.27	19.74				
ー1年目	H 26	4%	1.4518	98.7	26.87	40.59				
供用開始年次	H 27	4%	1.3959	100.2	0.19	0.27	1.33	1.90		
1年目	H 28	4%	1.3423	100.2	0.19	0.26	1.33	1.83		
2年目	H 29	4%	1.2906	100.5	0.19	0.25	1.33	1.75		
3年目	H 30	4%	1.2410	100.4	0.19	0.24	1.33	1.69		
4年目	R 1	4%	1.1933	101.2	0.18	0.22	1.33	1.61		
5年目	R 2	4%	1.1474	101.9	0.18	0.21	1.33	1.54		
6年目	R 3	4%	1.1032	101.8	0.18	0.20	1.33	1.48		
7年目	R 4	4%	1.0608	102.7	0.18	0.19	1.33	1.41		
8年目	R 5	2%	1.0200	102.7	0.18	0.18	1.33	1.36		
9年目	R 6	2%	1.0000	102.7	0.18	0.18	1.33	1.33		
10年目	R 7	2%	0.9804	102.7	1.82	1.78	1.33	1.30		
11年目	R 8	2%	0.9612	102.7	19.09	18.35	1.33	1.28		
12年目	R 9	2%	0.9423	102.7	25.96	24.46	1.33	1.25		
13年目	R 10	2%	0.9238	102.7	23.10	21.34	1.33	1.23		
14年目	R 11	2%	0.9057	102.7	18.18	16.47	1.33	1.20		
15年目	R 12	2%	0.8880	102.7	18.18	16.14	1.33	1.18		
供用開始年次	R 13	2%	0.8706	102.7			2.65	2.31		
17年目	R 14	2%	0.8535	102.7			2.65	2.26		
18年目	R 15	2%	0.8368	102.7			2.65	2.22		
19年目	R 16	2%	0.8203	102.7			2.65	2.17		
20年目	R 17	2%	0.8043	102.7			2.65	2.13		
21年目	R 18	2%	0.7885	102.7			2.65	2.09		
22年目	R 19	2%	0.7730	102.7			2.65	2.05		
23年目	R 20	2%	0.7579	102.7			2.65	2.01		
24年目	R 21	2%	0.7430	102.7			2.65	1.97		
25年目	R 22	2%	0.7284	102.7			2.65	1.93		
26年目	R 23	2%	0.7142	102.7			2.65	1.89		
27年目	R 24	2%	0.7002	102.7			2.65	1.86		
28年目	R 25	2%	0.6864	102.7			2.65	1.82		
29年目	R 26	2%	0.6730	102.7			2.65	1.78		
30年目	R 27	2%	0.6598	102.7			2.65	1.75		
31年目	R 28	2%	0.6468	102.7			2.65	1.71		
32年目	R 29	2%	0.6342	102.7			2.65	1.68		
33年目	R 30	2%	0.6217	102.7			2.65	1.65		
34年目	R 31	2%	0.6095	102.7			2.65	1.62		
35年目	R 32	2%	0.5976	102.7			2.65	1.58		
36年目	R 33	2%	0.5859	102.7			2.65	1.55		
37年目	R 34	2%	0.5744	102.7			2.65	1.52		
38年目	R 35	2%	0.5631	102.7			2.65	1.49		
39年目	R 36	2%	0.5521	102.7			2.65	1.46		
40年目	R 37	2%	0.5412	102.7			2.65	1.43		
41年目	R 38	2%	0.5306	102.7			2.65	1.41		
42年目	R 39	2%	0.5202	102.7			2.65	1.38		
43年目	R 40	2%	0.5100	102.7			2.65	1.35		
44年目	R 41	2%	0.5000	102.7			2.65	1.33		
45年目	R 42	2%	0.4902	102.7			2.65	1.30		
46年目	R 43	2%	0.4806	102.7			2.65	1.27		
47年目	R 44	2%	0.4712	102.7			2.65	1.25		
48年目	R 45	2%	0.4619	102.7			2.65	1.22		
49年目	R 46	2%	0.4529	102.7	-60.46	-27.38	2.65	1.20		
合 計					166.66	284.36	111.38	80.98	0.00	0.00
単純事業費計					227.12		111.38		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
					0.68		4.3		2.91	
					事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
ー17年目	H 10	4%	2.6925	113.6	0.19	0.46				
ー16年目	H 11	4%	2.5889	112.0	1.05	2.49				
ー15年目	H 12	4%	2.4894	110.7	5.79	13.37				
ー14年目	H 13	4%	2.3936	109.4	3.22	7.24				
ー13年目	H 14	4%	2.3016	107.6	1.48	3.25				
ー12年目	H 15	4%	2.2130	106.1	7.51	16.09				
ー11年目	H 16	4%	2.1279	105.0	3.35	6.97				
ー10年目	H 17	4%	2.0461	103.7	1.10	2.23				
ー9年目	H 18	4%	1.9674	103.0	1.71	3.35				
ー8年目	H 19	4%	1.8917	102.1	4.45	8.47				
ー7年目	H 20	4%	1.8190	101.6	4.43	8.15				
ー6年目	H 21	4%	1.7490	100.3	3.75	6.72				
ー5年目	H 22	4%	1.6817	98.6	7.44	13.03				
ー4年目	H 23	4%	1.6170	97.2	9.34	15.96				
ー3年目	H 24	4%	1.5548	96.4	25.00	41.41				
ー2年目	H 25	4%	1.4950	96.4	12.27	19.54				
ー1年目	H 26	4%	1.4375	98.7	26.87	40.19				
供用開始年次	H 27	4%	1.3823	100.2	0.19	0.27	1.33	1.88		
1年目	H 28	4%	1.3291	100.2	0.19	0.26	1.33	1.81		
2年目	H 29	4%	1.2780	100.5	0.19	0.25	1.33	1.74		
3年目	H 30	4%	1.2288	100.4	0.19	0.24	1.33	1.67		
4年目	R 1	4%	1.1816	101.2	0.18	0.22	1.33	1.59		
5年目	R 2	4%	1.1361	101.9	0.18	0.21	1.33	1.52		
6年目	R 3	4%	1.0924	101.8	0.18	0.20	1.33	1.47		
7年目	R 4	4%	1.0504	102.7	0.18	0.19	1.33	1.40		
8年目	R 5	1%	1.0100	102.7	0.18	0.18	1.33	1.34		
9年目	R 6	1%	1.0000	102.7	0.18	0.18	1.33	1.33		
10年目	R 7	1%	0.9901	102.7	1.82	1.80	1.33	1.32		
11年目	R 8	1%	0.9803	102.7	19.09	18.71	1.33	1.30		
12年目	R 9	1%	0.9706	102.7	25.96	25.20	1.33	1.29		
13年目	R 10	1%	0.9610	102.7	23.10	22.20	1.33	1.28		
14年目	R 11	1%	0.9515	102.7	18.18	17.30	1.33	1.27		
15年目	R 12	1%	0.9420	102.7	18.18	17.13	1.33	1.25		
供用開始年次	R 13	1%	0.9327	102.7			2.65	2.47		
17年目	R 14	1%	0.9235	102.7			2.65	2.45		
18年目	R 15	1%	0.9143	102.7			2.65	2.42		
19年目	R 16	1%	0.9053	102.7			2.65	2.40		
20年目	R 17	1%	0.8963	102.7			2.65	2.38		
21年目	R 18	1%	0.8874	102.7			2.65	2.35		
22年目	R 19	1%	0.8787	102.7			2.65	2.33		
23年目	R 20	1%	0.8700	102.7			2.65	2.31		
24年目	R 21	1%	0.8613	102.7			2.65	2.28		
25年目	R 22	1%	0.8528	102.7			2.65	2.26		
26年目	R 23	1%	0.8444	102.7			2.65	2.24		
27年目	R 24	1%	0.8360	102.7			2.65	2.22		
28年目	R 25	1%	0.8277	102.7			2.65	2.19		
29年目	R 26	1%	0.8195	102.7			2.65	2.17		
30年目	R 27	1%	0.8114	102.7			2.65	2.15		
31年目	R 28	1%	0.8034	102.7			2.65	2.13		
32年目	R 29	1%	0.7954	102.7			2.65	2.11		
33年目	R 30	1%	0.7876	102.7			2.65	2.09		
34年目	R 31	1%	0.7798	102.7			2.65	2.07		
35年目	R 32	1%	0.7720	102.7			2.65	2.05		
36年目	R 33	1%	0.7644	102.7			2.65	2.03		
37年目	R 34	1%	0.7568	102.7			2.65	2.01		
38年目	R 35	1%	0.7493	102.7			2.65	1.99		
39年目	R 36	1%	0.7419	102.7			2.65	1.97		
40年目	R 37	1%	0.7346	102.7			2.65	1.95		
41年目	R 38	1%	0.7273	102.7			2.65	1.93		
42年目	R 39	1%	0.7201	102.7			2.65	1.91		
43年目	R 40	1%	0.7130	102.7			2.65	1.89		
44年目	R 41	1%	0.7059	102.7			2.65	1.87		
45年目	R 42	1%	0.6989	102.7			2.65	1.85		
46年目	R 43	1%	0.6920	102.7			2.65	1.83		
47年目	R 44	1%	0.6852	102.7			2.65	1.82		
48年目	R 45	1%	0.6784	102.7			2.65	1.80		
49年目	R 46	1%	0.6717	102.7	-60.46	-40.61	2.65	1.78		
合 計					166.66	272.85	111.38	95.16	0.00	0.00
単純事業費計					227.12		111.38		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道159号 七尾バイパス						単価(億円)		延長(km)		単価(億円)	
						0.43		4.3		1.83	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)		
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	
ー6年目	R 7	4%	0.9615	102.7	1.82	1.75					
ー5年目	R 8	4%	0.9246	102.7	19.09	17.65					
ー4年目	R 9	4%	0.8890	102.7	25.96	23.08					
ー3年目	R 10	4%	0.8548	102.7	23.10	19.75					
ー2年目	R 11	4%	0.8219	102.7	18.18	14.94					
ー1年目	R 12	4%	0.7903	102.7	18.18	14.37					
供用開始年次	R 13	4%	0.7599	102.7			1.66	1.26			
1年目	R 14	4%	0.7307	102.7			1.66	1.21			
2年目	R 15	4%	0.7026	102.7			1.66	1.17			
3年目	R 16	4%	0.6756	102.7			1.66	1.12			
4年目	R 17	4%	0.6496	102.7			1.66	1.08			
5年目	R 18	4%	0.6246	102.7			1.66	1.04			
6年目	R 19	4%	0.6006	102.7			1.66	1.00			
7年目	R 20	4%	0.5775	102.7			1.66	0.96			
8年目	R 21	4%	0.5553	102.7			1.66	0.92			
9年目	R 22	4%	0.5339	102.7			1.66	0.89			
10年目	R 23	4%	0.5134	102.7			1.66	0.85			
11年目	R 24	4%	0.4936	102.7			1.66	0.82			
12年目	R 25	4%	0.4746	102.7			1.66	0.79			
13年目	R 26	4%	0.4564	102.7			1.66	0.76			
14年目	R 27	4%	0.4388	102.7			1.66	0.73			
15年目	R 28	4%	0.4220	102.7			1.66	0.70			
16年目	R 29	4%	0.4057	102.7			1.66	0.67			
17年目	R 30	4%	0.3901	102.7			1.66	0.65			
18年目	R 31	4%	0.3751	102.7			1.66	0.62			
19年目	R 32	4%	0.3607	102.7			1.66	0.60			
20年目	R 33	4%	0.3468	102.7			1.66	0.58			
21年目	R 34	4%	0.3335	102.7			1.66	0.55			
22年目	R 35	4%	0.3207	102.7			1.66	0.53			
23年目	R 36	4%	0.3083	102.7			1.66	0.51			
24年目	R 37	4%	0.2965	102.7			1.66	0.49			
25年目	R 38	4%	0.2851	102.7			1.66	0.47			
26年目	R 39	4%	0.2741	102.7			1.66	0.46			
27年目	R 40	4%	0.2636	102.7			1.66	0.44			
28年目	R 41	4%	0.2534	102.7			1.66	0.42			
29年目	R 42	4%	0.2437	102.7			1.66	0.40			
30年目	R 43	4%	0.2343	102.7			1.66	0.39			
31年目	R 44	4%	0.2253	102.7			1.66	0.37			
32年目	R 45	4%	0.2166	102.7			1.66	0.36			
33年目	R 46	4%	0.2083	102.7			1.66	0.35			
34年目	R 47	4%	0.2003	102.7			1.66	0.33			
35年目	R 48	4%	0.1926	102.7			1.66	0.32			
36年目	R 49	4%	0.1852	102.7			1.66	0.31			
37年目	R 50	4%	0.1780	102.7			1.66	0.30			
38年目	R 51	4%	0.1712	102.7			1.66	0.28			
39年目	R 52	4%	0.1646	102.7			1.66	0.27			
40年目	R 53	4%	0.1583	102.7			1.66	0.26			
41年目	R 54	4%	0.1522	102.7			1.66	0.25			
42年目	R 55	4%	0.1463	102.7			1.66	0.24			
43年目	R 56	4%	0.1407	102.7			1.66	0.23			
44年目	R 57	4%	0.1353	102.7			1.66	0.22			
45年目	R 58	4%	0.1301	102.7			1.66	0.22			
46年目	R 59	4%	0.1251	102.7			1.66	0.21			
47年目	R 60	4%	0.1203	102.7			1.66	0.20			
48年目	R 61	4%	0.1157	102.7			1.66	0.19			
49年目	R 62	4%	0.1112	102.7	-32.05	-3.56	1.66	0.18			
合 計											
単純事業費計					106.33		83.00		0.00		

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値
					0.43		4.3		1.83	
ー6年目	R 7	2%	0.9804	102.7	1.82	1.78				
ー5年目	R 8	2%	0.9612	102.7	19.09	18.35				
ー4年目	R 9	2%	0.9423	102.7	25.96	24.46				
ー3年目	R 10	2%	0.9238	102.7	23.10	21.34				
ー2年目	R 11	2%	0.9057	102.7	18.18	16.47				
ー1年目	R 12	2%	0.8880	102.7	18.18	16.14				
供用開始年次	R 13	2%	0.8706	102.7			1.66	1.45		
1年目	R 14	2%	0.8535	102.7			1.66	1.42		
2年目	R 15	2%	0.8368	102.7			1.66	1.39		
3年目	R 16	2%	0.8203	102.7			1.66	1.36		
4年目	R 17	2%	0.8043	102.7			1.66	1.34		
5年目	R 18	2%	0.7885	102.7			1.66	1.31		
6年目	R 19	2%	0.7730	102.7			1.66	1.28		
7年目	R 20	2%	0.7579	102.7			1.66	1.26		
8年目	R 21	2%	0.7430	102.7			1.66	1.23		
9年目	R 22	2%	0.7284	102.7			1.66	1.21		
10年目	R 23	2%	0.7142	102.7			1.66	1.19		
11年目	R 24	2%	0.7002	102.7			1.66	1.16		
12年目	R 25	2%	0.6864	102.7			1.66	1.14		
13年目	R 26	2%	0.6730	102.7			1.66	1.12		
14年目	R 27	2%	0.6598	102.7			1.66	1.10		
15年目	R 28	2%	0.6468	102.7			1.66	1.07		
16年目	R 29	2%	0.6342	102.7			1.66	1.05		
17年目	R 30	2%	0.6217	102.7			1.66	1.03		
18年目	R 31	2%	0.6095	102.7			1.66	1.01		
19年目	R 32	2%	0.5976	102.7			1.66	0.99		
20年目	R 33	2%	0.5859	102.7			1.66	0.97		
21年目	R 34	2%	0.5744	102.7			1.66	0.95		
22年目	R 35	2%	0.5631	102.7			1.66	0.93		
23年目	R 36	2%	0.5521	102.7			1.66	0.92		
24年目	R 37	2%	0.5412	102.7			1.66	0.90		
25年目	R 38	2%	0.5306	102.7			1.66	0.88		
26年目	R 39	2%	0.5202	102.7			1.66	0.86		
27年目	R 40	2%	0.5100	102.7			1.66	0.85		
28年目	R 41	2%	0.5000	102.7			1.66	0.83		
29年目	R 42	2%	0.4902	102.7			1.66	0.81		
30年目	R 43	2%	0.4806	102.7			1.66	0.80		
31年目	R 44	2%	0.4712	102.7			1.66	0.78		
32年目	R 45	2%	0.4619	102.7			1.66	0.77		
33年目	R 46	2%	0.4529	102.7			1.66	0.75		
34年目	R 47	2%	0.4440	102.7			1.66	0.74		
35年目	R 48	2%	0.4353	102.7			1.66	0.72		
36年目	R 49	2%	0.4268	102.7			1.66	0.71		
37年目	R 50	2%	0.4184	102.7			1.66	0.69		
38年目	R 51	2%	0.4102	102.7			1.66	0.68		
39年目	R 52	2%	0.4022	102.7			1.66	0.67		
40年目	R 53	2%	0.3943	102.7			1.66	0.65		
41年目	R 54	2%	0.3865	102.7			1.66	0.64		
42年目	R 55	2%	0.3790	102.7			1.66	0.63		
43年目	R 56	2%	0.3715	102.7			1.66	0.62		
44年目	R 57	2%	0.3642	102.7			1.66	0.60		
45年目	R 58	2%	0.3571	102.7			1.66	0.59		
46年目	R 59	2%	0.3501	102.7			1.66	0.58		
47年目	R 60	2%	0.3432	102.7			1.66	0.57		
48年目	R 61	2%	0.3365	102.7			1.66	0.56		
49年目	R 62	2%	0.3299	102.7	-32.05	-10.57	1.66	0.55		
合 計					74.28	87.97	83.00	46.31	0.00	0.00
単純事業費計					106.33		83.00		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道159号 七尾バイパス							単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	
							0.43	4.3	1.83	
年次	年度	社会的 割引率	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
ー6年目	R 7	1%	0.9901	102.7	1.82	1.80				
ー5年目	R 8	1%	0.9803	102.7	19.09	18.71				
ー4年目	R 9	1%	0.9706	102.7	25.96	25.20				
ー3年目	R 10	1%	0.9610	102.7	23.10	22.20				
ー2年目	R 11	1%	0.9515	102.7	18.18	17.30				
ー1年目	R 12	1%	0.9420	102.7	18.18	17.13				
供用開始年次	R 13	1%	0.9327	102.7			1.66	1.55		
1年目	R 14	1%	0.9235	102.7			1.66	1.53		
2年目	R 15	1%	0.9143	102.7			1.66	1.52		
3年目	R 16	1%	0.9053	102.7			1.66	1.50		
4年目	R 17	1%	0.8963	102.7			1.66	1.49		
5年目	R 18	1%	0.8874	102.7			1.66	1.47		
6年目	R 19	1%	0.8787	102.7			1.66	1.46		
7年目	R 20	1%	0.8700	102.7			1.66	1.44		
8年目	R 21	1%	0.8613	102.7			1.66	1.43		
9年目	R 22	1%	0.8528	102.7			1.66	1.42		
10年目	R 23	1%	0.8444	102.7			1.66	1.40		
11年目	R 24	1%	0.8360	102.7			1.66	1.39		
12年目	R 25	1%	0.8277	102.7			1.66	1.37		
13年目	R 26	1%	0.8195	102.7			1.66	1.36		
14年目	R 27	1%	0.8114	102.7			1.66	1.35		
15年目	R 28	1%	0.8034	102.7			1.66	1.33		
16年目	R 29	1%	0.7954	102.7			1.66	1.32		
17年目	R 30	1%	0.7876	102.7			1.66	1.31		
18年目	R 31	1%	0.7798	102.7			1.66	1.29		
19年目	R 32	1%	0.7720	102.7			1.66	1.28		
20年目	R 33	1%	0.7644	102.7			1.66	1.27		
21年目	R 34	1%	0.7568	102.7			1.66	1.26		
22年目	R 35	1%	0.7493	102.7			1.66	1.24		
23年目	R 36	1%	0.7419	102.7			1.66	1.23		
24年目	R 37	1%	0.7346	102.7			1.66	1.22		
25年目	R 38	1%	0.7273	102.7			1.66	1.21		
26年目	R 39	1%	0.7201	102.7			1.66	1.20		
27年目	R 40	1%	0.7130	102.7			1.66	1.18		
28年目	R 41	1%	0.7059	102.7			1.66	1.17		
29年目	R 42	1%	0.6989	102.7			1.66	1.16		
30年目	R 43	1%	0.6920	102.7			1.66	1.15		
31年目	R 44	1%	0.6852	102.7			1.66	1.14		
32年目	R 45	1%	0.6784	102.7			1.66	1.13		
33年目	R 46	1%	0.6717	102.7			1.66	1.12		
34年目	R 47	1%	0.6650	102.7			1.66	1.10		
35年目	R 48	1%	0.6584	102.7			1.66	1.09		
36年目	R 49	1%	0.6519	102.7			1.66	1.08		
37年目	R 50	1%	0.6454	102.7			1.66	1.07		
38年目	R 51	1%	0.6391	102.7			1.66	1.06		
39年目	R 52	1%	0.6327	102.7			1.66	1.05		
40年目	R 53	1%	0.6265	102.7			1.66	1.04		
41年目	R 54	1%	0.6203	102.7			1.66	1.03		
42年目	R 55	1%	0.6141	102.7			1.66	1.02		
43年目	R 56	1%	0.6080	102.7			1.66	1.01		
44年目	R 57	1%	0.6020	102.7			1.66	1.00		
45年目	R 58	1%	0.5961	102.7			1.66	0.99		
46年目	R 59	1%	0.5902	102.7			1.66	0.98		
47年目	R 60	1%	0.5843	102.7			1.66	0.97		
48年目	R 61	1%	0.5785	102.7			1.66	0.96		
49年目	R 62	1%	0.5728	102.7	-32.05	-18.36	1.66	0.95		
合 計										
					74.28	83.98	83.00	61.29	0.00	0.00
単純事業費計					106.33		83.00		0.00	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

年度 (基準年)	年次	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター 102.7	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値			
供用開始年次	H 27	0.99654	0.98345	1.00422	0.99541	4%	1.4233	100.2	2.92	0.75	1.68	5.36	7.82	0.19	0.05	0.33	0.56	0.82	0.08	0.11	6.00	8.76	
1年目	H 28	0.99653	0.98317	1.00421	0.99539	4%	1.3686	100.2	2.91	0.74	1.69	5.34	7.50	0.19	0.05	0.33	0.56	0.79	0.08	0.11	5.99	8.40	
2年目	H 29	0.99651	0.98288	1.00419	0.99537	4%	1.3159	100.5	2.90	0.73	1.70	5.33	7.17	0.19	0.04	0.33	0.56	0.76	0.08	0.10	5.97	8.03	
3年目	H 30	0.99650	0.98258	1.00417	0.99535	4%	1.2653	100.4	2.89	0.72	1.70	5.31	6.88	0.19	0.04	0.33	0.56	0.73	0.08	0.10	5.95	7.71	
4年目	R 1	0.99649	0.98227	1.00415	0.99533	4%	1.2167	101.2	2.88	0.70	1.71	5.30	6.54	0.19	0.04	0.33	0.56	0.70	0.08	0.09	5.94	7.33	
5年目	R 2	0.99648	0.98195	1.00414	0.99531	4%	1.1699	101.9	2.87	0.69	1.72	5.28	6.23	0.19	0.04	0.33	0.56	0.67	0.08	0.09	5.92	6.98	
6年目	R 3	0.99647	0.98162	1.00412	0.99528	4%	1.1249	101.8	2.86	0.68	1.73	5.27	5.98	0.19	0.04	0.34	0.56	0.64	0.08	0.09	5.91	6.70	
7年目	R 4	0.99645	0.98128	1.00410	0.99526	4%	1.0816	102.7	2.85	0.67	1.73	5.25	5.68	0.19	0.04	0.34	0.56	0.61	0.08	0.08	5.89	6.37	
8年目	R 5	0.99644	0.98092	1.00409	0.99524	4%	1.0400	102.7	2.84	0.65	1.74	5.24	5.45	0.19	0.04	0.34	0.56	0.59	0.07	0.08	5.88	6.11	
9年目	R 6	0.99643	0.98055	1.00407	0.99522	4%	1.0000	102.7	2.83	0.64	1.75	5.22	5.22	0.19	0.04	0.34	0.56	0.56	0.07	0.07	5.86	5.86	
10年目	R 7	0.99642	0.98016	1.00405	0.99519	4%	0.9615	102.7	2.82	0.63	1.75	5.21	5.00	0.18	0.04	0.34	0.56	0.54	0.07	0.07	5.84	5.62	
11年目	R 8	0.99640	0.97976	1.00404	0.99517	4%	0.9246	102.7	2.81	0.62	1.76	5.19	4.80	0.18	0.04	0.34	0.56	0.52	0.07	0.07	5.83	5.39	
12年目	R 9	0.99639	0.97934	1.00402	0.99515	4%	0.8890	102.7	2.80	0.60	1.77	5.17	4.60	0.18	0.04	0.34	0.56	0.50	0.07	0.07	5.81	5.17	
13年目	R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	4%	0.8548	102.7	2.79	0.59	1.78	5.16	4.41	0.18	0.04	0.35	0.56	0.48	0.07	0.06	5.80	4.95	
14年目	R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	4%	0.8219	102.7	2.78	0.58	1.78	5.14	4.23	0.18	0.04	0.35	0.56	0.46	0.07	0.06	5.78	4.75	
15年目	R 12	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	4%	0.7903	102.7	2.77	0.57	1.79	5.13	4.05	0.18	0.03	0.35	0.56	0.45	0.07	0.06	5.76	4.56	
供用開始年次	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	4%	0.7599	102.7	10.27	1.69	2.05	14.01	10.65	0.57	0.10	0.38	1.04	0.79	0.18	0.14	15.24	11.58	
17年目	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7307	102.7	10.23	1.67	2.06	13.95	10.19	0.56	0.10	0.38	1.04	0.76	0.18	0.13	15.17	11.09	
18年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7026	102.7	10.18	1.65	2.06	13.89	9.76	0.56	0.09	0.38	1.04	0.73	0.18	0.13	15.11	10.62	
19年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.6756	102.7	10.14	1.63	2.07	13.83	9.35	0.56	0.09	0.38	1.04	0.70	0.18	0.12	15.05	10.17	
20年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6496	102.7	10.09	1.61	2.07	13.77	8.95	0.56	0.09	0.38	1.03	0.67	0.18	0.12	14.99	9.74	
21年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6246	102.7	10.05	1.59	2.08	13.72	8.57	0.55	0.09	0.38	1.03	0.64	0.18	0.11	14.92	9.32	
22年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6006	102.7	10.01	1.57	2.08	13.66	8.20	0.55	0.09	0.39	1.03	0.62	0.18	0.11	14.86	8.93	
23年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.5775	102.7	9.96	1.55	2.09	13.60	7.85	0.55	0.09	0.39	1.02	0.59	0.18	0.10	14.80	8.55	
24年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5553	102.7	9.92	1.52	2.09	13.54	7.52	0.55	0.09	0.39	1.02	0.57	0.18	0.10	14.74	8.18	
25年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5339	102.7	9.88	1.50	2.10	13.48	7.20	0.54	0.09	0.39	1.02	0.54	0.18	0.09	14.67	7.83	
26年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5134	102.7	9.79	1.49	2.10	13.38	6.87	0.54	0.09	0.39	1.01	0.52	0.17	0.09	14.57	7.48	
27年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	4%	0.4936	102.7	9.70	1.48	2.10	13.28	6.56	0.54	0.08	0.39	1.01	0.50	0.17	0.09	14.46	7.14	
28年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	4%	0.4746	102.7	9.62	1.47	2.10	13.18	6.26	0.53	0.08	0.39	1.00	0.48	0.17	0.08	14.36	6.81	
29年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	4%	0.4564	102.7	9.53	1.46	2.10	13.09	5.97	0.53	0.08	0.39	1.00	0.46	0.17	0.08	14.25	6.51	
30年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	4%	0.4388	102.7	9.44	1.44	2.10	12.99	5.70	0.52	0.08	0.39	0.99	0.44	0.17	0.07	14.15	6.21	
31年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	4%	0.4220	102.7	9.36	1.43	2.10	12.89	5.44	0.52	0.08	0.39	0.99	0.42	0.17	0.07	14.04	5.93	
32年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	4%	0.4057	102.7	9.27	1.42	2.10	12.79	5.19	0.51	0.08	0.39	0.98	0.40	0.17	0.07	13.94	5.65	
33年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	4%	0.3901	102.7	9.19	1.41	2.10	12.69	4.95	0.51	0.08	0.39	0.98	0.38	0.17	0.06	13.83	5.40	
34年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	4%	0.3751	102.7	9.10	1.40	2.10	12.59	4.72	0.50	0.08	0.39	0.97	0.36	0.16	0.06	13.73	5.15	
35年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	4%	0.3607	102.7	9.01	1.38	2.10	12.49	4.51	0.50	0.08	0.39	0.96	0.35	0.16	0.06	13.62	4.91	
36年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	4%	0.3468	102.7	8.93	1.37	2.10	12.40	4.30	0.49	0.08	0.39	0.96	0.33	0.16	0.06	13.52	4.69	
37年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	4%	0.3335	102.7	8.84	1.36	2.10	12.30	4.10	0.49	0.08	0.39	0.95	0.32	0.16	0.05	13.41	4.47	
38年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	4%	0.3207	102.7	8.75	1.35	2.10	12.20	3.91	0.48	0.08	0.39	0.95	0.30	0.16	0.05	13.31	4.27	
39年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	4%	0.3083	102.7	8.67	1.34	2.10	12.10	3.73	0.48	0.08	0.39	0.94	0.29	0.16	0.05	13.20	4.07	
40年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	4%	0.2965	102.7	8.58	1.32	2.10	12.00	3.56	0.47	0.08	0.39	0.94	0.28	0.16	0.05	13.10	3.88	
41年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	4%	0.2851	102.7	8.49	1.31	2.10	11.90	3.39	0.47	0.08	0.39	0.93	0.27	0.16	0.04	12.99	3.70	
42年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	4%	0.2741	102.7	8.41	1.30	2.10	11.81	3.24	0.46	0.07	0.39	0.93	0.25	0.15	0.04	12.89	3.53	
43年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	4%	0.2636	102.7	8.32	1.29	2.10	11.71	3.09	0.46	0.07	0.39	0.92	0.24	0.15	0.04	12.78	3.37	
44年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	4%	0.2534	102.7	8.24	1.28	2.10	11.61	2.94	0.45	0.07	0.39	0.92	0.23	0.15	0.04	12.68	3.21	
45年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	4%	0.2437	102.7	8.15	1.27	2.1												

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター 102.7	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合 計 (億円)	
		乗用車種	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車種	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車種	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値	
供用開始年次	H 27	0.99654	0.98345	1.00422	0.99541	4%	1.3959	100.2	2.92	0.75	1.68	5.36	7.67	0.19	0.05	0.33	0.56	0.81	0.08	0.11	6.00	8.59	
1年目	H 28	0.99653	0.98317	1.00421	0.99539	4%	1.3423	100.2	2.91	0.74	1.69	5.34	7.35	0.19	0.05	0.33	0.56	0.78	0.08	0.11	5.99	8.24	
2年目	H 29	0.99651	0.98288	1.00419	0.99537	4%	1.2906	100.5	2.90	0.73	1.70	5.33	7.03	0.19	0.04	0.33	0.56	0.74	0.08	0.10	5.97	7.87	
3年目	H 30	0.99650	0.98258	1.00417	0.99535	4%	1.2410	100.4	2.89	0.72	1.70	5.31	6.74	0.19	0.04	0.33	0.56	0.72	0.08	0.10	5.95	7.56	
4年目	R 1	0.99649	0.98227	1.00415	0.99533	4%	1.1933	101.2	2.88	0.70	1.71	5.30	6.42	0.19	0.04	0.33	0.56	0.68	0.08	0.09	5.94	7.19	
5年目	R 2	0.99648	0.98195	1.00414	0.99531	4%	1.1474	101.9	2.87	0.69	1.72	5.28	6.11	0.19	0.04	0.33	0.56	0.65	0.08	0.09	5.92	6.85	
6年目	R 3	0.99647	0.98162	1.00412	0.99528	4%	1.1032	101.8	2.86	0.68	1.73	5.27	5.86	0.19	0.04	0.34	0.56	0.63	0.08	0.08	5.91	6.57	
7年目	R 4	0.99645	0.98128	1.00410	0.99526	4%	1.0608	102.7	2.85	0.67	1.73	5.25	5.57	0.19	0.04	0.34	0.56	0.60	0.08	0.08	5.89	6.25	
8年目	R 5	0.99644	0.98092	1.00409	0.99524	2%	1.0200	102.7	2.84	0.65	1.74	5.24	5.34	0.19	0.04	0.34	0.56	0.58	0.07	0.08	5.88	5.99	
9年目	R 6	0.99643	0.98055	1.00407	0.99522	2%	1.0000	102.7	2.83	0.64	1.75	5.22	5.22	0.19	0.04	0.34	0.56	0.56	0.07	0.07	5.86	5.86	
10年目	R 7	0.99642	0.98016	1.00405	0.99519	2%	0.9804	102.7	2.82	0.63	1.75	5.21	5.10	0.18	0.04	0.34	0.56	0.55	0.07	0.07	5.84	5.73	
11年目	R 8	0.99640	0.97976	1.00404	0.99517	2%	0.9612	102.7	2.81	0.62	1.76	5.19	4.99	0.18	0.04	0.34	0.56	0.54	0.07	0.07	5.83	5.60	
12年目	R 9	0.99639	0.97934	1.00402	0.99515	2%	0.9423	102.7	2.80	0.60	1.77	5.17	4.88	0.18	0.04	0.34	0.56	0.53	0.07	0.07	5.81	5.48	
13年目	R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	2%	0.9238	102.7	2.79	0.59	1.78	5.16	4.77	0.18	0.04	0.35	0.56	0.52	0.07	0.07	5.80	5.35	
14年目	R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	2%	0.9057	102.7	2.78	0.58	1.78	5.14	4.66	0.18	0.04	0.35	0.56	0.51	0.07	0.07	5.78	5.23	
15年目	R 12	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	2%	0.8880	102.7	2.77	0.57	1.79	5.13	4.55	0.18	0.03	0.35	0.56	0.50	0.07	0.06	5.76	5.12	
供用開始年次	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	2%	0.8706	102.7	10.27	1.69	2.05	14.01	12.20	0.57	0.10	0.38	1.04	0.91	0.18	0.16	15.24	13.26	
17年目	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	2%	0.8535	102.7	10.23	1.67	2.06	13.95	11.91	0.56	0.10	0.38	1.04	0.89	0.18	0.16	15.17	12.95	
18年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	2%	0.8368	102.7	10.18	1.65	2.06	13.89	11.63	0.56	0.09	0.38	1.04	0.87	0.18	0.15	15.11	12.65	
19年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	2%	0.8203	102.7	10.14	1.63	2.07	13.83	11.35	0.56	0.09	0.38	1.04	0.85	0.18	0.15	15.05	12.34	
20年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	2%	0.8043	102.7	10.09	1.61	2.07	13.77	11.08	0.56	0.09	0.38	1.03	0.83	0.18	0.14	14.99	12.05	
21年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	2%	0.7885	102.7	10.05	1.59	2.08	13.72	10.81	0.55	0.09	0.38	1.03	0.81	0.18	0.14	14.92	11.77	
22年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	2%	0.7730	102.7	10.01	1.57	2.08	13.66	10.56	0.55	0.09	0.39	1.03	0.79	0.18	0.14	14.86	11.49	
23年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	2%	0.7579	102.7	9.96	1.55	2.09	13.60	10.31	0.55	0.09	0.39	1.02	0.78	0.18	0.13	14.80	11.22	
24年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	2%	0.7430	102.7	9.92	1.52	2.09	13.54	10.06	0.55	0.09	0.39	1.02	0.76	0.18	0.13	14.74	10.95	
25年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	2%	0.7284	102.7	9.88	1.50	2.10	13.48	9.82	0.54	0.09	0.39	1.02	0.74	0.18	0.13	14.67	10.69	
26年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	2%	0.7142	102.7	9.79	1.49	2.10	13.38	9.56	0.54	0.09	0.39	1.01	0.72	0.17	0.12	14.57	10.40	
27年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	2%	0.7002	102.7	9.70	1.48	2.10	13.28	9.30	0.54	0.08	0.39	1.01	0.71	0.17	0.12	14.46	10.13	
28年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	2%	0.6864	102.7	9.62	1.47	2.10	13.18	9.05	0.53	0.08	0.39	1.00	0.69	0.17	0.12	14.36	9.86	
29年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	2%	0.6730	102.7	9.53	1.46	2.10	13.09	8.81	0.53	0.08	0.39	1.00	0.67	0.17	0.11	14.25	9.59	
30年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	2%	0.6598	102.7	9.44	1.44	2.10	12.99	8.57	0.52	0.08	0.39	0.99	0.65	0.17	0.11	14.15	9.33	
31年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	2%	0.6468	102.7	9.36	1.43	2.10	12.89	8.34	0.52	0.08	0.39	0.99	0.64	0.17	0.11	14.04	9.08	
32年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	2%	0.6342	102.7	9.27	1.42	2.10	12.79	8.11	0.51	0.08	0.39	0.98	0.62	0.17	0.11	13.94	8.84	
33年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	2%	0.6217	102.7	9.19	1.41	2.10	12.69	7.89	0.51	0.08	0.39	0.98	0.61	0.17	0.10	13.83	8.60	
34年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	2%	0.6095	102.7	9.10	1.40	2.10	12.59	7.68	0.50	0.08	0.39	0.97	0.59	0.16	0.10	13.73	8.37	
35年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	2%	0.5976	102.7	9.01	1.38	2.10	12.49	7.47	0.50	0.08	0.39	0.96	0.58	0.16	0.10	13.62	8.14	
36年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	2%	0.5859	102.7	8.93	1.37	2.10	12.40	7.26	0.49	0.08	0.39	0.96	0.56	0.16	0.09	13.52	7.92	
37年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	2%	0.5744	102.7	8.84	1.36	2.10	12.30	7.06	0.49	0.08	0.39	0.95	0.55	0.16	0.09	13.41	7.70	
38年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	2%	0.5631	102.7	8.75	1.35	2.10	12.20	6.87	0.48	0.08	0.39	0.95	0.53	0.16	0.09	13.31	7.49	
39年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	2%	0.5521	102.7	8.67	1.34	2.10	12.10	6.68	0.48	0.08	0.39	0.94	0.52	0.16	0.09	13.20	7.29	
40年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	2%	0.5412	102.7	8.58	1.32	2.10	12.00	6.50	0.47	0.08	0.39	0.94	0.51	0.16	0.08	13.10	7.09	
41年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	2%	0.5306	102.7	8.49	1.31	2.10	11.90	6.32	0.47	0.08	0.39	0.93	0.49	0.16	0.08	12.99	6.89	
42年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	2%	0.5202	102.7	8.41	1.30	2.10	11.81	6.14	0.46	0.07	0.39	0.93	0.48	0.15	0.08	12.89	6.70	
43年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	2%	0.5100	102.7	8.32	1.29	2.10	11.71	5.97	0.46	0.07	0.39	0.92	0.47	0.15	0.08	12.78	6.52	
44年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	2%	0.5000	102.7	8.24	1.28	2.10	11.61	5.80	0.45	0.07	0.39	0.92	0.46	0.15	0.08	12.68	6.34	
45年目	R 42	0.98941	0.99057	0																			

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター 102.7	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値	
供用開始年次	H 27	0.99654	0.98345	1.00422	0.99541	4%	1.3823	100.2	2.92	0.75	1.68	5.36	7.59	0.19	0.05	0.33	0.56	0.80	0.08	0.11	6.00	8.50	
1年目	H 28	0.99653	0.98317	1.00421	0.99539	4%	1.3291	100.2	2.91	0.74	1.69	5.34	7.28	0.19	0.05	0.33	0.56	0.77	0.08	0.11	5.99	8.15	
2年目	H 29	0.99651	0.98288	1.00419	0.99537	4%	1.2780	100.5	2.90	0.73	1.70	5.33	6.96	0.19	0.04	0.33	0.56	0.74	0.08	0.10	5.97	7.80	
3年目	H 30	0.99650	0.98258	1.00417	0.99535	4%	1.2288	100.4	2.89	0.72	1.70	5.31	6.68	0.19	0.04	0.33	0.56	0.71	0.08	0.10	5.95	7.48	
4年目	R 1	0.99649	0.98227	1.00415	0.99533	4%	1.1816	101.2	2.88	0.70	1.71	5.30	6.35	0.19	0.04	0.33	0.56	0.68	0.08	0.09	5.94	7.12	
5年目	R 2	0.99648	0.98195	1.00414	0.99531	4%	1.1361	101.9	2.87	0.69	1.72	5.28	6.05	0.19	0.04	0.33	0.56	0.65	0.08	0.09	5.92	6.78	
6年目	R 3	0.99647	0.98162	1.00412	0.99528	4%	1.0924	101.8	2.86	0.68	1.73	5.27	5.80	0.19	0.04	0.34	0.56	0.62	0.08	0.08	5.91	6.51	
7年目	R 4	0.99645	0.98128	1.00410	0.99526	4%	1.0504	102.7	2.85	0.67	1.73	5.25	5.52	0.19	0.04	0.34	0.56	0.59	0.08	0.08	5.89	6.19	
8年目	R 5	0.99644	0.98092	1.00409	0.99524	1%	1.0100	102.7	2.84	0.65	1.74	5.24	5.29	0.19	0.04	0.34	0.56	0.57	0.07	0.08	5.88	5.93	
9年目	R 6	0.99643	0.98055	1.00407	0.99522	1%	1.0000	102.7	2.83	0.64	1.75	5.22	5.22	0.19	0.04	0.34	0.56	0.56	0.07	0.07	5.86	5.86	
10年目	R 7	0.99642	0.98016	1.00405	0.99519	1%	0.9901	102.7	2.82	0.63	1.75	5.21	5.15	0.18	0.04	0.34	0.56	0.56	0.07	0.07	5.84	5.79	
11年目	R 8	0.99640	0.97976	1.00404	0.99517	1%	0.9803	102.7	2.81	0.62	1.76	5.19	5.09	0.18	0.04	0.34	0.56	0.55	0.07	0.07	5.83	5.71	
12年目	R 9	0.99639	0.97934	1.00402	0.99515	1%	0.9706	102.7	2.80	0.60	1.77	5.17	5.02	0.18	0.04	0.34	0.56	0.55	0.07	0.07	5.81	5.64	
13年目	R 10	0.99638	0.97891	1.00400	0.99512	1%	0.9610	102.7	2.79	0.59	1.78	5.16	4.96	0.18	0.04	0.35	0.56	0.54	0.07	0.07	5.80	5.57	
14年目	R 11	0.99636	0.97845	1.00399	0.99510	1%	0.9515	102.7	2.78	0.58	1.78	5.14	4.89	0.18	0.04	0.35	0.56	0.54	0.07	0.07	5.78	5.50	
15年目	R 12	0.99577	0.98787	1.00258	0.99566	1%	0.9420	102.7	2.77	0.57	1.79	5.13	4.83	0.18	0.03	0.35	0.56	0.53	0.07	0.07	5.76	5.43	
供用開始年次	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	1%	0.9327	102.7	10.27	1.69	2.05	14.01	13.07	0.57	0.10	0.38	1.04	0.97	0.18	0.17	15.24	14.21	
17年目	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	1%	0.9235	102.7	10.23	1.67	2.06	13.95	12.88	0.56	0.10	0.38	1.04	0.96	0.18	0.17	15.17	14.01	
18年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	1%	0.9143	102.7	10.18	1.65	2.06	13.89	12.70	0.56	0.09	0.38	1.04	0.95	0.18	0.17	15.11	13.82	
19年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	1%	0.9053	102.7	10.14	1.63	2.07	13.83	12.52	0.56	0.09	0.38	1.04	0.94	0.18	0.16	15.05	13.62	
20年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	1%	0.8963	102.7	10.09	1.61	2.07	13.77	12.35	0.56	0.09	0.38	1.03	0.93	0.18	0.16	14.99	13.43	
21年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	1%	0.8874	102.7	10.05	1.59	2.08	13.72	12.17	0.55	0.09	0.38	1.03	0.91	0.18	0.16	14.92	13.24	
22年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	1%	0.8787	102.7	10.01	1.57	2.08	13.66	12.00	0.55	0.09	0.39	1.03	0.90	0.18	0.16	14.86	13.06	
23年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	1%	0.8700	102.7	9.96	1.55	2.09	13.60	11.83	0.55	0.09	0.39	1.02	0.89	0.18	0.15	14.80	12.88	
24年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	1%	0.8613	102.7	9.92	1.52	2.09	13.54	11.66	0.55	0.09	0.39	1.02	0.88	0.18	0.15	14.74	12.69	
25年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	1%	0.8528	102.7	9.88	1.50	2.10	13.48	11.49	0.54	0.09	0.39	1.02	0.87	0.18	0.15	14.67	12.51	
26年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	1%	0.8444	102.7	9.79	1.49	2.10	13.38	11.30	0.54	0.09	0.39	1.01	0.86	0.17	0.15	14.57	12.30	
27年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	1%	0.8360	102.7	9.70	1.48	2.10	13.28	11.10	0.54	0.08	0.39	1.01	0.84	0.17	0.14	14.46	12.09	
28年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	1%	0.8277	102.7	9.62	1.47	2.10	13.18	10.91	0.53	0.08	0.39	1.00	0.83	0.17	0.14	14.36	11.88	
29年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	1%	0.8195	102.7	9.53	1.46	2.10	13.09	10.72	0.53	0.08	0.39	1.00	0.82	0.17	0.14	14.25	11.68	
30年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	1%	0.8114	102.7	9.44	1.44	2.10	12.99	10.54	0.52	0.08	0.39	0.99	0.81	0.17	0.14	14.15	11.48	
31年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	1%	0.8034	102.7	9.36	1.43	2.10	12.89	10.35	0.52	0.08	0.39	0.99	0.79	0.17	0.13	14.04	11.28	
32年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	1%	0.7954	102.7	9.27	1.42	2.10	12.79	10.17	0.51	0.08	0.39	0.98	0.78	0.17	0.13	13.94	11.09	
33年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	1%	0.7876	102.7	9.19	1.41	2.10	12.69	10.00	0.51	0.08	0.39	0.98	0.77	0.17	0.13	13.83	10.89	
34年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	1%	0.7798	102.7	9.10	1.40	2.10	12.59	9.82	0.50	0.08	0.39	0.97	0.76	0.16	0.13	13.73	10.70	
35年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	1%	0.7720	102.7	9.01	1.38	2.10	12.49	9.65	0.50	0.08	0.39	0.96	0.74	0.16	0.13	13.62	10.52	
36年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	1%	0.7644	102.7	8.93	1.37	2.10	12.40	9.48	0.49	0.08	0.39	0.96	0.73	0.16	0.12	13.52	10.33	
37年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	1%	0.7568	102.7	8.84	1.36	2.10	12.30	9.31	0.49	0.08	0.39	0.95	0.72	0.16	0.12	13.41	10.15	
38年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	1%	0.7493	102.7	8.75	1.35	2.10	12.20	9.14	0.48	0.08	0.39	0.95	0.71	0.16	0.12	13.31	9.97	
39年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	1%	0.7419	102.7	8.67	1.34	2.10	12.10	8.98	0.48	0.08	0.39	0.94	0.70	0.16	0.12	13.20	9.79	
40年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	1%	0.7346	102.7	8.58	1.32	2.10	12.00	8.82	0.47	0.08	0.39	0.94	0.69	0.16	0.11	13.10	9.62	
41年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	1%	0.7273	102.7	8.49	1.31	2.10	11.90	8.66	0.47	0.08	0.39	0.93	0.68	0.16	0.11	12.99	9.45	
42年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	1%	0.7201	102.7	8.41	1.30	2.10	11.81	8.50	0.46	0.07	0.39	0.93	0.67	0.15	0.11	12.89	9.28	
43年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	1%	0.7130	102.7	8.32	1.29	2.10	11.71	8.35	0.46	0.07	0.39	0.92	0.66	0.15	0.11	12.78	9.11	
44年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	1%	0.7059	102.7	8.24	1.28	2.10	11.61	8.19	0.45	0.07	0.39	0.92	0.65	0.15	0.11	12.68	8.95	
45年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0																		

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター 102.7	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合 計 (億円)	
	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車	① 計				現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値				
供用開始年次	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	4%	0.7599	102.7	7.72	1.16	1.73	10.60	8.06	0.16	0.06	0.29	0.51	0.39	0.03	0.03	11.15	8.47
1年目	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	4%	0.7307	102.7	7.68	1.14	1.74	10.56	7.72	0.16	0.06	0.29	0.51	0.37	0.03	0.03	11.11	8.12
2年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	4%	0.7026	102.7	7.65	1.13	1.74	10.52	7.39	0.16	0.06	0.29	0.51	0.36	0.03	0.02	11.06	7.77
3年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	4%	0.6756	102.7	7.62	1.11	1.75	10.48	7.08	0.16	0.06	0.29	0.51	0.34	0.03	0.02	11.02	7.45
4年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	4%	0.6496	102.7	7.58	1.10	1.75	10.43	6.78	0.16	0.06	0.29	0.51	0.33	0.03	0.02	10.98	7.13
5年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	4%	0.6246	102.7	7.55	1.08	1.76	10.39	6.49	0.16	0.06	0.29	0.51	0.32	0.03	0.02	10.93	6.83
6年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	4%	0.6006	102.7	7.52	1.07	1.76	10.35	6.22	0.16	0.06	0.29	0.51	0.30	0.03	0.02	10.89	6.54
7年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	4%	0.5775	102.7	7.49	1.06	1.76	10.31	5.95	0.16	0.05	0.29	0.51	0.29	0.03	0.02	10.85	6.26
8年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	4%	0.5553	102.7	7.45	1.04	1.77	10.26	5.70	0.16	0.05	0.30	0.51	0.28	0.03	0.02	10.80	6.00
9年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	4%	0.5339	102.7	7.42	1.03	1.77	10.22	5.46	0.16	0.05	0.30	0.51	0.27	0.03	0.02	10.76	5.74
10年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	4%	0.5134	102.7	7.36	1.02	1.77	10.15	5.21	0.16	0.05	0.30	0.50	0.26	0.03	0.02	10.68	5.49
11年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	4%	0.4936	102.7	7.29	1.01	1.77	10.07	4.97	0.15	0.05	0.30	0.50	0.25	0.03	0.02	10.61	5.24
12年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	4%	0.4746	102.7	7.23	1.00	1.77	10.00	4.75	0.15	0.05	0.30	0.50	0.24	0.03	0.02	10.53	5.00
13年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	4%	0.4564	102.7	7.16	1.00	1.77	9.93	4.53	0.15	0.05	0.30	0.50	0.23	0.03	0.01	10.46	4.77
14年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	4%	0.4388	102.7	7.10	0.99	1.77	9.86	4.32	0.15	0.05	0.30	0.50	0.22	0.03	0.01	10.38	4.56
15年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	4%	0.4220	102.7	7.03	0.98	1.77	9.78	4.13	0.15	0.05	0.30	0.49	0.21	0.03	0.01	10.31	4.35
16年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	4%	0.4057	102.7	6.97	0.97	1.77	9.71	3.94	0.15	0.05	0.30	0.49	0.20	0.03	0.01	10.23	4.15
17年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	4%	0.3901	102.7	6.90	0.96	1.77	9.64	3.76	0.15	0.05	0.30	0.49	0.19	0.03	0.01	10.16	3.96
18年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	4%	0.3751	102.7	6.84	0.95	1.77	9.56	3.59	0.14	0.05	0.30	0.49	0.18	0.03	0.01	10.08	3.78
19年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	4%	0.3607	102.7	6.77	0.95	1.77	9.49	3.42	0.14	0.05	0.30	0.49	0.18	0.03	0.01	10.01	3.61
20年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	4%	0.3468	102.7	6.71	0.94	1.77	9.42	3.27	0.14	0.05	0.30	0.49	0.17	0.03	0.01	9.93	3.44
21年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	4%	0.3335	102.7	6.64	0.93	1.77	9.34	3.12	0.14	0.05	0.30	0.48	0.16	0.03	0.01	9.86	3.29
22年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	4%	0.3207	102.7	6.58	0.92	1.77	9.27	2.97	0.14	0.05	0.30	0.48	0.15	0.03	0.01	9.78	3.14
23年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	4%	0.3083	102.7	6.51	0.91	1.77	9.20	2.84	0.14	0.05	0.30	0.48	0.15	0.03	0.01	9.71	2.99
24年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	4%	0.2965	102.7	6.45	0.91	1.77	9.12	2.71	0.14	0.05	0.30	0.48	0.14	0.03	0.01	9.63	2.86
25年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	4%	0.2851	102.7	6.38	0.90	1.77	9.05	2.58	0.13	0.05	0.30	0.48	0.14	0.03	0.01	9.56	2.72
26年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	4%	0.2741	102.7	6.32	0.89	1.77	8.98	2.46	0.13	0.05	0.30	0.47	0.13	0.03	0.01	9.48	2.60
27年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	4%	0.2636	102.7	6.25	0.88	1.77	8.90	2.35	0.13	0.05	0.30	0.47	0.12	0.03	0.01	9.41	2.48
28年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	4%	0.2534	102.7	6.19	0.87	1.77	8.83	2.24	0.13	0.04	0.30	0.47	0.12	0.03	0.01	9.33	2.36
29年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	4%	0.2437	102.7	6.12	0.86	1.77	8.76	2.13	0.13	0.04	0.30	0.47	0.11	0.03	0.01	9.26	2.26
30年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	4%	0.2343	102.7	6.06	0.86	1.77	8.69	2.03	0.13	0.04	0.30	0.47	0.11	0.03	0.01	9.18	2.15
31年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	4%	0.2253	102.7	5.99	0.85	1.77	8.61	1.94	0.13	0.04	0.30	0.47	0.10	0.03	0.01	9.11	2.05
32年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	4%	0.2166	102.7	5.93	0.84	1.77	8.54	1.85	0.13	0.04	0.30	0.46	0.10	0.03	0.01	9.03	1.96
33年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	4%	0.2083	102.7	5.86	0.83	1.77	8.47	1.76	0.12	0.04	0.30	0.46	0.10	0.03	0.01	8.96	1.87
34年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	4%	0.2003	102.7	5.80	0.82	1.77	8.39	1.68	0.12	0.04	0.30	0.46	0.09	0.03	0.01	8.88	1.78
35年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	4%	0.1926	102.7	5.73	0.82	1.77	8.32	1.60	0.12	0.04	0.30	0.46	0.09	0.03	0.01	8.80	1.70
36年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	4%	0.1852	102.7	5.67	0.81	1.77	8.25	1.53	0.12	0.04	0.30	0.46	0.08	0.03	0.00	8.73	1.62
37年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	4%	0.1780	102.7	5.60	0.80	1.77	8.17	1.45	0.12	0.04	0.30	0.45	0.08	0.03	0.00	8.65	1.54
38年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	4%	0.1712	102.7	5.54	0.79	1.77	8.10	1.39	0.12	0.04	0.30	0.45	0.08	0.03	0.00	8.58	1.47
39年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	4%	0.1646	102.7	5.47	0.78	1.77	8.03	1.32	0.12	0.04	0.30	0.45	0.07	0.03	0.00	8.50	1.40
40年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	4%	0.1583	102.7	5.41	0.78	1.77	7.95	1.26	0.11	0.04	0.30	0.45	0.07	0.03	0.00	8.43	1.33
41年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	4%	0.1522	102.7	5.34	0.77	1.77	7.88	1.20	0.11	0.04	0.30	0.45	0.07	0.03	0.00	8.35	1.27
42年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048	4%	0.1463	102.7	5.28	0.76	1.77	7.81	1.14	0.11	0.04	0.30	0.45	0.07	0.03	0.00	8.28	1.21
43年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039	4%	0.1407	102.7	5.21	0.75	1.77	7.73	1.09	0.11	0.04	0.30	0.44	0.06	0.02	0.00	8.20	1.15
44年目	R 57	0.98740	0.98902	0.99993	0.99029	4%	0.1353	102.7	5.15	0.74	1.77	7.66	1.04	0.11	0.04	0.30	0.44	0.06	0.02	0.00	8.13	1.10
45年目	R 58	0.98724	0.988898																			

年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸7ロク)				社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合 計 (億円)		
	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車				(A)	102.7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)
年次	R	6																				
供用開始年次	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	2%	0.8706	102.7	7.72	1.16	1.73	10.60	9.23	0.16	0.06	0.29	0.51	0.45	0.03	0.03	11.15	9.71
1年目	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	2%	0.8535	102.7	7.68	1.14	1.74	10.56	9.20	0.16	0.06	0.29	0.51	0.44	0.03	0.03	11.11	9.48
2年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	2%	0.8368	102.7	7.65	1.13	1.74	10.52	8.80	0.16	0.06	0.29	0.51	0.43	0.03	0.03	11.06	9.26
3年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	2%	0.8203	102.7	7.62	1.11	1.75	10.48	8.59	0.16	0.06	0.29	0.51	0.42	0.03	0.03	11.02	9.04
4年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	2%	0.8043	102.7	7.58	1.10	1.75	10.43	8.39	0.16	0.06	0.29	0.51	0.41	0.03	0.03	10.98	8.83
5年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	2%	0.7885	102.7	7.55	1.08	1.76	10.39	8.19	0.16	0.06	0.29	0.51	0.40	0.03	0.03	10.93	8.62
6年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	2%	0.7730	102.7	7.52	1.07	1.76	10.35	8.00	0.16	0.06	0.29	0.51	0.39	0.03	0.03	10.89	8.42
7年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	2%	0.7579	102.7	7.49	1.06	1.76	10.31	7.81	0.16	0.05	0.29	0.51	0.38	0.03	0.03	10.85	8.22
8年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	2%	0.7430	102.7	7.45	1.04	1.77	10.26	7.63	0.16	0.05	0.30	0.51	0.38	0.03	0.02	10.80	8.03
9年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	2%	0.7284	102.7	7.42	1.03	1.77	10.22	7.45	0.16	0.05	0.30	0.51	0.37	0.03	0.02	10.76	7.84
10年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	2%	0.7142	102.7	7.36	1.02	1.77	10.15	7.25	0.16	0.05	0.30	0.50	0.36	0.03	0.02	10.68	7.63
11年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	2%	0.7002	102.7	7.29	1.01	1.77	10.07	7.05	0.15	0.05	0.30	0.50	0.35	0.03	0.02	10.61	7.43
12年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	2%	0.6864	102.7	7.23	1.00	1.77	10.00	6.87	0.15	0.05	0.30	0.50	0.34	0.03	0.02	10.53	7.23
13年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	2%	0.6730	102.7	7.16	1.00	1.77	9.93	6.68	0.15	0.05	0.30	0.50	0.34	0.03	0.02	10.46	7.04
14年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	2%	0.6598	102.7	7.10	0.99	1.77	9.86	6.50	0.15	0.05	0.30	0.50	0.33	0.03	0.02	10.38	6.85
15年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	2%	0.6468	102.7	7.03	0.98	1.77	9.78	6.33	0.15	0.05	0.30	0.49	0.32	0.03	0.02	10.31	6.67
16年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	2%	0.6342	102.7	6.97	0.97	1.77	9.71	6.16	0.15	0.05	0.30	0.49	0.31	0.03	0.02	10.23	6.49
17年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	2%	0.6217	102.7	6.90	0.96	1.77	9.64	5.99	0.15	0.05	0.30	0.49	0.31	0.03	0.02	10.16	6.32
18年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	2%	0.6095	102.7	6.84	0.95	1.77	9.56	5.83	0.14	0.05	0.30	0.49	0.30	0.03	0.02	10.08	6.15
19年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	2%	0.5976	102.7	6.77	0.95	1.77	9.49	5.67	0.14	0.05	0.30	0.49	0.29	0.03	0.02	10.01	5.98
20年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	2%	0.5859	102.7	6.71	0.94	1.77	9.42	5.52	0.14	0.05	0.30	0.49	0.28	0.03	0.02	9.93	5.82
21年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	2%	0.5744	102.7	6.64	0.93	1.77	9.34	5.37	0.14	0.05	0.30	0.48	0.28	0.03	0.02	9.86	5.66
22年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	2%	0.5631	102.7	6.58	0.92	1.77	9.27	5.22	0.14	0.05	0.30	0.48	0.27	0.03	0.02	9.78	5.51
23年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	2%	0.5521	102.7	6.51	0.91	1.77	9.20	5.08	0.14	0.05	0.30	0.48	0.27	0.03	0.02	9.71	5.36
24年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	2%	0.5412	102.7	6.45	0.91	1.77	9.12	4.94	0.14	0.05	0.30	0.48	0.26	0.03	0.02	9.63	5.21
25年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	2%	0.5306	102.7	6.38	0.90	1.77	9.05	4.80	0.13	0.05	0.30	0.48	0.25	0.03	0.02	9.56	5.07
26年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	2%	0.5202	102.7	6.32	0.89	1.77	8.98	4.67	0.13	0.05	0.30	0.47	0.25	0.03	0.02	9.48	4.93
27年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	2%	0.5100	102.7	6.25	0.88	1.77	8.90	4.54	0.13	0.05	0.30	0.47	0.24	0.03	0.01	9.41	4.80
28年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	2%	0.5000	102.7	6.19	0.87	1.77	8.83	4.42	0.13	0.04	0.30	0.47	0.24	0.03	0.01	9.33	4.67
29年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	2%	0.4902	102.7	6.12	0.86	1.77	8.76	4.29	0.13	0.04	0.30	0.47	0.23	0.03	0.01	9.26	4.54
30年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	2%	0.4806	102.7	6.06	0.86	1.77	8.69	4.17	0.13	0.04	0.30	0.47	0.22	0.03	0.01	9.18	4.41
31年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	2%	0.4712	102.7	5.99	0.85	1.77	8.61	4.06	0.13	0.04	0.30	0.47	0.22	0.03	0.01	9.11	4.29
32年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	2%	0.4619	102.7	5.93	0.84	1.77	8.54	3.94	0.13	0.04	0.30	0.46	0.21	0.03	0.01	9.03	4.17
33年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	2%	0.4529	102.7	5.86	0.83	1.77	8.47	3.83	0.12	0.04	0.30	0.46	0.21	0.03	0.01	8.96	4.06
34年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	2%	0.4440	102.7	5.80	0.82	1.77	8.39	3.73	0.12	0.04	0.30	0.46	0.20	0.03	0.01	8.88	3.94
35年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	2%	0.4353	102.7	5.73	0.82	1.77	8.32	3.62	0.12	0.04	0.30	0.46	0.20	0.03	0.01	8.80	3.83
36年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	2%	0.4268	102.7	5.67	0.81	1.77	8.25	3.52	0.12	0.04	0.30	0.46	0.19	0.03	0.01	8.73	3.73
37年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	2%	0.4184	102.7	5.60	0.80	1.77	8.17	3.42	0.12	0.04	0.30	0.45	0.19	0.03	0.01	8.65	3.62
38年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	2%	0.4102	102.7	5.54	0.79	1.77	8.10	3.32	0.12	0.04	0.30	0.45	0.19	0.03	0.01	8.58	3.52
39年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	2%	0.4022	102.7	5.47	0.78	1.77	8.03	3.23	0.12	0.04	0.30	0.45	0.18	0.03	0.01	8.50	3.42
40年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	2%	0.3943	102.7	5.41	0.78	1.77	7.95	3.14	0.11	0.04	0.30	0.45	0.18	0.03	0.01	8.43	3.32
41年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	2%	0.3865	102.7	5.34	0.77	1.77	7.88	3.05	0.11	0.04	0.30	0.45	0.17	0.03	0.01	8.35	3.23
42年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048	2%	0.3790	102.7	5.28	0.76	1.77	7.81	2.96	0.11	0.04	0.30	0.45	0.17	0.03	0.01	8.28	3.14
43年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039	2%	0.3715	102.7	5.21	0.75	1.77	7.73	2.87	0.11	0.04	0.30	0.44	0.16	0.02	0.01	8.20	3.05
44年目	R 57	0.98740	0.98902	0.99993	0.99029	2%	0.3642	102.7	5.15	0.74	1.77	7.66	2.79	0.11	0.04	0.30	0.44	0.16	0.02	0.01	8.13	2.96
45年目	R 58	0.98724	0.98889	0.99993	0.99020	2%	0.3571	102.7	5.09	0.73	1.77	7.59	2.71	0.11	0.04	0.30	0.44	0.16	0.02	0.01	8.05	2.88
46年目	R 59	0.98708	0.98877	0.99993	0.99010	2%	0.3501	102.7	5.02	0.73	1.77	7.52	2.63	0.11	0.04	0.30	0.44	0.15	0.02	0.01	7.98	2.79
47年目	R 60	0.98691	0.98864	0.99993	0.99000	2%	0.3432	102.7	4.96	0.72	1.77	7.44	2.55	0.10	0.04	0.30	0.44	0.15	0.02	0.01	7.90	2.71
48年目	R 61	0.98674	0.98851	0.99993	0.98990	2%	0.3365	102.7	4.89	0.71	1.77	7.37	2.48	0.10	0.04	0.30	0.43	0.15	0.02	0.01	7.83	2.63
49年目	R 62	0.98656	0.98838	0.99993	0.98980	2%	0.3299	102.7	4.83	0.70	1.77	7.30	2.41	0.10	0.04	0.30	0.43	0.14	0.02	0.01	7.75	2.56
合 計									319.31	45.35	88.35	453.00	260.72	6.75	2.33	14.74	23.82	13.48	1.47	0.84	478.29	275.05

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道159号 七尾バイパス

年度 (基準年)	R	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター 102.7	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合 計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車				乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値			
年次	R	6	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車		(A)	102.7	乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値
供用開始年次	R 13	0.99575	0.98772	1.00257	0.99564	1%	0.9327	102.7	7.72	1.16	1.73	10.60	9.89	0.16	0.06	0.29	0.51	0.48	0.03	0.03	11.15	10.40	
1年目	R 14	0.99573	0.98757	1.00257	0.99562	1%	0.9235	102.7	7.68	1.14	1.74	10.56	9.75	0.16	0.06	0.29	0.51	0.47	0.03	0.03	11.11	10.26	
2年目	R 15	0.99571	0.98741	1.00256	0.99561	1%	0.9143	102.7	7.65	1.13	1.74	10.52	9.62	0.16	0.06	0.29	0.51	0.47	0.03	0.03	11.06	10.12	
3年目	R 16	0.99570	0.98725	1.00255	0.99559	1%	0.9053	102.7	7.62	1.11	1.75	10.48	9.48	0.16	0.06	0.29	0.51	0.46	0.03	0.03	11.02	9.98	
4年目	R 17	0.99568	0.98708	1.00255	0.99557	1%	0.8963	102.7	7.58	1.10	1.75	10.43	9.35	0.16	0.06	0.29	0.51	0.46	0.03	0.03	10.98	9.84	
5年目	R 18	0.99566	0.98692	1.00254	0.99555	1%	0.8874	102.7	7.55	1.08	1.76	10.39	9.22	0.16	0.06	0.29	0.51	0.45	0.03	0.03	10.93	9.70	
6年目	R 19	0.99564	0.98674	1.00253	0.99553	1%	0.8787	102.7	7.52	1.07	1.76	10.35	9.09	0.16	0.06	0.29	0.51	0.45	0.03	0.03	10.89	9.57	
7年目	R 20	0.99562	0.98656	1.00253	0.99551	1%	0.8700	102.7	7.49	1.06	1.76	10.31	8.97	0.16	0.05	0.29	0.51	0.44	0.03	0.03	10.85	9.44	
8年目	R 21	0.99560	0.98638	1.00252	0.99549	1%	0.8613	102.7	7.45	1.04	1.77	10.26	8.84	0.16	0.05	0.30	0.51	0.44	0.03	0.03	10.80	9.30	
9年目	R 22	0.99126	0.99207	0.99993	0.99276	1%	0.8528	102.7	7.42	1.03	1.77	10.22	8.72	0.16	0.05	0.30	0.51	0.43	0.03	0.03	10.76	9.18	
10年目	R 23	0.99118	0.99200	0.99993	0.99270	1%	0.8444	102.7	7.36	1.02	1.77	10.15	8.57	0.16	0.05	0.30	0.50	0.43	0.03	0.03	10.68	9.02	
11年目	R 24	0.99110	0.99194	0.99993	0.99265	1%	0.8360	102.7	7.29	1.01	1.77	10.07	8.42	0.15	0.05	0.30	0.50	0.42	0.03	0.03	10.61	8.87	
12年目	R 25	0.99102	0.99187	0.99993	0.99259	1%	0.8277	102.7	7.23	1.00	1.77	10.00	8.28	0.15	0.05	0.30	0.50	0.41	0.03	0.03	10.53	8.72	
13年目	R 26	0.99094	0.99181	0.99993	0.99254	1%	0.8195	102.7	7.16	1.00	1.77	9.93	8.14	0.15	0.05	0.30	0.50	0.41	0.03	0.03	10.46	8.57	
14年目	R 27	0.99086	0.99174	0.99993	0.99248	1%	0.8114	102.7	7.10	0.99	1.77	9.86	8.00	0.15	0.05	0.30	0.50	0.40	0.03	0.03	10.38	8.43	
15年目	R 28	0.99077	0.99167	0.99993	0.99243	1%	0.8034	102.7	7.03	0.98	1.77	9.78	7.86	0.15	0.05	0.30	0.49	0.40	0.03	0.03	10.31	8.28	
16年目	R 29	0.99069	0.99160	0.99993	0.99237	1%	0.7954	102.7	6.97	0.97	1.77	9.71	7.72	0.15	0.05	0.30	0.49	0.39	0.03	0.03	10.23	8.14	
17年目	R 30	0.99060	0.99153	0.99993	0.99231	1%	0.7876	102.7	6.90	0.96	1.77	9.64	7.59	0.15	0.05	0.30	0.49	0.39	0.03	0.02	10.16	8.00	
18年目	R 31	0.99051	0.99146	0.99993	0.99225	1%	0.7798	102.7	6.84	0.95	1.77	9.56	7.46	0.14	0.05	0.30	0.49	0.38	0.03	0.02	10.08	7.86	
19年目	R 32	0.99042	0.99138	0.99993	0.99219	1%	0.7720	102.7	6.77	0.95	1.77	9.49	7.33	0.14	0.05	0.30	0.49	0.38	0.03	0.02	10.01	7.73	
20年目	R 33	0.99033	0.99131	0.99993	0.99213	1%	0.7644	102.7	6.71	0.94	1.77	9.42	7.20	0.14	0.05	0.30	0.49	0.37	0.03	0.02	9.93	7.59	
21年目	R 34	0.99023	0.99123	0.99993	0.99207	1%	0.7568	102.7	6.64	0.93	1.77	9.34	7.07	0.14	0.05	0.30	0.48	0.37	0.03	0.02	9.86	7.46	
22年目	R 35	0.99014	0.99115	0.99993	0.99200	1%	0.7493	102.7	6.58	0.92	1.77	9.27	6.95	0.14	0.05	0.30	0.48	0.36	0.03	0.02	9.78	7.33	
23年目	R 36	0.99004	0.99108	0.99993	0.99194	1%	0.7419	102.7	6.51	0.91	1.77	9.20	6.82	0.14	0.05	0.30	0.48	0.36	0.03	0.02	9.71	7.20	
24年目	R 37	0.98994	0.99099	0.99993	0.99187	1%	0.7346	102.7	6.45	0.91	1.77	9.12	6.70	0.14	0.05	0.30	0.48	0.35	0.03	0.02	9.63	7.08	
25年目	R 38	0.98984	0.99091	0.99993	0.99181	1%	0.7273	102.7	6.38	0.90	1.77	9.05	6.58	0.13	0.05	0.30	0.48	0.35	0.03	0.02	9.56	6.95	
26年目	R 39	0.98973	0.99083	0.99993	0.99174	1%	0.7201	102.7	6.32	0.89	1.77	8.98	6.46	0.13	0.05	0.30	0.47	0.34	0.03	0.02	9.48	6.83	
27年目	R 40	0.98963	0.99074	0.99993	0.99167	1%	0.7130	102.7	6.25	0.88	1.77	8.90	6.35	0.13	0.05	0.30	0.47	0.34	0.03	0.02	9.41	6.71	
28年目	R 41	0.98952	0.99066	0.99993	0.99160	1%	0.7059	102.7	6.19	0.87	1.77	8.83	6.23	0.13	0.04	0.30	0.47	0.33	0.03	0.02	9.33	6.59	
29年目	R 42	0.98941	0.99057	0.99993	0.99153	1%	0.6989	102.7	6.12	0.86	1.77	8.76	6.12	0.13	0.04	0.30	0.47	0.33	0.03	0.02	9.26	6.47	
30年目	R 43	0.98929	0.99048	0.99993	0.99146	1%	0.6920	102.7	6.06	0.86	1.77	8.69	6.01	0.13	0.04	0.30	0.47	0.32	0.03	0.02	9.18	6.35	
31年目	R 44	0.98918	0.99039	0.99993	0.99138	1%	0.6852	102.7	5.99	0.85	1.77	8.61	5.90	0.13	0.04	0.30	0.47	0.32	0.03	0.02	9.11	6.24	
32年目	R 45	0.98906	0.99030	0.99993	0.99131	1%	0.6784	102.7	5.93	0.84	1.77	8.54	5.79	0.13	0.04	0.30	0.46	0.31	0.03	0.02	9.03	6.13	
33年目	R 46	0.98894	0.99020	0.99993	0.99123	1%	0.6717	102.7	5.86	0.83	1.77	8.47	5.69	0.12	0.04	0.30	0.46	0.31	0.03	0.02	8.96	6.02	
34年目	R 47	0.98881	0.99010	0.99993	0.99115	1%	0.6650	102.7	5.80	0.82	1.77	8.39	5.58	0.12	0.04	0.30	0.46	0.31	0.03	0.02	8.88	5.91	
35年目	R 48	0.98869	0.99000	0.99993	0.99107	1%	0.6584	102.7	5.73	0.82	1.77	8.32	5.48	0.12	0.04	0.30	0.46	0.30	0.03	0.02	8.80	5.80	
36年目	R 49	0.98856	0.98990	0.99993	0.99099	1%	0.6519	102.7	5.67	0.81	1.77	8.25	5.38	0.12	0.04	0.30	0.46	0.30	0.03	0.02	8.73	5.69	
37年目	R 50	0.98842	0.98980	0.99993	0.99091	1%	0.6454	102.7	5.60	0.80	1.77	8.17	5.28	0.12	0.04	0.30	0.45	0.29	0.03	0.02	8.65	5.59	
38年目	R 51	0.98829	0.98970	0.99993	0.99083	1%	0.6391	102.7	5.54	0.79	1.77	8.10	5.18	0.12	0.04	0.30	0.45	0.29	0.03	0.02	8.58	5.48	
39年目	R 52	0.98815	0.98959	0.99993	0.99074	1%	0.6327	102.7	5.47	0.78	1.77	8.03	5.08	0.12	0.04	0.30	0.45	0.29	0.03	0.02	8.50	5.38	
40年目	R 53	0.98801	0.98948	0.99993	0.99066	1%	0.6265	102.7	5.41	0.78	1.77	7.95	4.98	0.11	0.04	0.30	0.45	0.28	0.03	0.02	8.43	5.28	
41年目	R 54	0.98786	0.98937	0.99993	0.99057	1%	0.6203	102.7	5.34	0.77	1.77	7.88	4.89	0.11	0.04	0.30	0.45	0.28	0.03	0.02	8.35	5.18	
42年目	R 55	0.98771	0.98925	0.99993	0.99048	1%	0.6141	102.7	5.28	0.76	1.77	7.81	4.79	0.11	0.04	0.30	0.45	0.27	0.03	0.02	8.28	5.08	
43年目	R 56	0.98756	0.98914	0.99993	0.99039	1%	0.6080	102.7	5.21	0.75	1.77	7.73	4.70	0.11	0.04	0.30	0.44	0.27	0.02	0.02	8.20	4.99	
44年目	R 57	0.98740	0.98902	0.99993	0.99																		
