

## グルーピング切削汚泥の減量化

工事名：新潟空港滑走路改良工事


概要：【従来】切削屑の全量を建設汚泥として処分

⇒ 【新】切削屑を脱水したのちアスファルト廃材として処分

グルーピング（滑走路表面の排水性を高めるために施す細かな溝）を施工する際に発生するアスファルトの切削屑を減量化し、かつアスファルト廃材として処分することで、処分費を安価に抑えた。

効果：

- ・ 工事費を59百万円から55百万円に縮減。  
（縮減額 4百万円、縮減率約6.7%）

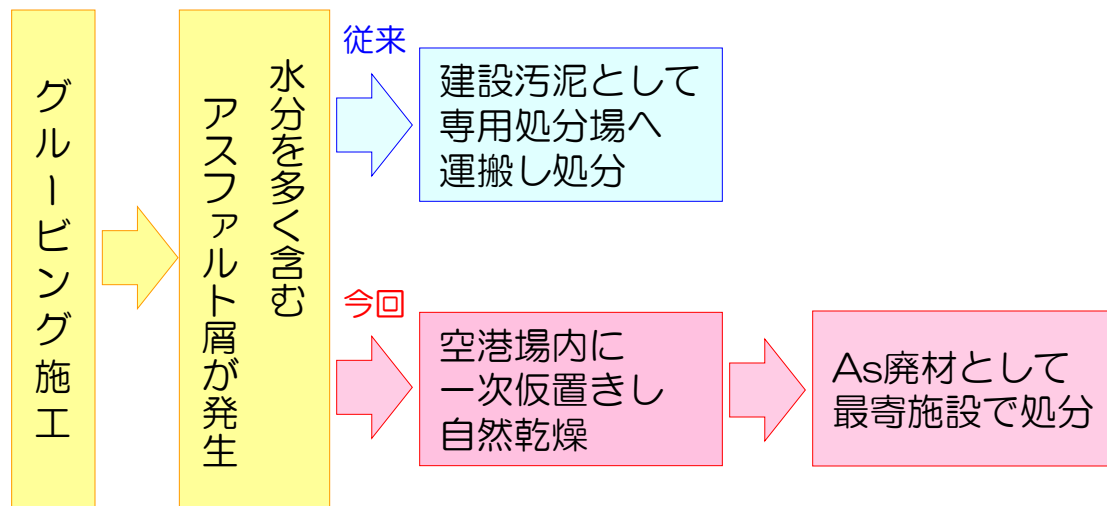

切削屑の脱水状況
