

工程表(道路)

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
4. 交通網 (1) 道路 (高速道路) ① 東北自動車道 他11路線																	
② 常磐自動車道	※本復旧については、福島第一原子力発電所警戒区域(常磐道広野IC～常磐富岡IC)を除く ※福島第一原子力発電所警戒区域(常磐道広野IC～常磐富岡IC)は、環境省が平成24年3月に着手した除染モデル事業の結果を踏まえ工事を進める。																

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
4. 交通網 (1) 道路 (直轄国道) ③一般国道4号 他9路線	応急復旧・本復旧 ※平成23年3月23日までに通行可能 ※橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧																
④一般国道6号	応急復旧 ・4月10日までに通行可能 (原発警戒区域内は8月31日 までに通行可能な状態) 本復旧 ※本復旧については、福島第一原子力発電所警戒区域を除く ※橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧																
⑤一般国道45号 三陸縦貫道	応急復旧 ・3月30日までに通行可能 ・7月10日までに広域迂回解消 本復旧 ※橋梁等大規模な被災箇所は地域の復興計画を踏まえて復旧																

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
4. 交通網 (1) 道路 (復興道路・復興支援道路) ⑥復興道路 (新規着手区間) ＜三陸沿岸道路＞ ・歌津～本吉等 約148km																	
	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手																逐次供用開始
⑦復興道路 (事業中区間) ＜三陸沿岸道路＞ ・釜石山田道路 ・八戸南道路 ・仙塩道路(4車線化) 等 約142km																	
	用地・工事の推進																逐次供用開始
					※平成24年度供用予定区間 ・菅代バイパス(4.2km) ・八戸南道路(5.3km)												
⑧復興支援道路 (新規着手区間) ＜東北横断自動車道釜石秋田線＞ ・釜石～釜石西等 約17km ＜東北中央自動車道＞ ・相馬～相馬西等 約11km ＜宮古盛岡横断道路＞ ・宮古～箱石等 約48km ＜宮城県北高速幹線道路＞ ・Ⅱ期(中田工区) 約5km																	
	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手																逐次供用開始
⑨復興支援道路 (事業中区間) ＜東北横断自動車道 釜石秋田線＞ ・遠野～宮守等 約33km ＜東北中央自動車道＞ ・阿武隈東道路等 約23km ＜宮古盛岡横断道路＞ ・都南川目道路等 約17km																	
	用地・工事の推進																逐次供用開始
					※平成24年度供用予定区間 ・東北横断自動車道釜石秋田線(宮守～東和)(24.0km)												

工程表(鉄道)

	H23				H24				H25				H26				H27以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
4. 交通網 (2) 鉄道																	
I. 旅客鉄道																	
三陸鉄道																	
JR山田線																	
JR大船渡線																	
JR気仙沼線																	
JR石巻線																	
JR仙石線																	
JR常磐線																	
II. 貨物鉄道																	
仙台臨海鉄道																	
JR貨物 (石巻港線)																	

H25年4月頃
盛～吉浜
運転再開見込み

H26年4月頃
全線運転再開見
込み

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

H25年度初
わたのは
渡波～女川
運転再開を目指す
(女川駅を除く)

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

H27年度内
全線運転再開を
目指す

鉄道工事着手か
ら
3年程度
相馬～亘理

H24年9月頃
全線運転再開
見込み

H24年12月頃
全線運転再開
見込み

工程表(空港)

		H23				H24				H25				H26				H27以降
		4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
4. 交通網 (3) 空港	仙台空港	★ 4/13 民航機の就航再開																
		★ 9/25 旅客ターミナル完全復旧、国内線・国際線定期便とも運航再開完了																
		★ 10/1 空港アクセス鉄道全線運転再開																
		旅客ターミナルビルの本格復旧																
		その他のインフラ施設の復旧(排水機能やエプロンの復旧等)について、順次実施																
復興関係	復興関係	空港施設の耐震対策を実施																
		空港の津波対策の検討等を実施																
復興関係	復興関係	三沢空港 庁舎の耐震対策を実施																
復興関係	復興関係	花巻空港 庁舎・管制塔の耐震対策を実施																
復興関係	復興関係	福島空港 庁舎・管制塔の耐震対策を実施																


八戸港 復旧工程計画

: 応急復旧工事
 : 暫定供用
 ☆ : 災害査定
 : 本格復旧工事
 : 供用

番号	施設名	水深	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度	平成27年度
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
①	八太郎地区 北防波堤(中央部)		平定利用可能																										
②	八太郎地区 北防波堤(ハネ部)		平定利用可能																										
③	河原木地区 航路・泊地	-14m	平定利用可能																										
④	河原木地区 泊地	-7.5m	平定利用可能																										
⑤	八太郎地区 航路・泊地	-12m -13m	平定利用可能																										
⑥	八太郎地区 泊地	-13m	平定利用可能																										
⑦	八太郎地区 泊地	-7.5m	平定利用可能																										
⑧	八太郎地区 泊地	-10m	平定利用可能																										
	八戸港海岸	-10m	平定利用可能																										

施設配置図

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

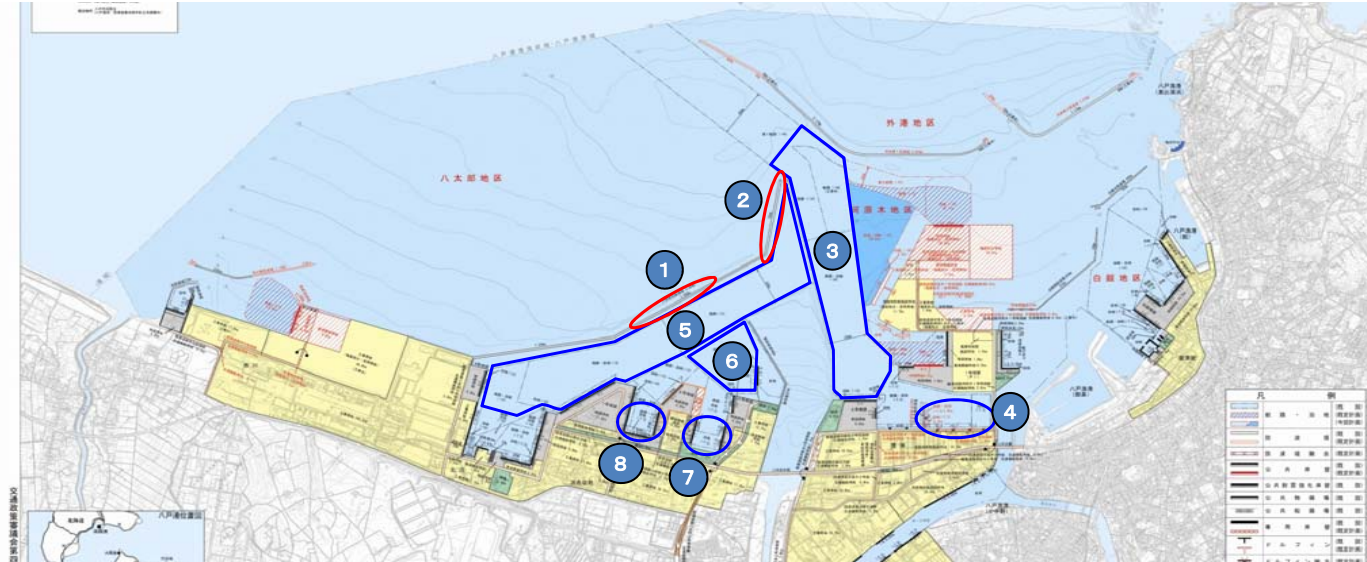

久慈港 復旧工程計画

■ : 応急復旧工事 ■ : 暫定供用 ☆ : 災害査定 ■ : 本格復旧工事 ■ : 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	諏訪下	-10m	非金属鉱物				☆																						
②	諏訪下 1号岸壁	-7.5m	木材チップ				☆																						
③	諏訪下 2号岸壁	-7.5m	木材チップ				☆																						
④	諏訪下 3号岸壁	-7.5m	木材チップ				☆																						
⑤	掘込	-6.0m	水産品				☆																						
⑥	掘込	-4.5m	重油				☆																						
⑦	湾口防波堤						☆																						
	久慈港海岸										☆																		

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

施設配置図



宮古港 復旧 工程 計画

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	藤原	-12m	りん鉱石					☆							暫定利用可能														
②	藤原	-7.5m	化学肥料					☆							暫定利用可能														
③	藤原	-7.5m	化学薬品					☆							暫定利用可能														
④	藤原	-7.5m	非金属鉱物					☆							暫定利用可能														
⑤	藤原	-7.5m	木材チップ					☆							暫定利用可能														
⑥	藤原	-10m	食料工業品					☆							暫定利用可能														
⑦	出崎	-7.3m	水産品								☆					暫定利用可能													
⑧	出崎	-9.0m	水産品					☆																					
⑨	出崎防波堤							☆																					
	宮古港海岸										☆																		

施設配置図



※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。


釜石港 復旧工程計画

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	須賀	-11m	完成自動車																										
				☆												暫定利用可能													
②	須賀 耐震強化	-7.5m	金属くず																										
				☆												暫定利用可能													
③	須賀	-7.5m	砂・砂利																										
				☆												暫定利用可能													
④	須賀	-4.5m	コークス																										
				☆												暫定利用可能													
⑤	湾口防波堤														☆	平成27年度未完了見込み													
	釜石港海岸														☆														

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

施設配置図

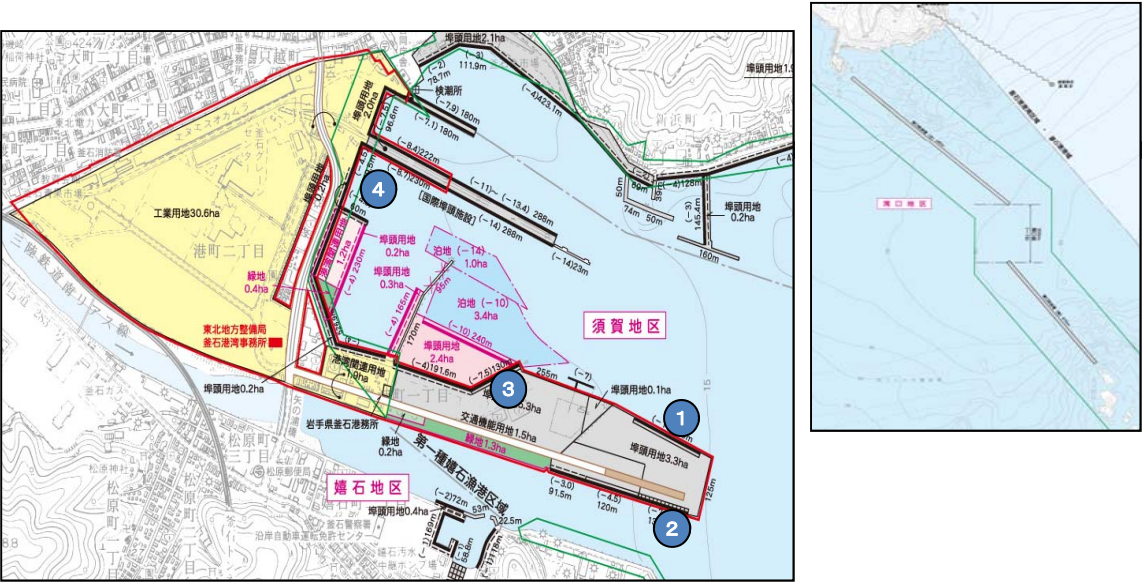

大船渡港 復旧工程計画

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	野々田	-13m	コンテナ																										
											☆																		
②	野々田	-7.5m	砂・砂利									☆																	
												☆																	
③	永浜	-13m	石油製品									☆																	
												☆																	
④	茶屋前	-9.0m	石炭									☆																	
												☆																	
⑤	湾口防波堤												☆																
													☆																
	大船渡港海岸												☆																
													☆																

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

施設配置図




石 巻 港 復 旧 工 程 計 画

■ : 応急復旧工事 ■ : 暫定供用 ☆ : 災害査定 ■ : 本格復旧工事 ■ : 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	雲雀野 1号	-13m	原木																										
②	雲雀野 2号	-13m	石炭																										
③	雲雀野北埠頭	-10m	石材																										
④	中島埠頭	-10m	非金属鉱物																										
⑤	日和埠頭	-10m	穀物																										
⑥	日和埠頭	-9m	石灰石																										
⑦	南浜埠頭	-9m	原木																										
⑧	南浜埠頭	-10m	木材チップ																										
⑨	民有護岸、係留施設																												
⑩	石巻港海岸																												

施設配置図

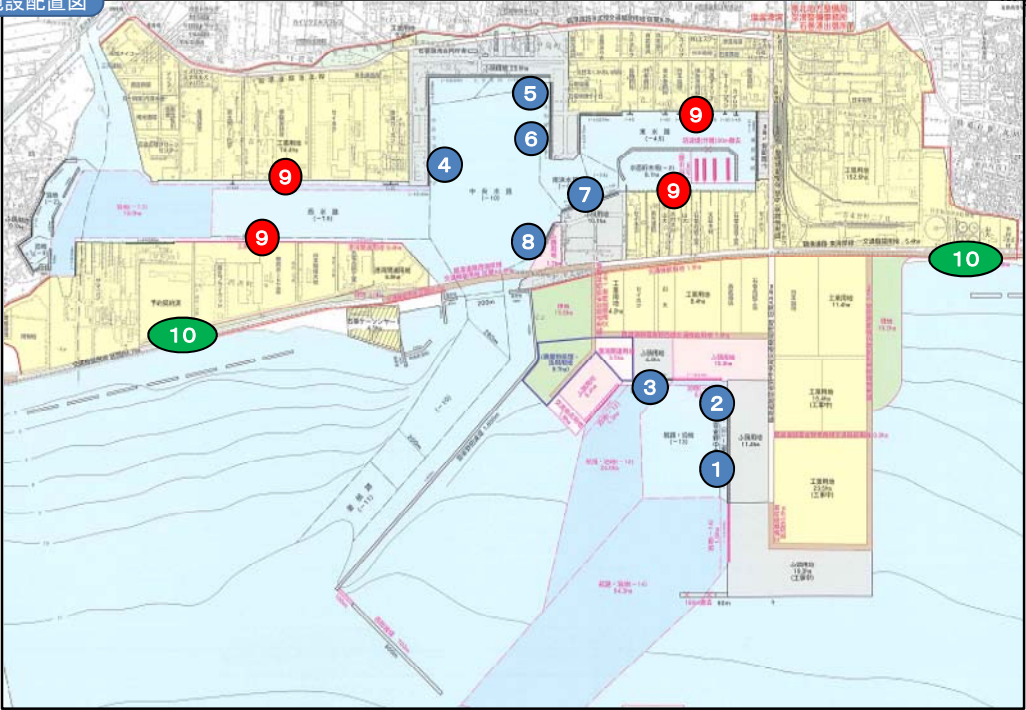

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

仙 台 塩 釜 港 (塩釜港区) 復 旧 工 程 計 画

■: 応急復旧工事

: 暫定供用

☆ ;災害査定


 ;本格復旧工事

 : 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	真山 1号	-9m	水産品																										
				☆ 暫定利用可能												本格復旧工事													
②	真山 2号	-9m	水産品																										
				☆ 暫定利用可能												本格復旧工事													
③	東埠頭	-7.5m	セメント																										
				☆ 暫定利用可能												本格復旧工事													
	仙台塩釜港海岸																												
				☆												本格復旧工事													

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

施設配置図

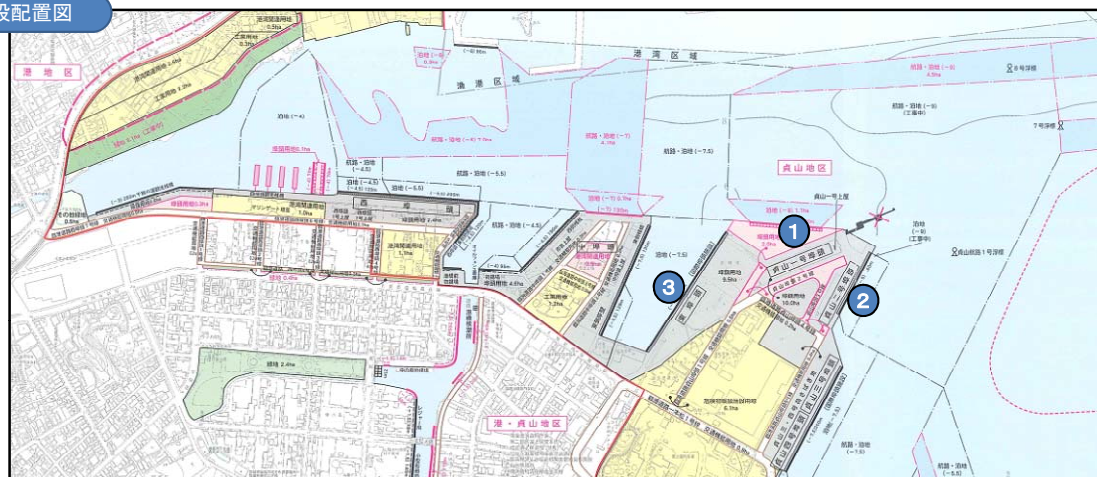


仙 台 塩 釜 港（仙台港区） 復 旧 工 程 計 画

■ ; 応急復旧工事 ■ ; 暫定供用 ☆ ; 災害査定 ■ ; 本格復旧工事 ■ ; 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
①	高松埠頭	-12m	製材	☆												暫定利用可能															
②	中野 1号	-12m	穀物	安全確保		☆										暫定利用可能															
③	中野 2号	-10m	紙・パルプ	☆												暫定利用可能															
④	中野 3号	-10m	完成自動車	☆												暫定利用可能															
⑤	中野 4号	-10m	完成自動車	☆												暫定利用可能															
⑥	中野 5号	-10m	完成自動車	☆												暫定利用可能															
⑦	中野 6号	-10m	鋼材	☆												暫定利用可能															
⑧	雷神 1号	-7.5m	完成自動車	☆												暫定利用可能															
⑨	雷神 2号	-9m	完成自動車			☆										暫定利用可能															
⑩	高砂 1号	-12m	コンテナ			☆										暫定利用可能															
⑪	高砂 2号	-14m	コンテナ			☆		利用不可		暫定利用可能 L=270m										平成25年2月末完了見込み L=330m											
⑫	向洋	-12m	石炭			☆										暫定利用可能															
	仙台塩釜港海岸			☆																											

施設配置図

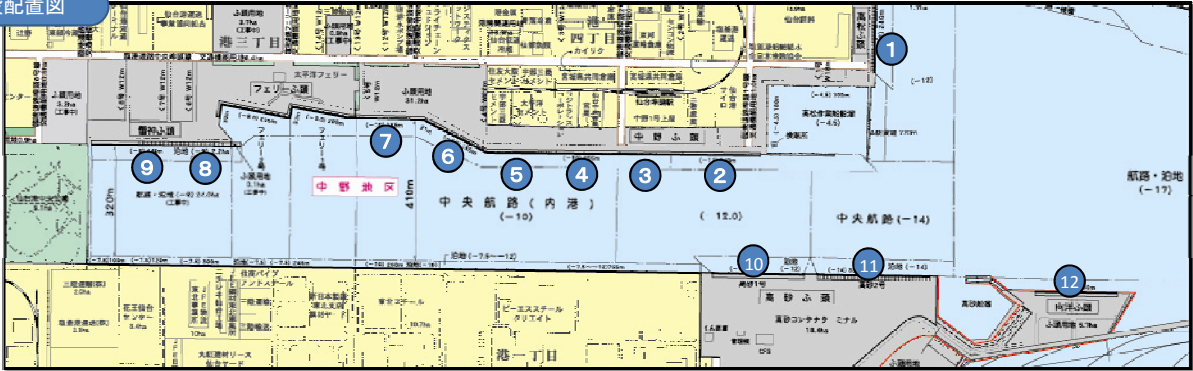


※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

相馬港 復旧工程計画

				平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度										
番号	施設名	水深	主な取扱品目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
①	1ー3	-7.5m	砕石 スクラップ					☆																															
②	1ー4	-7.5m	セメント					☆																															
③	1ー5	-7.5m	石炭灰					☆																															
④	2ー2	-7.5m	石灰石等バラもの					☆																															
⑤	2ー3	-7.5m	コンテナ					☆																															
⑥	2ー4	-12m	コークス 銑鉄 他	☆																																			
⑦	沖防波堤												☆													平成27年度未完了見込み													
	相馬港海岸												☆																										

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

施設配置図

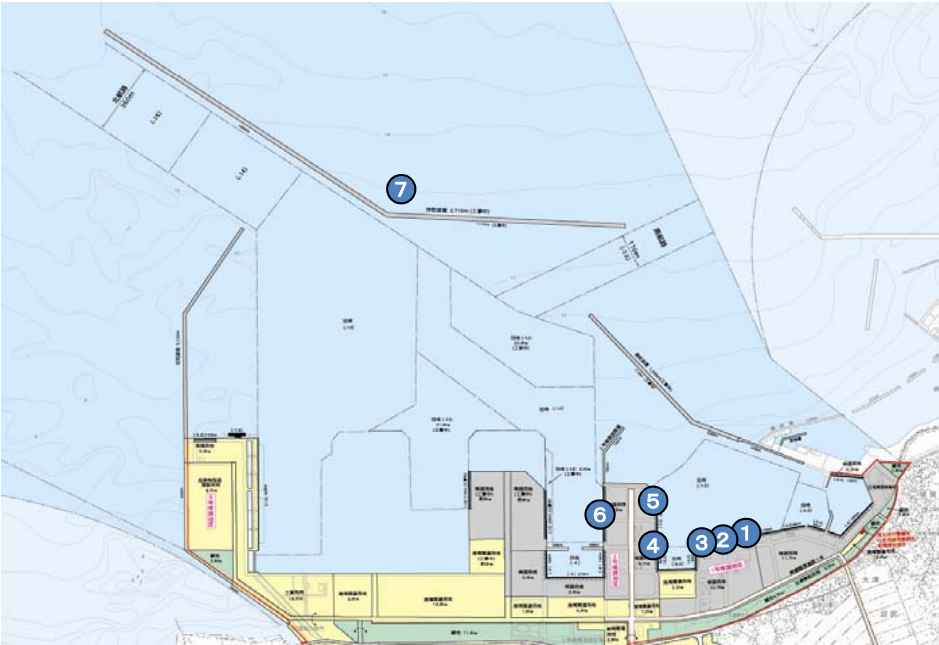

小 名 浜 港 復 旧 工 程 計 画

■ : 応急復旧工事 ■ : 暫定供用 ☆ : 災害査定 ■ : 本格復旧工事 ■ : 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度	平成26年度
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	3ー1～2	ー10m	石炭 石灰石									☆																	
②	3ー3	ー10m	石炭									☆																	
③	3ー4	ー10m	セメント									☆																	
④	4ー2	ー10m	セメント									☆																	
⑤	4ー3	ー10m	化学薬品									☆																	
⑥	5ー1	ー12m	金属鉱									☆																	
⑦	6ー1	ー14m	石炭									☆																	
⑧	7ー1	ー13m	石炭									☆																	
⑨	7ー2	ー13m	石炭									☆																	
⑩	7ー3	ー10m	非金属鉱物									☆																	
⑪	7ー4	ー10m	再利用資源									☆																	
⑫	7ー5	ー7.5m	石炭									☆																	
⑬	Fー1	ー10 m	製材 木材チップ									☆																	
⑭	Fー2	ー12m	製材									☆																	
⑮	Fー3	ー10 m	金属くず									☆																	
⑯	Oー3	ー10m	コンテナ									☆																	
⑰	Oー4	ー10 m	コンテナ									☆																	




※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります

茨城港日立港区 復旧工程計画

 : 応急復旧工事
 : 暫定供用
 ☆ : 災害査定
 : 本格復旧工事
 : 供用


番号	施設名		水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度														
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
①	第1ふ頭	B岸壁	-7.5m	石油製品、重油	4/2～(吃水5.5m) ☆																										
②		C岸壁	-7.5m	石油製品、重油	3/29～(吃水5.5m) ☆												暫定利用可能														
③		D岸壁	-10m	石炭	6/1～(吃水6m) ☆												暫定利用可能														
④	第2ふ頭	B岸壁	-9m	非金属鉱物 非鉄金属	3/20～(吃水6m) ☆																										
⑤		C岸壁	-7.5m	非金属鉱物 砂利・砂、コークス																											
⑥		D岸壁	-7.5m	非金属鉱物 砂利・砂、コークス																											
⑦	第4ふ頭	C岸壁	-7.5m	非鉄金属 電気機械、金属製品																											
⑧		D岸壁	-10m	シャーン 化学工業品																											
⑨		E岸壁	-12m	生乳、製造食品 再利用資材	5/9～(吃水9m) ☆																										
⑩	第5ふ頭	A岸壁	-7.5m	金属くず																											
⑪		BC岸壁	-10m	非鉄金属 シャーン、金属くず													暫定利用可能														
⑬		D岸壁	-12m	完成自動車	3/20～(吃水9m) ☆																										

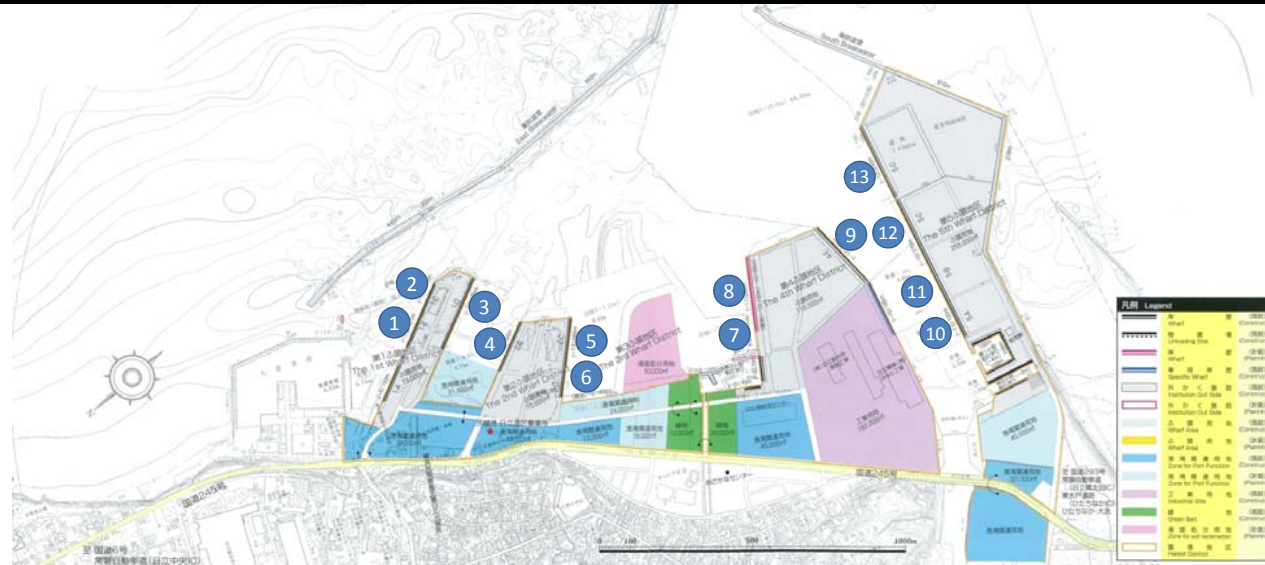

茨城港常陸那珂港区 復旧工程計画

 : 応急復旧工事
 : 暫定供用
 ☆ : 災害査定
 : 本格復旧工事
 : 供用

番号	施設名		水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度											
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	北ふ頭 (外貿)	A岸壁	-14m	紙・パルプ 産業機械				☆									暫定利用可能											
②		B岸壁	-12m	産業機械 シャーシ	4/1～			☆																				
③		C岸壁	-10m	産業機械、非鉄金属 完成自動車	3/22～			☆																				
④	北ふ頭 (内貿)	D岸壁	-7.5m	完成自動車 紙・パルプ、製造食品		5/18～☆																						
⑤		E岸壁	-7.5m	完成自動車 紙・パルプ、製造食品		5/18～☆																						
⑥		F岸壁	-7.5m	完成自動車 紙・パルプ、製造食品		5/18～☆																						
⑦		G岸壁	-5.5m	産業機械																								
⑧		H岸壁	-5.5m	産業機械	3/22～		☆																					
⑨	中央ふ頭	A岸壁	-7.5m (耐震)	完成自動車 製造食品、紙製品	3/15～		☆																					
⑩		B岸壁	-9m	シャーシ 製造食品、紙・パルプ	3/22～		☆																					
⑪	南ふ頭	B岸壁	-5.5m	鉄くず(スクラップ)		4/29～☆																						
⑫		C岸壁	-7.5m	化学薬品		4/29～ (吃水5.5m) ☆																						

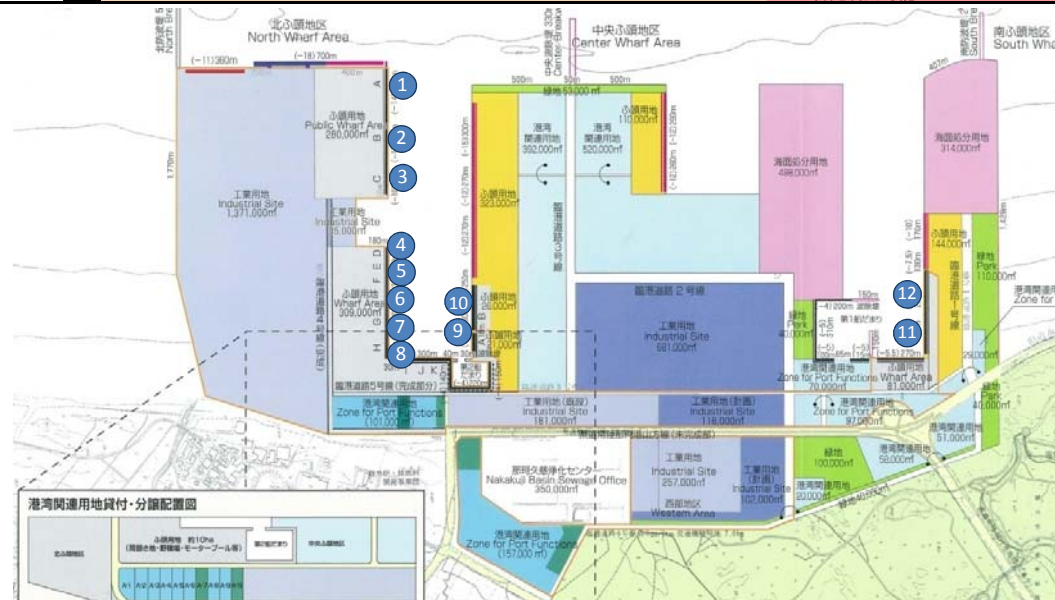

茨城港大洗港区 復旧工程計画

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

番号	施設名		水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度											
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	第1ふ頭	岸壁	-5m	水産品																								
②		物揚場	－	水産品				☆																				
③		先端護岸 波除堤	－	水産品			☆																					
④	第2ふ頭	岸壁	-5m	水産品																								
⑤	第3ふ頭	G岸壁	-8m	製造食品・飲料、雑貨 製材、バルブ、鉄鋼																								
⑥		H岸壁	-8m	製造食品・飲料、雑貨 製材、バルブ、鉄鋼			☆																					
⑦	第4ふ頭	岸壁	-8m	砂利・砂、化学肥料																								
⑧	中央航路・泊地		-8m																									
⑨	マリーナ	浮桟橋・クレーン	－																									



鹿島港 復旧工程計画

 : 応急復旧工事
 : 暫定供用
 ☆ : 災害査定
 : 本格復旧工事
 : 供用

番号	施設名		水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度											
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	南公共埠頭	A岸壁	-10m	鉄鋼、非金属鉱物 鋼材			☆																					
②		B岸壁	-10m	化学肥料、非鉄金属 動物性製造飼肥料			☆																					
③		C岸壁	-7.5m	鋼材、化学肥料					☆																			
④		D岸壁	-7.5m	動物性製造飼肥料 鋼材、化学肥料	3/22～			☆																				
⑤		E岸壁	-7.5m	木製品、化学肥料 鋼材																								
⑥		F岸壁	-7.5m	鉄鋼、砂利・砂 化学肥料																								
⑦		H岸壁	-10m	鉄鋼、非金属鉱物 鋼材			☆																					
⑧	北公共埠頭	C岸壁	-10m	砂利・砂、鋼材	3/18～		☆																					
⑨		D岸壁	-10m	鉄鋼、化学肥料			☆																					
⑩		E岸壁	-10m	コンテナ(化学肥料)			☆																					
⑪	外港	航路	-22m				☆																					
⑫	中央	航路	-19m			☆																						
⑬	南	航路	-10m			☆																						
⑭	南海浜	導流堤	—				☆																					
⑮		護岸	—				☆																					
⑯		突堤	—				☆																					

