

平成30年7月
豪雨関連

平成30年8月22日
大臣官房技術調査課
水管理・国土保全局河川環境課
道路局企画課
鉄道局施設課

JR 呉線や山陽線の運転再開時期の前倒しについて

～関連する事業との連携により鉄道の災害復旧工事が円滑に進むよう取り組んでいます～

今回の豪雨で被災したJR呉線や山陽線等では、鉄道事業者が実施する災害復旧工事の実施に当たって、道路や河川等の関連する事業と連携・調整することにより、運転再開時期の前倒しが進められています。

国土交通省は、通勤・通学等地域の足としての役割を担う鉄道の復旧が早期に図られるよう、鉄道事業者と国土交通省の関係部局をメンバーとする連絡調整会議を開催し、このような事業間調整等、必要な支援や協力を行っています。

○被災路線の運転再開時期の前倒し（※国土交通省等による協力内容）

- ・ JR 呉線（呉・坂間） 11月中 → 9月9日

※NEXCO 西日本が、JR 路線上の流入土砂も含め、一体的に土砂撤去・搬出。また、中国地方整備局が国道 31 号用地を土砂仮置き場として提供。さらに、搬出にあたっては中国地方整備局が交通状況を踏まえ搬出時間帯を調整。

※線路上の土砂撤去後、軌道や電気等の工事が速やかに進むよう、広島呉道路及び国道 31 号の復旧工事の工程を調整。

- ・ JR 山陽線（柳井・下松間） 9月末 → 9月9日

※JR 山陽線に隣接する国道 188 号 4 車線のうち 2 車線（下り線）を復旧工事の作業ヤードとして提供。

○連絡調整会議について

平成 30 年 7 月豪雨災害により被災した鉄道の復旧に関する連絡調整会議

【メンバー】

鉄道事業者

JR 東海、JR 西日本、JR 四国、JR 九州の担当部長 等

国土交通省

大臣官房、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局の担当課長 等

【検討対象路線】

山陽線、呉線、芸備線、高山線、予讃線、筑豊線 等

【検討事項】

- ・ 鉄道の復旧工事と関連する河川・道路の復旧工事の工程等の共有
- ・ 早期復旧に向けた課題等の抽出
- ・ 鉄道の復旧時期の前倒しに向けた関連事業との連携・調整方法等の検討・確認

【開催状況】

- ・ 8 月 10 日（金）：第一回会議
- ・ 8 月 21 日（火）：路線毎の打ち合わせ（JR 西日本）



○引き続き、被災路線の運転再開が 1 日でも早く実現するよう、鉄道事業者と連携・調整を図ってまいります。

【問い合わせ先】

国土交通省



鉄道局施設課 青山・河原

電話:03-5253-8111 (内線:40-802/40-863) 直通:03-5253-8553 FAX:03-5253-1634

JR西日本 呉線(水尻地区)の早期復旧に向けた連携・調整状況

○JR呉線(呉・坂間)の復旧工事(流入土砂の撤去等)を実施するにあたって、隣接する国道31号(国土交通省中国地方整備局)、広島呉道路(NEXCO西日本)の復旧工事との連携・調整等により、JR呉線(呉・坂間)の復旧時期の前倒し(11月中→9月9日(予定))を実現。

- ・NEXCO西日本が、JR路線上の流入土砂も含め、一体的に土砂撤去・搬出。また、中国地方整備局が国道31号用地を土砂仮置き場として提供。さらに、搬出にあたっては中国地方整備局が交通状況を踏まえ搬出時間帯を調整。
- ・線路上の土砂撤去後、軌道や電気等の工事が速やかに進むよう、広島呉道路及び国道31号の復旧工事の工程を調整。

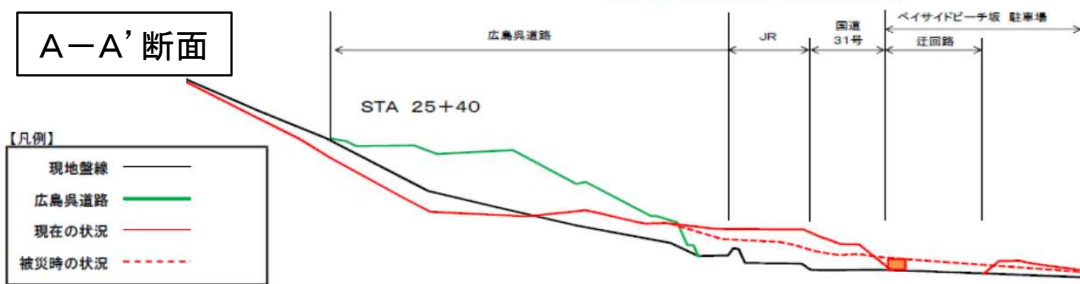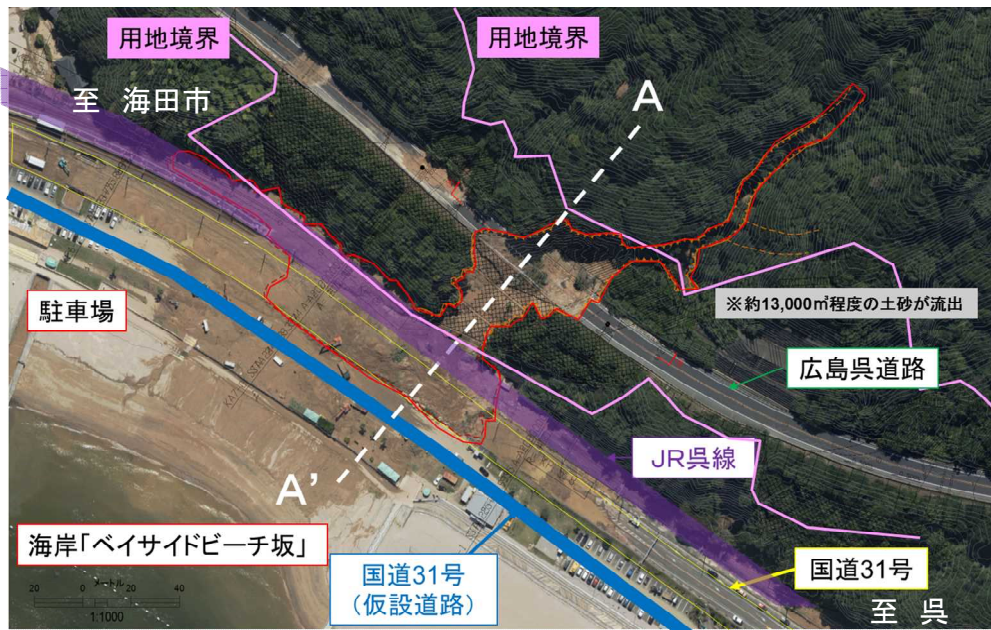

○JR山陽線(柳井・下松間)の復旧工事(流入土砂の撤去等)を実施するにあたって、国道188号(国土交通省中国地方整備局)の復旧工事との連携・協力により、JR山陽線(柳井・下松間)の復旧時期の前倒し(9月末→9月9日(予定))を実現。

・JR山陽線に隣接する国道188号4車線のうち2車線(下り線)を復旧工事の作業ヤードとして提供。



国道188号

JR山陽線



復旧工事の状況

8月17日時点



8月17日時点
