

(再評価)

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道8号 小松バイパス
事業主体	北陸地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比 (B/C) = 4.4 (経済的純現在価値 (B-C) = 732億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 16.8%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 3.8 (経済的純現在価値 (B-C) = 149億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 19.2%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	現道区間およびバイパス区間の渋滞損失時間削減量 = 95.8万人時間/年 整備なし：106.8万人時間/年 → 整備あり：11.0万人時間/年 削減率：89.7%
		□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	□ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	1. 活力	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である
□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する			
□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり			
□ 中心市街地内で行う事業である			
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である			
□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する			
□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる			
国土・地域ネットワークの構築		□ 高速自動車国道と並行する自専道 (A'路線) としての位置づけ有り	
		□ 地域高規格道路の位置づけあり	
		□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	小松市および加賀市と金沢方面へ行き来する通勤者は30,000人/日(国勢調査)にのぼり、これらの市を連携する小松バイパスの整備により、各都市間の通勤などの利便性が向上する。
		□ 現道等における交通不能区間を解消する	
		□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	

	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する <input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される <input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	小松バイパス周辺には山代温泉・片山津温泉や道の駅「こまつ木場湯」などの多くの観光施設が存在しており、主要な観光地へのアクセス性及び周遊性の向上が期待される。
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり <input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	「石川県地域防災計画」において当該道路は第一次緊急輸送道路として指定されている。高盛土構造である小松バイパスは浸水被害を受けないため、残事業を整備することで緊急時のネットワークの更なる強化が期待できる
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	費用便益分析対象範囲のCO2排出量の削減量：約8,090t-CO2/年 整備なし：約1,376,070t-CO2/年 → 整備あり：約1,367,979t-CO2/年
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	費用便益分析対象範囲のNOx排出量の削減率：1.0% NOx排出削減量：約49.7t-NOx/年 整備なし：約5,152.5t-NOx/年 → 整備あり：約5,102.8t-NOx/年
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	費用便益分析対象範囲のSPM排出量の削減率：1.2% SPM排出削減量：約5.5t-SPM/年 整備なし：約458.9t-SPM/年 → 整備あり：約453.4t-SPM/年
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	石川県の新長期構想（「ダブルラダー輝きの美知」整備構想）に位置付けられた道路であり、南北に長い石川県の連携向上が図られる。
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他 の別
一般国道8号	小松バイパス	L=15.6km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
29,000~46,700	4	北陸地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和2年度		
単純合計	116億円	184億円	300億円
うち残事業分	36億円	63億円	99億円
基準年における 現在価値 (C)	137億円	81億円	217億円
うち残事業分	32億円	21億円	53億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和2年度			
供用年	令和元年度、令和3年度、令和9年度			
単年便益 (初年便益)	20億円	2.5億円	0.74億円	24億円
基準年における 現在価値 (B)	798億円	110億円	41億円	949億円
うち残事業分	183億円	14億円	5.6億円	202億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	4.4
経済的純現在価値（事業全体）	732億円
経済的内部収益率（事業全体）	16.8%
費用便益比（残事業）	3.8
経済的純現在価値（残事業）	149億円
経済的内部収益率（残事業）	19.2%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	29,000～46,700	±10%	4.1～5.0
事業費	116億円	±10%	4.3～4.4
事業期間	20年	±20%	4.4～4.4

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	29,000～46,700	±10%	3.5～4.2
事業費	36億円	±10%	3.6～4.0
事業期間	6年	±20%	3.8～3.9

交通状況の変化(事業全体)

様式-3①

事業名 一般国道8号 小松バイパス

(推計時点 R12年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 【小松バイパス】 L=15.6km	交通量 ^{※1}	[台/日]	26,900	38,400	
	走行時間 ^{※2}	[分]	21	16	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	99.67	110.66	
②主な周辺道路 ※4	A. 国道305号 L=13.4km	交通量	[台/日]	16,600	15,900
		走行時間	[分]	19	19
		走行時間費用	[億円/年]	56.74	53.59
	B. (主)小松加賀線 L=15.0km	交通量	[台/日]	9,700	8,100
		走行時間	[分]	25	24
		走行時間費用	[億円/年]	46.20	36.44
	C. (主)金沢美川小松線 L=10.7km	交通量	[台/日]	11,800	9,500
		走行時間	[分]	17	16
		走行時間費用	[億円/年]	37.73	28.07
	D. (主)小松山中線 L=9.7km	交通量	[台/日]	8,200	5,900
		走行時間	[分]	18	16
		走行時間費用	[億円/年]	27.38	17.72
	E. (一)串加賀線 L=12.1km	交通量	[台/日]	7,500	6,400
		走行時間	[分]	20	20
		走行時間費用	[億円/年]	28.39	23.81
③その他道路合計 L=1,186.4km	走行時間費用	[億円/年]	3,168.28	3,153.20	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 1,262.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	3,464.39	3,423.49	40.90

※1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。

※5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

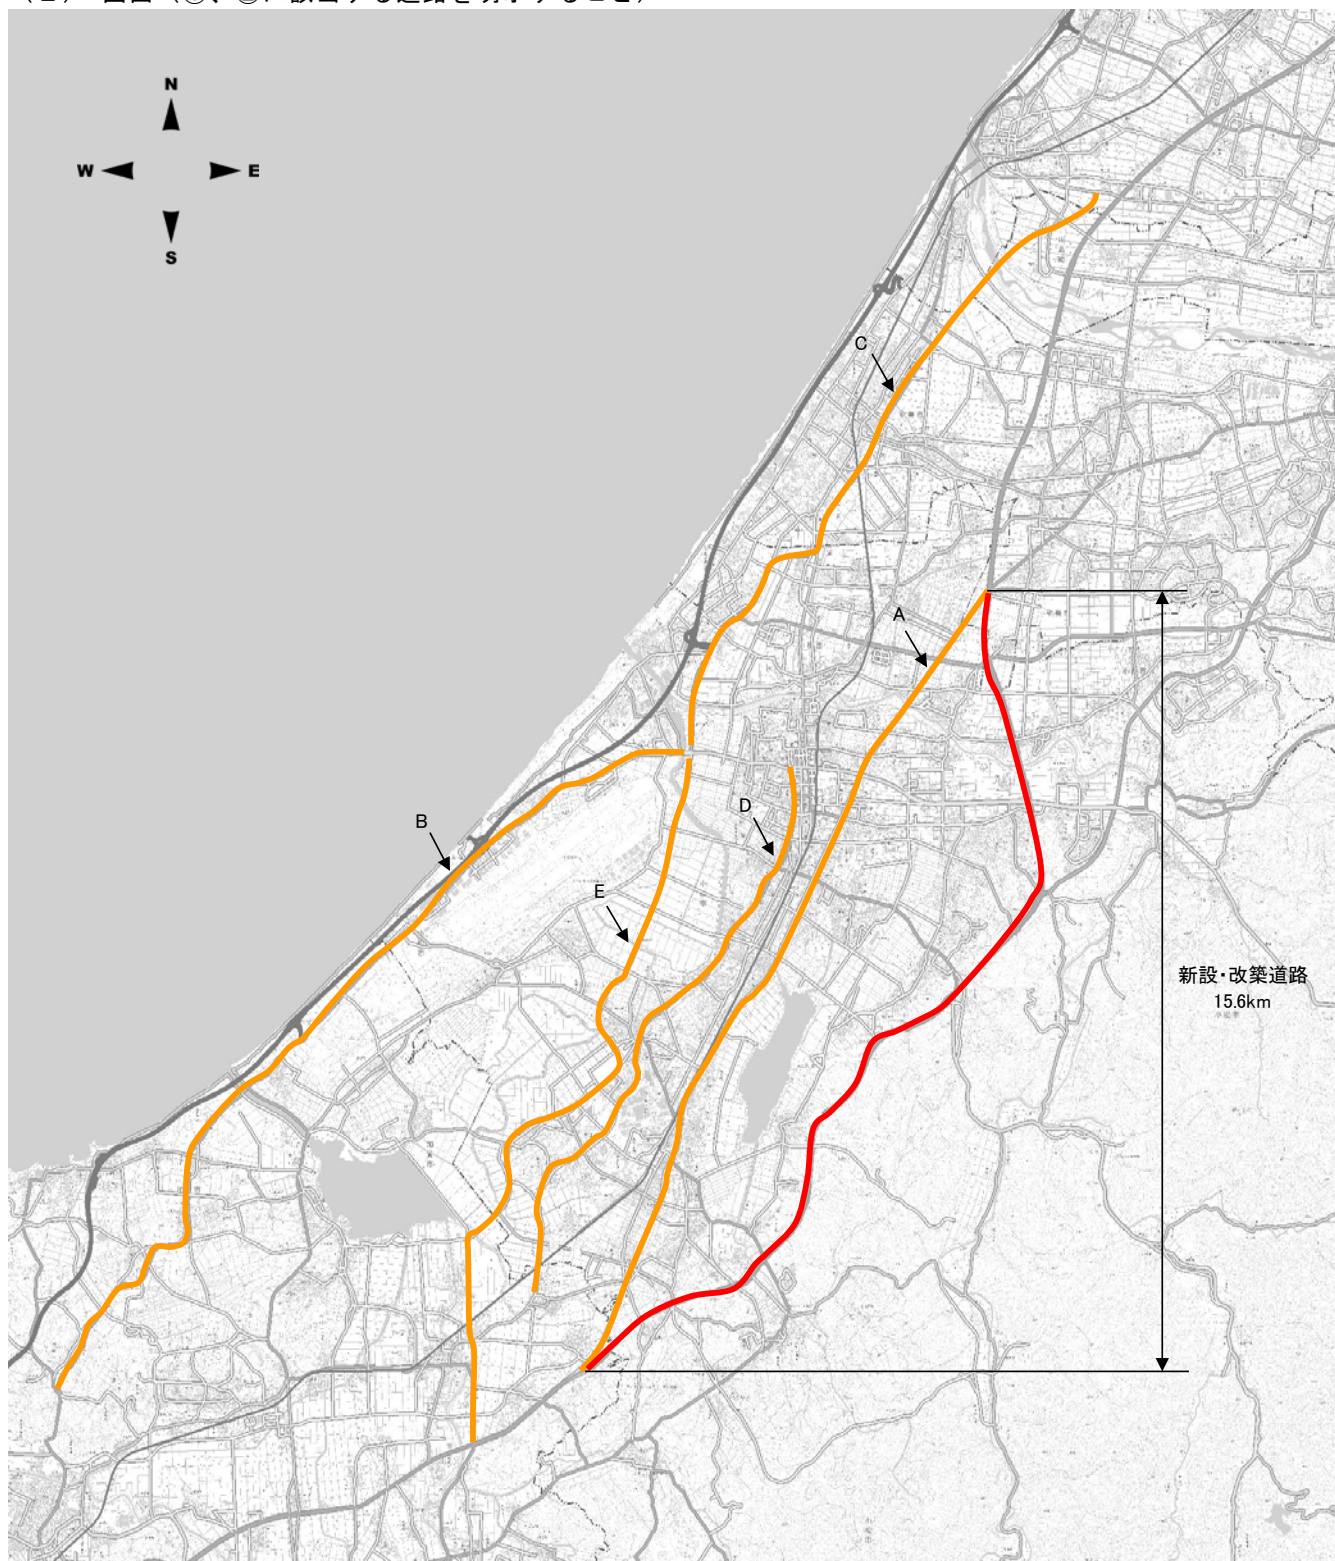

交通状況の変化(残事業)

様式-3①

事業名 一般国道8号 小松バイパス

(推計時点 R12年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [小松バイパス] L=15.6km	交通量 ^{※1}	[台/日]	35,900	38,400	
	走行時間 ^{※2}	[分]	18	16	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	114.67	110.66	
②主な周辺道路 ※4	A. 国道305号 L=13.4km	交通量	[台/日]	16,000	15,900
		走行時間	[分]	19	19
		走行時間費用	[億円/年]	53.98	53.59
	B. (主)小松加賀線 L=15.0km	交通量	[台/日]	8,400	8,100
		走行時間	[分]	24	24
		走行時間費用	[億円/年]	38.16	36.44
	C. (主)金沢美川小松線 L=10.7km	交通量	[台/日]	9,700	9,500
		走行時間	[分]	16	16
		走行時間費用	[億円/年]	28.97	28.07
	D. (主)小松山中線 L=9.7km	交通量	[台/日]	6,700	5,900
		走行時間	[分]	17	16
		走行時間費用	[億円/年]	21.17	17.72
	E. (一)串加賀線 L=12.1km	交通量	[台/日]	6,600	6,400
		走行時間	[分]	19	20
		走行時間費用	[億円/年]	24.44	23.81
③その他道路合計 L=1,186.4km	走行時間費用	[億円/年]	3,153.90	3,153.20	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 1,262.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	3,435.29	3,423.49	11.80

※1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3~5路線程度以内で記載する。

※5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

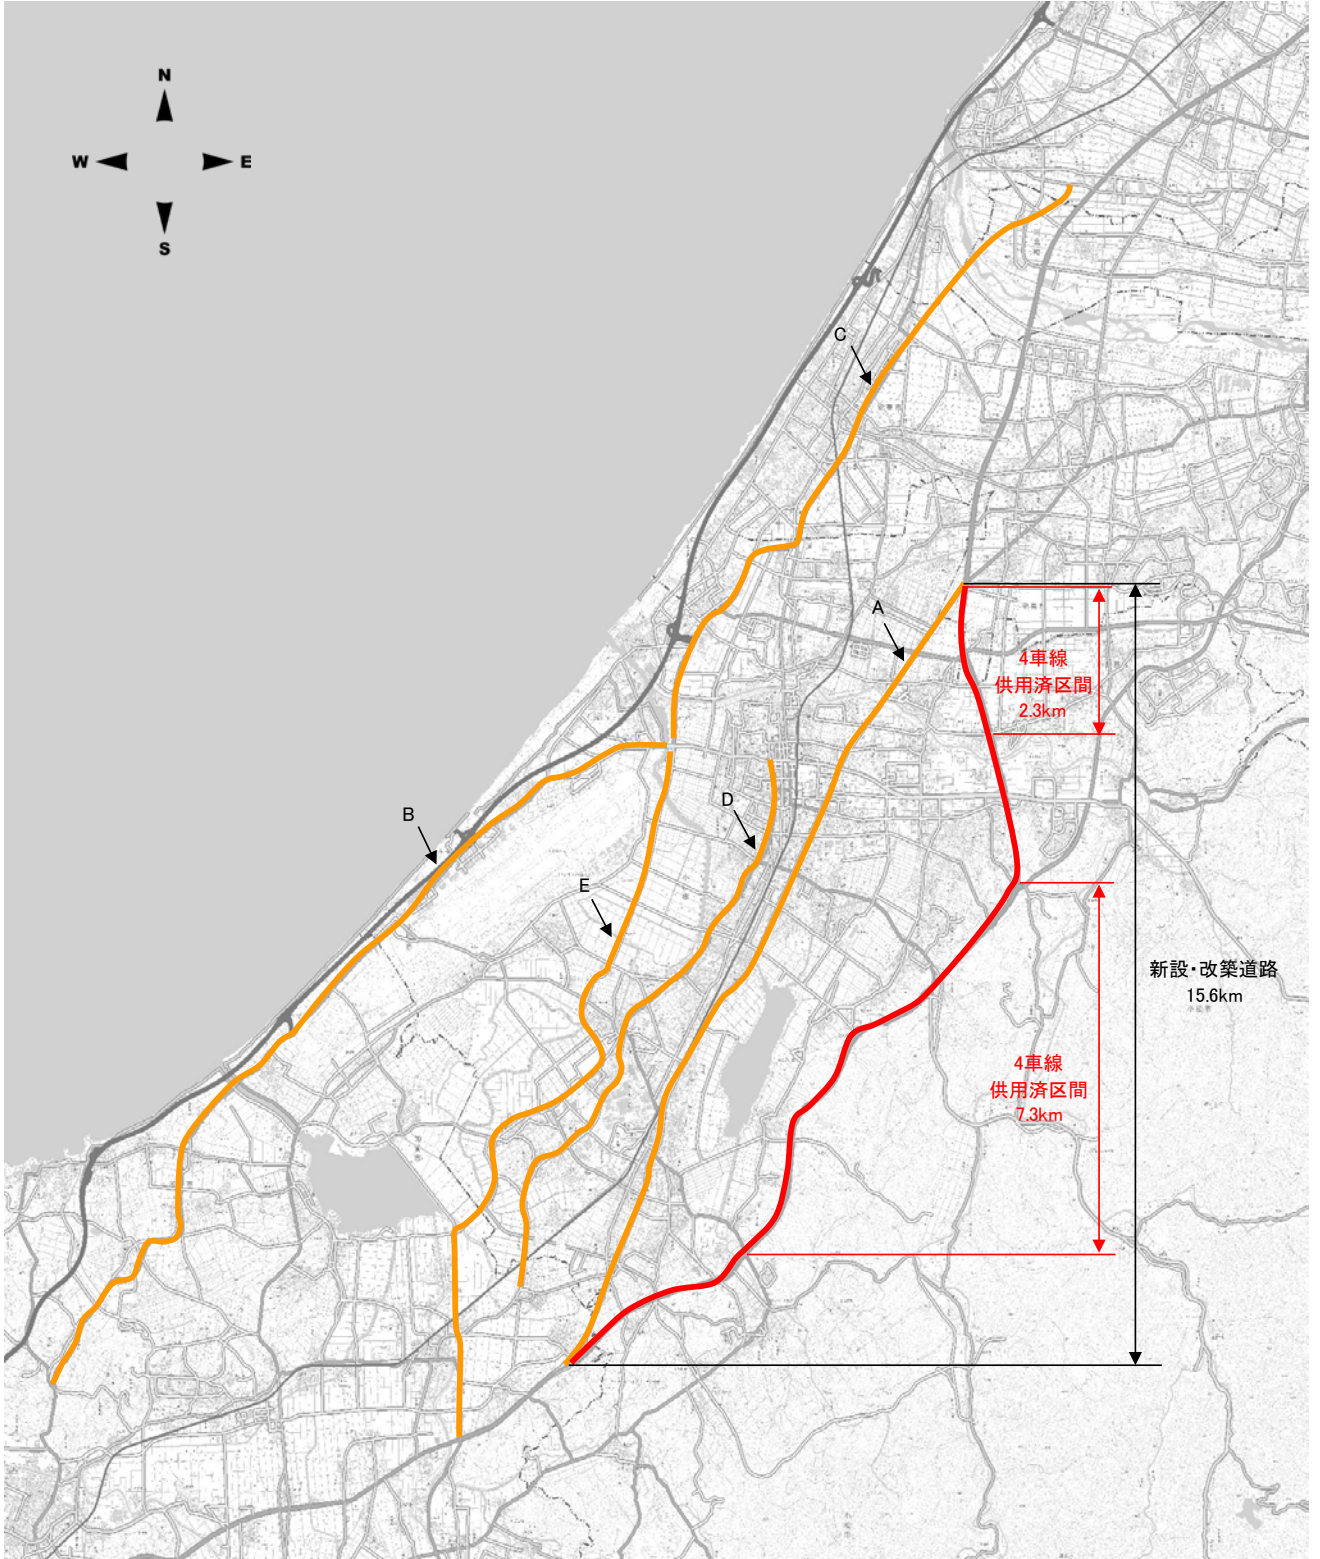

費用便益分析の条件

事業名：一般国道8号 小松バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和2年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/>	
	複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H22、R12)	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()		<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他(最終配分でQ ₀ を超える場合、実態に即した速度で補正)		<input checked="" type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %	
災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
		とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数(年あたり) 採用した冬期日数の考え方を記載 降雪が最初に観測された日から最後に観測された日までの日数(84日)及び降雪日数(27日)を考慮	(84) 日
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 通常期と冬期の速度比(降雪時15%低下、降雪時以外7%低下)を考慮	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>	
その他			

便益の算定

事業名：一般国道8号 小松バイパス

(4)

		項目	チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他(概略事業計画による値を採用)	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 北陸地方整備局管内直轄路線の実績値から設定		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input checked="" type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
			当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)	
その他				
4. その他				

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 一般国道8号 小松バイパス

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

					単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
					0.28	15.6	4.29
年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-12年目	H 19	1.6651	105.0	0.19	0.31		
-11年目	H 20	1.6010	104.4	2.48	3.91		
-10年目	H 21	1.5395	103.0	6.62	10.17		
-9年目	H 22	1.4802	101.3	6.81	10.23		
-8年目	H 23	1.4233	99.8	7.33	10.75		
-7年目	H 24	1.3686	99.0	17.81	25.31		
-6年目	H 25	1.3159	99.0	4.86	6.64		
-5年目	H 26	1.2653	101.5	4.26	5.46		
-4年目	H 27	1.2167	103.0	0.74	0.90		
-3年目	H 28	1.1699	102.8	6.67	7.80		
-2年目	H 29	1.1249	102.9	4.44	4.99		
-1年目	H 30	1.0816	102.8	5.28	5.71		
部分供用開始	R 1	1.0400	102.8	7.00	7.28	2.21	2.30
1年目	R 2	1.0000	102.8	5.45	5.45	2.21	2.21
部分供用(2年目)	R 3	0.9615	102.8	6.36	6.12	2.65	2.55
3年目	R 4	0.9246	102.8	6.82	6.31	2.65	2.45
4年目	R 5	0.8890	102.8	6.36	5.65	2.65	2.36
5年目	R 6	0.8548	102.8	5.91	5.05	2.65	2.27
6年目	R 7	0.8219	102.8	5.45	4.48	2.65	2.18
7年目	R 8	0.7903	102.8	5.26	4.16	2.65	2.09
供用開始(8年目)	R 9	0.7599	102.8			3.90	2.96
9年目	R 10	0.7307	102.8			3.90	2.85
10年目	R 11	0.7026	102.8			3.90	2.74
11年目	R 12	0.6756	102.8			3.90	2.63
12年目	R 13	0.6496	102.8			3.90	2.53
13年目	R 14	0.6246	102.8			3.90	2.44
14年目	R 15	0.6006	102.8			3.90	2.34
15年目	R 16	0.5775	102.8			3.90	2.25
16年目	R 17	0.5553	102.8			3.90	2.17
17年目	R 18	0.5339	102.8			3.90	2.08
18年目	R 19	0.5134	102.8			3.90	2.00
19年目	R 20	0.4936	102.8			3.90	1.93
20年目	R 21	0.4746	102.8			3.90	1.85
21年目	R 22	0.4564	102.8			3.90	1.78
22年目	R 23	0.4388	102.8			3.90	1.71
23年目	R 24	0.4220	102.8			3.90	1.65
24年目	R 25	0.4057	102.8			3.90	1.58
25年目	R 26	0.3901	102.8			3.90	1.52
26年目	R 27	0.3751	102.8			3.90	1.46
27年目	R 28	0.3607	102.8			3.90	1.41
28年目	R 29	0.3468	102.8			3.90	1.35
29年目	R 30	0.3335	102.8			3.90	1.30
30年目	R 31	0.3207	102.8			3.90	1.25
31年目	R 32	0.3083	102.8			3.90	1.20
32年目	R 33	0.2965	102.8			3.90	1.16
33年目	R 34	0.2851	102.8			3.90	1.11
34年目	R 35	0.2741	102.8			3.90	1.07
35年目	R 36	0.2636	102.8			3.90	1.03
36年目	R 37	0.2534	102.8			3.90	0.99
37年目	R 38	0.2437	102.8			3.90	0.95
38年目	R 39	0.2343	102.8			3.90	0.91
39年目	R 40	0.2253	102.8			3.90	0.88
40年目	R 41	0.2166	102.8			3.90	0.84
41年目	R 42	0.2083	102.8			3.90	0.81
42年目	R 43	0.2003	102.8			3.90	0.78
43年目	R 44	0.1926	102.8			3.90	0.75
44年目	R 45	0.1852	102.8			3.90	0.72
45年目	R 46	0.1780	102.8			3.90	0.69
46年目	R 47	0.1712	102.8			3.90	0.67
47年目	R 48	0.1646	102.8			3.90	0.64
48年目	R 49	0.1583	102.8			3.90	0.62
49年目	R 50	0.1522	102.8			3.90	0.59
合計				116.10	136.68	184.12	80.60
単純事業費計				116.10		184.12	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道8号 小松バイパス

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.23	6.0	1.39

年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-6年目	R 3	0.9615	102.8	6.36	6.12		
-5年目	R 4	0.9246	102.8	6.82	6.31		
-4年目	R 5	0.8890	102.8	6.36	5.65		
-3年目	R 6	0.8548	102.8	5.91	5.05		
-2年目	R 7	0.8219	102.8	5.45	4.48		
-1年目	R 8	0.7903	102.8	5.26	4.16		
供用開始	R 9	0.7599	102.8			1.26	0.96
1年目	R 10	0.7307	102.8			1.26	0.92
2年目	R 11	0.7026	102.8			1.26	0.89
3年目	R 12	0.6756	102.8			1.26	0.85
4年目	R 13	0.6496	102.8			1.26	0.82
5年目	R 14	0.6246	102.8			1.26	0.79
6年目	R 15	0.6006	102.8			1.26	0.76
7年目	R 16	0.5775	102.8			1.26	0.73
8年目	R 17	0.5553	102.8			1.26	0.70
9年目	R 18	0.5339	102.8			1.26	0.67
10年目	R 19	0.5134	102.8			1.26	0.65
11年目	R 20	0.4936	102.8			1.26	0.62
12年目	R 21	0.4746	102.8			1.26	0.60
13年目	R 22	0.4564	102.8			1.26	0.58
14年目	R 23	0.4388	102.8			1.26	0.55
15年目	R 24	0.4220	102.8			1.26	0.53
16年目	R 25	0.4057	102.8			1.26	0.51
17年目	R 26	0.3901	102.8			1.26	0.49
18年目	R 27	0.3751	102.8			1.26	0.47
19年目	R 28	0.3607	102.8			1.26	0.45
20年目	R 29	0.3468	102.8			1.26	0.44
21年目	R 30	0.3335	102.8			1.26	0.42
22年目	R 31	0.3207	102.8			1.26	0.40
23年目	R 32	0.3083	102.8			1.26	0.39
24年目	R 33	0.2965	102.8			1.26	0.37
25年目	R 34	0.2851	102.8			1.26	0.36
26年目	R 35	0.2741	102.8			1.26	0.35
27年目	R 36	0.2636	102.8			1.26	0.33
28年目	R 37	0.2534	102.8			1.26	0.32
29年目	R 38	0.2437	102.8			1.26	0.31
30年目	R 39	0.2343	102.8			1.26	0.30
31年目	R 40	0.2253	102.8			1.26	0.28
32年目	R 41	0.2166	102.8			1.26	0.27
33年目	R 42	0.2083	102.8			1.26	0.26
34年目	R 43	0.2003	102.8			1.26	0.25
35年目	R 44	0.1926	102.8			1.26	0.24
36年目	R 45	0.1852	102.8			1.26	0.23
37年目	R 46	0.1780	102.8			1.26	0.22
38年目	R 47	0.1712	102.8			1.26	0.22
39年目	R 48	0.1646	102.8			1.26	0.21
40年目	R 49	0.1583	102.8			1.26	0.20
41年目	R 50	0.1522	102.8			1.26	0.19
42年目	R 51	0.1463	102.8			1.26	0.18
43年目	R 52	0.1407	102.8			1.26	0.18
44年目	R 53	0.1353	102.8			1.26	0.17
45年目	R 54	0.1301	102.8			1.26	0.16
46年目	R 55	0.1251	102.8			1.26	0.16
47年目	R 56	0.1203	102.8			1.26	0.15
48年目	R 57	0.1157	102.8			1.26	0.15
49年目	R 58	0.1112	102.8			1.26	0.14
合計				36.16	31.77	63.00	21.39
単純事業費計				36.16		63.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:一般国道8号 小松バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%	
																					(A)
部分供用開始	R 1	0.99641	0.98952	1.00993	0.99752	1.0400	102.8	11.92	3.02	5.50	20.44	21.25	1.48	0.28	0.78	2.54	2.64	0.74	0.77	23.72	24.67
1年目	R 2	0.99644	0.98388	1.00306	0.99570	1.0000	102.8	11.88	2.98	5.55	20.42	20.42	1.47	0.28	0.79	2.54	2.54	0.74	0.74	23.70	23.70
部分供用(2年目)	R 3	0.99643	0.98361	1.00305	0.99568	0.9615	102.8	15.28	4.19	10.45	29.92	28.76	2.51	0.51	1.66	4.68	4.50	1.81	1.74	36.41	35.01
3年目	R 4	0.99642	0.98334	1.00304	0.99566	0.9246	102.8	15.22	4.12	10.48	29.83	27.58	2.50	0.50	1.66	4.67	4.31	1.81	1.67	36.30	33.56
4年目	R 5	0.99641	0.98306	1.00304	0.99564	0.8890	102.8	15.17	4.05	10.51	29.73	26.43	2.49	0.50	1.67	4.65	4.14	1.80	1.60	36.19	32.17
5年目	R 6	0.99639	0.98277	1.00303	0.99562	0.8548	102.8	15.11	3.99	10.54	29.64	25.34	2.48	0.49	1.67	4.64	3.97	1.79	1.53	36.07	30.84
6年目	R 7	0.99638	0.98246	1.00302	0.99560	0.8219	102.8	15.06	3.92	10.58	29.55	24.29	2.47	0.48	1.68	4.63	3.80	1.78	1.46	35.96	29.56
7年目	R 8	0.99637	0.98215	1.00301	0.99559	0.7903	102.8	15.00	3.85	10.61	29.46	23.28	2.46	0.47	1.68	4.62	3.65	1.77	1.40	35.85	28.33
供用開始(8年目)	R 9	0.99635	0.98183	1.00300	0.99557	0.7599	102.8	20.78	5.12	15.36	41.26	31.36	2.89	0.49	2.10	5.48	4.16	2.15	1.63	48.89	37.15
9年目	R 10	0.99634	0.98149	1.00299	0.99555	0.7307	102.8	20.71	5.03	15.41	41.14	30.06	2.88	0.48	2.11	5.47	3.99	2.14	1.56	48.74	35.62
10年目	R 11	0.99633	0.98114	1.00298	0.99553	0.7026	102.8	20.63	4.93	15.46	41.02	28.82	2.87	0.47	2.11	5.45	3.83	2.13	1.49	48.60	34.15
11年目	R 12	0.99094	0.99051	0.99783	0.99205	0.6756	102.8	20.55	4.84	15.50	40.90	27.63	2.86	0.46	2.12	5.44	3.68	2.12	1.43	48.45	32.73
12年目	R 13	0.99086	0.99042	0.99783	0.99199	0.6496	102.8	20.37	4.79	15.47	40.63	26.39	2.83	0.46	2.11	5.41	3.51	2.10	1.36	48.14	31.27
13年目	R 14	0.99077	0.99033	0.99783	0.99192	0.6246	102.8	20.18	4.75	15.44	40.36	25.21	2.81	0.45	2.11	5.37	3.35	2.08	1.30	47.82	29.87
14年目	R 15	0.99069	0.99023	0.99782	0.99186	0.6006	102.8	20.00	4.70	15.40	40.10	24.08	2.78	0.45	2.10	5.34	3.20	2.07	1.24	47.50	28.53
15年目	R 16	0.99060	0.99014	0.99782	0.99179	0.5775	102.8	19.81	4.66	15.37	39.83	23.00	2.76	0.44	2.10	5.30	3.06	2.05	1.18	47.18	27.25
16年目	R 17	0.99051	0.99004	0.99781	0.99172	0.5553	102.8	19.62	4.61	15.33	39.57	21.97	2.73	0.44	2.10	5.27	2.92	2.03	1.13	46.87	26.02
17年目	R 18	0.99042	0.98994	0.99781	0.99166	0.5339	102.8	19.44	4.56	15.30	39.30	20.98	2.70	0.44	2.09	5.23	2.79	2.02	1.08	46.55	24.85
18年目	R 19	0.99033	0.98984	0.99780	0.99158	0.5134	102.8	19.25	4.52	15.27	39.04	20.04	2.68	0.43	2.09	5.20	2.67	2.00	1.03	46.23	23.74
19年目	R 20	0.99023	0.98973	0.99780	0.99151	0.4936	102.8	19.06	4.47	15.23	38.77	19.14	2.65	0.43	2.08	5.16	2.55	1.98	0.98	45.91	22.66
20年目	R 21	0.99014	0.98963	0.99779	0.99144	0.4746	102.8	18.88	4.43	15.20	38.50	18.27	2.63	0.42	2.08	5.13	2.43	1.97	0.93	45.60	21.64
21年目	R 22	0.99004	0.98952	0.99779	0.99137	0.4564	102.8	18.69	4.38	15.17	38.24	17.45	2.60	0.42	2.07	5.09	2.32	1.95	0.89	45.28	20.67
22年目	R 23	0.98994	0.98941	0.99778	0.99129	0.4388	102.8	18.51	4.33	15.13	37.97	16.66	2.58	0.41	2.07	5.06	2.22	1.93	0.85	44.96	19.73
23年目	R 24	0.98984	0.98929	0.99778	0.99122	0.4220	102.8	18.32	4.29	15.10	37.71	15.91	2.55	0.41	2.06	5.02	2.12	1.91	0.81	44.64	18.84
24年目	R 25	0.98973	0.98918	0.99777	0.99114	0.4057	102.8	18.13	4.24	15.07	37.44	15.19	2.52	0.41	2.06	4.99	2.02	1.90	0.77	44.33	17.98
25年目	R 26	0.98963	0.98906	0.99777	0.99106	0.3901	102.8	17.95	4.20	15.03	37.18	14.50	2.50	0.40	2.05	4.95	1.93	1.88	0.73	44.01	17.17
26年目	R 27	0.98952	0.98894	0.99776	0.99098	0.3751	102.8	17.76	4.15	15.00	36.91	13.85	2.47	0.40	2.05	4.92	1.84	1.86	0.70	43.69	16.39
27年目	R 28	0.98941	0.98881	0.99776	0.99090	0.3607	102.8	17.58	4.10	14.97	36.64	13.22	2.45	0.39	2.04	4.88	1.76	1.85	0.67	43.37	15.65
28年目	R 29	0.98929	0.98869	0.99775	0.99081	0.3468	102.8	17.39	4.06	14.93	36.38	12.62	2.42	0.39	2.04	4.85	1.68	1.83	0.63	43.06	14.93
29年目	R 30	0.98918	0.98856	0.99775	0.99073	0.3335	102.8	17.20	4.01	14.90	36.11	12.04	2.39	0.38	2.04	4.81	1.61	1.81	0.60	42.74	14.25
30年目	R 31	0.98906	0.98842	0.99774	0.99064	0.3207	102.8	17.02	3.97	14.86	35.85	11.50	2.37	0.38	2.03	4.78	1.53	1.80	0.58	42.42	13.60
31年目	R 32	0.98895	0.98830	0.99774	0.99056	0.3083	102.8	16.83	3.92	14.83	35.58	10.97	2.34	0.37	2.03	4.74	1.46	1.78	0.55	42.11	12.98
32年目	R 33	0.98884	0.98818	0.99773	0.99048	0.2965	102.8	16.64	3.87	14.80	35.32	10.47	2.32	0.37	2.02	4.71	1.40	1.76	0.52	41.79	12.39
33年目	R 34	0.98874	0.98806	0.99773	0.99040	0.2851	102.8	16.46	3.83	14.76	35.05	9.99	2.29	0.37	2.02	4.67	1.33	1.75	0.50	41.47	11.82
34年目	R 35	0.98863	0.98794	0.99772	0.99032	0.2741	102.8	16.27	3.78	14.73	34.79	9.54	2.26	0.36	2.01	4.64	1.27	1.73	0.47	41.16	11.28
35年目	R 36	0.98852	0.98782	0.99772	0.99024	0.2636	102.8	16.09	3.74	14.70	34.52	9.10	2.24	0.36	2.01	4.60	1.21	1.71	0.45	40.84	10.77
36年目	R 37	0.98841	0.98770	0.99771	0.99016	0.2534	102.8	15.90	3.69	14.66	34.26	8.68	2.21	0.35	2.00	4.57	1.16	1.70	0.43	40.52	10.27
37年目	R 38	0.98830	0.98758	0.99771	0.99008	0.2437	102.8	15.72	3.65	14.63	34.00	8.28	2.19	0.35	2.00	4.53	1.11	1.68	0.41	40.21	9.80
38年目	R 39	0.98820	0.98746	0.99770	0.99000	0.2343	102.8	15.54	3.60	14.60	33.73	7.90	2.16	0.34	1.99	4.50	1.05	1.66	0.39	39.90	9.35
39年目	R 40	0.98809	0.98734	0.99770	0.98992	0.2253	102.8	15.35	3.56	14.56	33.47	7.54	2.14	0.34	1.99	4.47	1.01	1.65	0.37	39.58	8.92
40年目	R 41	0.98798	0.98722	0.99769	0.98984	0.2166	102.8	15.17	3.51	14.53	33.21	7.19	2.11	0.34	1.99	4.43	0.96	1.63	0.35	39.27	8.51
41年目	R 42	0.98787	0.98710	0.99769	0.98976	0.2083	102.8	14.99	3.47	14.50	32.95	6.86	2.09	0.33	1.98	4.40	0.92	1.61	0.34	38.96	8.12
42年目	R 43	0.98776	0.98698	0.99768	0.98968	0.2003	102.8	14.81	3.42	14.46	32.69	6.55	2.06	0.33	1.98	4.36	0.87	1.60	0.32	38.65	7.74
43年目	R 44	0.98766	0.98686	0.99768	0.98960	0.1926	102.8	14.62	3.38	14.43	32.43	6.25	2.04	0.32	1.97	4.33	0.83	1.58	0.30	38.34	7.38
44年目	R 45	0.98755	0.98674	0.99767	0.98952	0.1852	102.8	14.44	3.33	14.40	32.17	5.96	2.01	0.32	1.97	4.30	0.80	1.56	0.29	38.03	7.04
45年目	R 46	0.98744	0.98662	0.99767	0.98944	0.1780	102.8	14.26	3.29	14.36	31.91	5.68	1.98	0.31	1.96	4.26	0.76	1.55	0.28	37.72	6.71
46年目	R 47	0.98733	0.98650	0.99766	0.98936	0.1712	102.8	14.08	3.24	14.33	31.66	5.42	1.96	0.31	1.96	4.23	0.72	1.53	0.26	37.42	6.41
47年目	R 48	0.98722	0.98638	0.99766	0.98928	0.1646	102.8	13.91	3.20	14.29	31.40	5.17	1.94	0.31	1.95	4.19	0.69	1.51	0.25	37.11	6.11
48年目	R 49	0.98712	0.98626	0.99765	0.98920	0.1583	102.8	13.73	3.16	14.26	31.15	4.93	1.91	0.30	1.95	4.16	0.66	1.50	0.24	36.81	5.83
49年目	R 50	0.98701	0.98614	0.99765	0.98912	0.1522	102.8	13.55	3.11	14.23	30.89	4.70	1.89	0.30	1.94	4.13	0.63	1.48	0.23	36.50	5.56
合計								840.83	200.00	700.18	1,741.02	798.45	118.91	19.74	97.13	235.77	109.60	88.77	41.45	2,065.56	949.49

便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:一般国道8号 小松バイパス

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸ブロック)				GDP デフレータ	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)				現在価値 (1)×(A)	走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)			合計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			(A)	102.8	乗用車類	小型貨物		普通貨物	①計	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1)~(3)	現在価値 割引率4%
供用開始	R 9	0.99635	0.98183	1.00300	0.99557	0.7599	102.8	5.83	1.34	4.72	11.89	9.04	0.44	0.03	0.41	0.88	0.67	0.38	0.29	13.15	9.99		
1年目	R 10	0.99634	0.98149	1.00299	0.99555	0.7307	102.8	5.81	1.31	4.74	11.86	8.67	0.44	0.03	0.41	0.87	0.64	0.38	0.28	13.12	9.58		
2年目	R 11	0.99633	0.98114	1.00298	0.99553	0.7026	102.8	5.79	1.29	4.75	11.83	8.31	0.44	0.03	0.41	0.87	0.61	0.38	0.26	13.08	9.19		
3年目	R 12	0.99094	0.99051	0.99783	0.99205	0.6756	102.8	5.77	1.27	4.77	11.80	7.97	0.43	0.03	0.41	0.87	0.59	0.37	0.25	13.05	8.81		
4年目	R 13	0.99086	0.99042	0.99783	0.99199	0.6496	102.8	5.72	1.25	4.76	11.73	7.62	0.43	0.03	0.41	0.87	0.56	0.37	0.24	12.96	8.42		
5年目	R 14	0.99077	0.99033	0.99783	0.99192	0.6246	102.8	5.66	1.24	4.75	11.65	7.28	0.43	0.02	0.41	0.86	0.54	0.37	0.23	12.88	8.05		
6年目	R 15	0.99069	0.99023	0.99782	0.99186	0.6006	102.8	5.61	1.23	4.74	11.58	6.95	0.42	0.02	0.41	0.86	0.52	0.36	0.22	12.80	7.69		
7年目	R 16	0.99060	0.99014	0.99782	0.99179	0.5775	102.8	5.56	1.22	4.73	11.50	6.64	0.42	0.02	0.41	0.85	0.49	0.36	0.21	12.72	7.34		
8年目	R 17	0.99051	0.99004	0.99781	0.99172	0.5553	102.8	5.51	1.21	4.72	11.43	6.35	0.41	0.02	0.41	0.85	0.47	0.36	0.20	12.63	7.02		
9年目	R 18	0.99042	0.98994	0.99781	0.99166	0.5339	102.8	5.45	1.19	4.71	11.35	6.06	0.41	0.02	0.41	0.84	0.45	0.36	0.19	12.55	6.70		
10年目	R 19	0.99033	0.98984	0.99780	0.99158	0.5134	102.8	5.40	1.18	4.70	11.28	5.79	0.41	0.02	0.41	0.84	0.43	0.35	0.18	12.47	6.40		
11年目	R 20	0.99023	0.98973	0.99780	0.99151	0.4936	102.8	5.35	1.17	4.68	11.20	5.53	0.40	0.02	0.41	0.83	0.41	0.35	0.17	12.39	6.11		
12年目	R 21	0.99014	0.98963	0.99779	0.99144	0.4746	102.8	5.30	1.16	4.67	11.13	5.28	0.40	0.02	0.41	0.83	0.39	0.35	0.16	12.30	5.84		
13年目	R 22	0.99004	0.98952	0.99779	0.99137	0.4564	102.8	5.24	1.15	4.66	11.05	5.05	0.40	0.02	0.40	0.82	0.38	0.34	0.16	12.22	5.58		
14年目	R 23	0.98994	0.98941	0.99778	0.99129	0.4388	102.8	5.19	1.13	4.65	10.98	4.82	0.39	0.02	0.40	0.82	0.36	0.34	0.15	12.14	5.33		
15年目	R 24	0.98984	0.98929	0.99778	0.99122	0.4220	102.8	5.14	1.12	4.64	10.91	4.60	0.39	0.02	0.40	0.81	0.34	0.34	0.14	12.06	5.09		
16年目	R 25	0.98973	0.98918	0.99777	0.99114	0.4057	102.8	5.09	1.11	4.63	10.83	4.39	0.38	0.02	0.40	0.81	0.33	0.34	0.14	11.97	4.86		
17年目	R 26	0.98963	0.98906	0.99777	0.99106	0.3901	102.8	5.04	1.10	4.62	10.76	4.20	0.38	0.02	0.40	0.80	0.31	0.33	0.13	11.89	4.64		
18年目	R 27	0.98952	0.98894	0.99776	0.99098	0.3751	102.8	4.98	1.09	4.61	10.68	4.01	0.38	0.02	0.40	0.80	0.30	0.33	0.12	11.81	4.43		
19年目	R 28	0.98941	0.98881	0.99776	0.99090	0.3607	102.8	4.93	1.07	4.60	10.61	3.83	0.37	0.02	0.40	0.79	0.29	0.33	0.12	11.73	4.23		
20年目	R 29	0.98929	0.98869	0.99775	0.99081	0.3468	102.8	4.88	1.06	4.59	10.53	3.65	0.37	0.02	0.40	0.79	0.27	0.32	0.11	11.64	4.04		
21年目	R 30	0.98918	0.98856	0.99775	0.99073	0.3335	102.8	4.83	1.05	4.58	10.46	3.49	0.36	0.02	0.40	0.78	0.26	0.32	0.11	11.56	3.86		
22年目	R 31	0.98906	0.98842	0.99774	0.99064	0.3207	102.8	4.77	1.04	4.57	10.38	3.33	0.36	0.02	0.40	0.78	0.25	0.32	0.10	11.48	3.68		
23年目	R 32	0.98895	0.98830	0.99774	0.99056	0.3083	102.8	4.72	1.03	4.56	10.31	3.18	0.36	0.02	0.40	0.77	0.24	0.31	0.10	11.40	3.51		
24年目	R 33	0.98884	0.98818	0.99773	0.99048	0.2965	102.8	4.67	1.01	4.55	10.23	3.03	0.35	0.02	0.39	0.77	0.23	0.31	0.09	11.31	3.35		
25年目	R 34	0.98874	0.98806	0.99773	0.99040	0.2851	102.8	4.62	1.00	4.54	10.16	2.90	0.35	0.02	0.39	0.76	0.22	0.31	0.09	11.23	3.20		
26年目	R 35	0.98863	0.98794	0.99772	0.99032	0.2741	102.8	4.57	0.99	4.53	10.09	2.76	0.34	0.02	0.39	0.76	0.21	0.31	0.08	11.15	3.06		
27年目	R 36	0.98852	0.98782	0.99772	0.99024	0.2636	102.8	4.51	0.98	4.52	10.01	2.64	0.34	0.02	0.39	0.75	0.20	0.30	0.08	11.07	2.92		
28年目	R 37	0.98841	0.98770	0.99771	0.99016	0.2534	102.8	4.46	0.97	4.51	9.94	2.52	0.34	0.02	0.39	0.75	0.19	0.30	0.08	10.98	2.78		
29年目	R 38	0.98830	0.98758	0.99771	0.99008	0.2437	102.8	4.41	0.95	4.50	9.86	2.40	0.33	0.02	0.39	0.74	0.18	0.30	0.07	10.90	2.66		
30年目	R 39	0.98820	0.98746	0.99770	0.99000	0.2343	102.8	4.36	0.94	4.49	9.79	2.29	0.33	0.02	0.39	0.74	0.17	0.29	0.07	10.82	2.54		
31年目	R 40	0.98809	0.98734	0.99770	0.98992	0.2253	102.8	4.31	0.93	4.48	9.72	2.19	0.32	0.02	0.39	0.73	0.16	0.29	0.07	10.74	2.42		
32年目	R 41	0.98798	0.98722	0.99769	0.98984	0.2166	102.8	4.26	0.92	4.47	9.64	2.09	0.32	0.02	0.39	0.73	0.16	0.29	0.06	10.66	2.31		
33年目	R 42	0.98787	0.98710	0.99769	0.98976	0.2083	102.8	4.21	0.91	4.46	9.57	1.99	0.32	0.02	0.39	0.72	0.15	0.28	0.06	10.58	2.20		
34年目	R 43	0.98776	0.98698	0.99768	0.98968	0.2003	102.8	4.15	0.90	4.45	9.50	1.90	0.31	0.02	0.39	0.72	0.14	0.28	0.06	10.50	2.10		
35年目	R 44	0.98766	0.98686	0.99768	0.98960	0.1926	102.8	4.10	0.88	4.44	9.42	1.82	0.31	0.02	0.38	0.71	0.14	0.28	0.05	10.41	2.01		
36年目	R 45	0.98755	0.98674	0.99767	0.98952	0.1852	102.8	4.05	0.87	4.43	9.35	1.73	0.31	0.02	0.38	0.71	0.13	0.28	0.05	10.33	1.91		
37年目	R 46	0.98744	0.98662	0.99767	0.98944	0.1780	102.8	4.00	0.86	4.42	9.28	1.65	0.30	0.02	0.38	0.70	0.12	0.27	0.05	10.25	1.83		
38年目	R 47	0.98733	0.98650	0.99766	0.98936	0.1712	102.8	3.95	0.85	4.41	9.21	1.58	0.30	0.02	0.38	0.70	0.12	0.27	0.05	10.17	1.74		
39年目	R 48	0.98722	0.98638	0.99766	0.98928	0.1646	102.8	3.90	0.84	4.40	9.14	1.50	0.29	0.02	0.38	0.69	0.11	0.27	0.04	10.09	1.66		
40年目	R 49	0.98712	0.98626	0.99765	0.98920	0.1583	102.8	3.85	0.83	4.39	9.06	1.43	0.29	0.02	0.38	0.69	0.11	0.26	0.04	10.02	1.59		
41年目	R 50	0.98701	0.98614	0.99765	0.98912	0.1522	102.8	3.80	0.81	4.38	8.99	1.37	0.29	0.02	0.38	0.68	0.10	0.26	0.04	9.94	1.51		
42年目	R 51	0.98690	0.98602	0.99764	0.98904	0.1463	102.8	3.75	0.80	4.36	8.92	1.31	0.28	0.02	0.38	0.68	0.10	0.26	0.04	9.86	1.44		
43年目	R 52	0.98679	0.98590	0.99764	0.98896	0.1407	102.8	3.70	0.79	4.35	8.85	1.25	0.28	0.02	0.38	0.67	0.09	0.26	0.04	9.78	1.38		
44年目	R 53	0.98669	0.98578	0.99763	0.98888	0.1353	102.8	3.65	0.78	4.34	8.78	1.19	0.28	0.02	0.38	0.67	0.09	0.25	0.03	9.70	1.31		
45年目	R 54	0.98658	0.98566	0.99763	0.98880	0.1301	102.8	3.61	0.77	4.33	8.71	1.13	0.27	0.02	0.38	0.66	0.09	0.25	0.03	9.62	1.25		
46年目	R 55	0.98647	0.98554	0.99762	0.98872	0.1251	102.8	3.56	0.76	4.32	8.64	1.08	0.27	0.02	0.37	0.66	0.08	0.25	0.03	9.55	1.19		
47年目	R 56	0.98636	0.98542	0.99762	0.98864	0.1203	102.8	3.51	0.75	4.31	8.57	1.03	0.26	0.01	0.37	0.65	0.08	0.24	0.03	9.47	1.14		
48年目	R 57	0.98625	0.98530	0.99761	0.98856	0.1157	102.8	3.46	0.74	4.30	8.50	0.98	0.26	0.01	0.37	0.65	0.08	0.24	0.03	9.39	1.09		
49年目	R 58	0.98615	0.98518	0.99761	0.98848	0.1112	102.8	3.41	0.73	4.29	8.43	0.94	0.26	0.01	0.37	0.64	0.07	0.24	0.03	9.32	1.04		
合計								232.42	50.57	227.13	510.11	182.74	17.51	1.01	19.68	38.21	13.62	15.50	5.65	563.83	202.01		
