


令和6年能登半島地震の概要


震度分布図・推計震度分布図

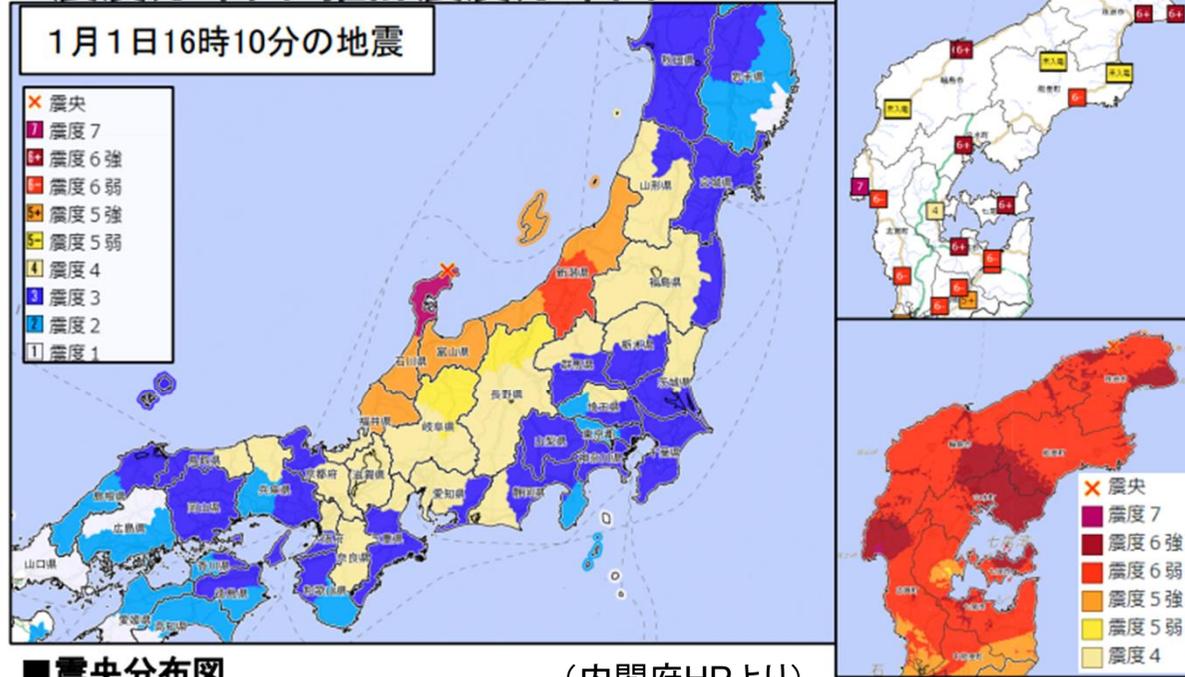

震央分布図

(2020年12月1日～2024年1月3日11時00分、深さ0～30km、M3.0以上)

※2024年1月1日以降の地震を赤く表示

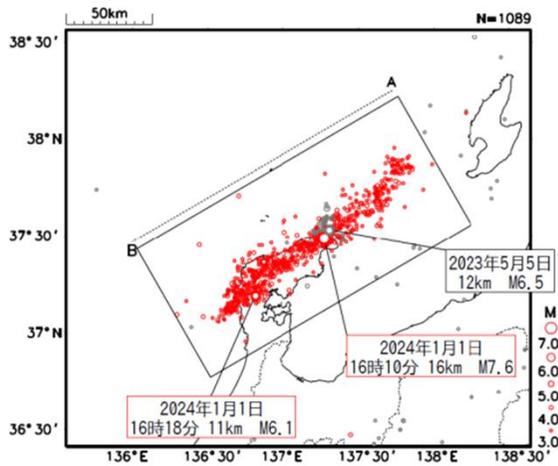

(内閣府HPより)

(内閣府HPより)

最大加速度上位10観測点

観測点名	最大加速度	計測震度
1 K-NET富来(ISK006)	2,828 gal	6.6
2 K-NET輪島(ISK003)	1,632 gal	6.2
3 K-NET大谷(ISK001)	1,469 gal	6.2
4 K-NET穴水(ISK005)	1,280 gal	6.5
5 KiK-net富来(ISKH04)	1,220 gal	5.9
6 KiK-net珠洲(ISKH01)	1,007 gal	6.2
7 K-NET大町(ISK015)	1,001 gal	6.3
8 KiK-net内浦(ISKH03)	936 gal	6.3
9 K-NET正院(ISK002)	917 gal	6.2
10 KiK-net志賀(ISKH06)	804 gal	5.6

計測震度は気象庁告示に基づきトリガ波形全体より計算しており、気象庁より発表される震度と計算区間が異なる

(防災科学技術研究所より)

地震の概要

発生時刻	1月1日16時10分
マグニチュード	7.6(暫定値)
発生場所	石川県能登地方(輪島の東北東30km付近) 深さ16km(暫定値)
発震機構	北西—南東方向に圧力軸を持つ逆断層型(速報)
震度	【最大震度7】 石川県 志賀町、輪島市 そのほか、石川県、新潟県、富山県、福井県で震度6強から震度5強を観測
地震活動の状況	1日16:06の最大震度5強の地震以降、震度1以上を観測した地震が1668回 (震度7:1回、震度6強:0回、震度6弱:2回、震度5強:8回ほか)

(内閣府HPより 2月20日14時現在)

能登半島へのアクセス確保

2/20 7時00分時点
国土交通省 道路局

(主な対応状況)

- 1/2
 - ・北陸道などの高速道路(NEXCO・公社管理)の通行止め解除
 - ・能登半島へのアクセス道路の緊急復旧に着手
 - ・普通車について、輪島・珠洲市までアクセス確保(大型車について、1/4確保)
- 1/9
 - ・緊急復旧により、半島内の幹線道路の約8割が通行可(1/15 約9割まで進捗)
- 1/14
 - ・総理大臣の指示を受け、権限代行に関する調整に着手
- 1/23
 - ・国が石川県に代わり本格的な災害復旧を代行することを決定

- : 能越自動車道・のと里山海道
- : 交通規制区間(一方通行・速度規制)
- : 通行止め区間
- : 奥能登2市2町への主要ルート(一般道)


権限代行区間:

国道249号の沿岸部

のと里山海道を含む
能越自動車道の
石川県管理区間



能越自動車道・のと里山海道
通行止め解除の当面の見通し

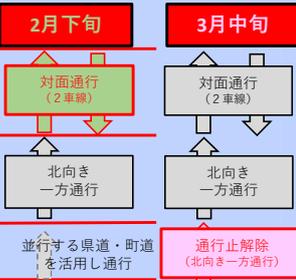

被災状況

能越自動車道・のと里山海道

- 写真① 能越道(のと里山空港IC~穴水IC)
- 写真② のと里山海道(穴水IC~別所岳SA)
- 写真③ のと里山海道(別所岳SA~横田IC)



○七尾市(徳田大津)からの所要時間

2/17 (8時台発)	穴水町 約1時間	輪島市 約1.5時間	珠洲市 約1.5時間
2/18 (9時台発)	穴水町 約1時間	輪島市 約1.5時間	珠洲市 約2時間
2/19 (9時台発)	穴水町 約1時間	輪島市 約1.5時間	珠洲市 約2時間



緊急復旧(道路啓開)の
状況や交通状況等を、
web地図上で閲覧できる
「道路復旧見える化マップ」
を公表(1月12日より)

二次元コードは
↓コチラ



URL : <https://www.mlit.go.jp/road/r6noto/index2.html>

令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年2月20日(火) 7時00分時点
国土交通省・石川県

- 1/2から幹線道路の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、地元を中心とした各建設業協会や(一社)日本建設業連合会の応援を受け、緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、11方向で通路を確保。
- 孤立集落は2/13に解消。引き続き、水道・電力などの要望、自治体の要請を踏まえ、緊急復旧を実施。

主要な幹線道路における緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の 主要な幹線道路	約6割 ⇒	約9割
うち国道249号 沿岸部※1	約2割 ⇒	約8割 (迂回路を考慮:約9割)
沿岸部への到達 ※2	6方向 ⇒	11方向

※1: 輪島市門前町～珠洲市役所、※2: 内陸側・海側の両方

孤立地区数の推移※3


1月5日8時	33地区 (最大3,345人)
2月13日16時	解消

※3: 内閣府防災資料より

生活インフラ復旧に必要な重要箇所の緊急復旧状況※4

優先復旧の要望数	43箇所
うち完了数	35箇所(約8割)

※4: 水道、電力、通信、放送事業者より聞き取り

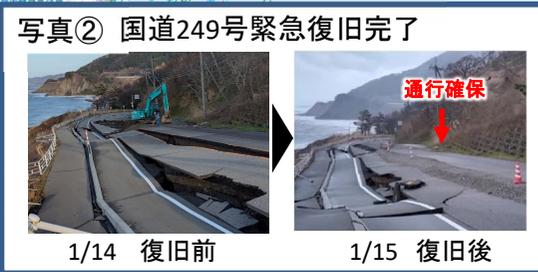

のと里山海道 柳田ICから越の原IC間北向き一方通行
金沢から穴水方向のみ通行可 ※一般車両通行止め
