

～急流河川本明川の治水対策・急激な水位上昇から自ら身を守る防災・減災対策～

位置図

西九州概況図
1 : 1,000,000

佐賀県

有明海

本町


松山市

長崎県

凡例

 浸水範囲
(戦後最大のS32.7と同規模の洪水が
発生した場合の浸水範囲 想定)

 大臣管理区間



調整池

- ・河道掘削、堤防整備（引堤）、本明川ダム建設、堤防質的改良対策・地震対策、護岸整備（河道拡幅）等
- ・小ヶ倉ダムにおける事前放流等の実施、体制構築
- ・一定規模以上の開発行為における調整池設置の指導
- ・市道の透水性舗装（歩道）
- ・保安林・民有林の保水能力の機能向上
- ・豊かな森づくり基金による民有林の継続的な森林整備支援
- ・砂防・治山施設等の整備促進による土砂流出抑制
- ・排水機場等の整備・運用
- ・諫早湾干拓調整池の適切な水位管理

- ・二線堤の保全
- ・市街化調整区域における新たな開発等への対応

- ・危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置
- ・関係機関と協力した防災教育の促進
- ・在留・訪日外国人に向けた防災情報の普及啓発
- ・プッシュ型情報配信、防災無線等を活用した情報発信の強化
- ・講習会等によるコミュニティタイムラインの普及促進
- ・多機関連携型タイムラインの運用
- ・要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練の促進
- ・水害リスク情報未提供区域の解消
- ・土砂災害・ため池ハザードマップ作成
- ・土砂災害警戒区域等の現地表示促進
- ・防災拠点等の整備
- ・洪水後の塵芥等の搬出拠点整備
(天満・永昌地区かわまちづくり)

■グリーンインフラの取り組み 詳細次ページ1

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

本明川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

～急流河川本明川の治水対策・急激な水位上昇から自ら身を守る防災・減災対策～

- 本明川水系では、本明川本川及び支川の流域全体を俯瞰し、国、県、市が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
- 【短期】 流下能力が不足している半造川の嘉一橋下流区間において引堤を実施。県区間においても、中山西川の河川改修を実施する。また、小ヶ倉ダムにおける事前放流等の実施、体制構築、在留・訪日外国人に向けた防災情報の普及啓発、水害リスク情報未提供区域の解消などのソフト対策を実施し、流域内の被害の軽減を目指す。
- 【中期】 本明川市街地の河道掘削及び半造川の嘉一橋上流区間の引堤、本明川ダムの建設を実施。川幅を拡げることで流下能力を向上させる。県区間においても、山田川の河川改修を実施する。また、土砂災害警戒区域等の現地表示の促進を実施し、被害の最小化を目指す。
- 【中長期】 内水軽減対策や堤防の質的改良対策・地震対策の実施し、流域内の浸水被害の軽減を図り、洪水を安全に流下させる。

区分	対策内容	実施主体	工程		
			短期	中期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	河道掘削	長崎河川国道事務所	本明川市街地河道掘削		
	堤防整備（引堤）	長崎河川国道事務所	嘉一橋下流区間	嘉一橋上流区間	半造川引堤事業 完成
	本明川ダム建設	長崎河川国道事務所			
	堤防質的改良対策・地震対策	長崎河川国道事務所	中山西川 完成 山田川 完成		
	護岸整備（河道拡幅）等	長崎県	中山西川	山田川	
	小ヶ倉ダムにおける事前放流等の実施、体制構築	長崎河川国道事務所 長崎県・諫早市 等	事前放流の実施、体制構築		
	一定規模以上の開発行為における調整池の設置の指導	諫早市・雲仙市			
	市道の透水性舗装（歩道）	諫早市			
	保安林・民有林の保水能力機能向上	長崎森林管理署・長崎県・諫早市・雲仙市・森林整備センター 等	豊かな森づくり基金 第2次計画の実施		
	豊かな森づくり基金による民有林の継続的な森林整備支援	諫早市	山口谷川砂防堰堤 完成		
	砂防施設の整備による土砂流出抑制	長崎県			
	治山施設等の整備による土砂流出抑制	長崎県			
	排水機場等の整備・運用	長崎河川国道事務所 長崎県・諫早市	平田地区奥地保安林保全緊急対策事業 完成		
	諫早湾干拓調整池の適切な水位管理	長崎県・九州農政局	諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例を改正 内水対策の実施		
被害対象を減少させるための対策	二線堤の保全	長崎河川国道事務所	諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例を改正		
	市街化調整区域における新たな開発等への対応	諫早市			
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの設置	長崎河川国道事務所 長崎県	河川監視カメラの設置 関係機関と協力した防災教育の促進		
	関係機関と協力した防災教育の促進	長崎河川国道事務所・長崎県・長崎地方気象台・諫早市・雲仙市			
	在留・訪日外国人に向けた防災情報の普及啓発	長崎地方気象台			
	ブッシュ型情報配信、防災無線等を活用した情報発信の強化	長崎河川国道事務所 長崎県・諫早市・雲仙市			
	講習会によるコミュニティタイムラインの普及促進	長崎河川国道事務所・諫早市	在留・訪日外国人に向けた防災情報の普及啓発		
	多機関連携型タイムラインの運用	長崎河川国道事務所・長崎県・長崎地方気象台・諫早市			
	要配慮者利用施設の避難確保計画作成・訓練の促進	長崎河川国道事務所 長崎県・諫早市・雲仙市			
	水害リスク情報未提供区域の解消	長崎県			
	土砂災害・ため池ハザードマップ作成	諫早市	本明川水系では、34河川で公表予定		
	ため池ハザードマップ作成	雲仙市			
	土砂災害警戒区域等の現地表示促進	長崎県			
	防災拠点等の整備	長崎河川国道事務所 諫早市			
	洪水後の塵芥等の搬出拠点整備（天満・永昌地区かわまちづくり）	長崎河川国道事務所 諫早市			
グリーンインフラの取組	湿地や草地の保全・創出（ビオトープ）	長崎河川国道事務所			
	貴重種等の移植	長崎河川国道事務所	諫早駅前 拠点整備 完成		
	生物の多様な生育環境、河川景観の保全	長崎河川国道事務所 長崎県			
	天満・永昌地区かわまちづくり	長崎河川国道事務所 諫早市			
	森林の保全・整備事業への支援	長崎森林管理署・長崎県・諫早市・雲仙市・森林整備センター 等			
	民間協働による水質調査	長崎河川国道事務所			
	小中学校などにおける河川環境学習	長崎河川国道事務所			
地域	地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携支援	長崎河川国道事務所			

■河川対策（約765億円）
■砂防対策（約6億円）

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

■グリーンインフラの取り組み
詳細次ページ


※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

本明川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】

～急流河川本明川の治水対策・急激な水位上昇から自ら身を守る防災・減災対策～

●グリーンインフラの取り組み 『川と触れ合い、親しめる潤いのある水辺空間の整備』

- 本明川は、上流は景勝地の富川渓谷があり自然探勝や行楽に訪れる人々の憩いの場となっています。また中流は、諫早市街地を流れ、水辺には河川公園や遊歩道が整備され、散策や水遊び釣りなどに利用され、沿川住民に親しまれています。下流は、桜づつみや、自然干陸地ではフラワーゾーン・クロスカントリーコースが整備され、地域が主体となって水辺の賑わいの創出が行われています。
- 諫早市の「新幹線開業を活かした諫早市魅力創出行動計画」において、駅前公園整備による新たな親水空間の提供、本明川散策路整備による回遊促進を具体的な取り組みとして設定しており、概ね今後6年間で天満・永昌地区でのかわまちづくりをすすめるなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。

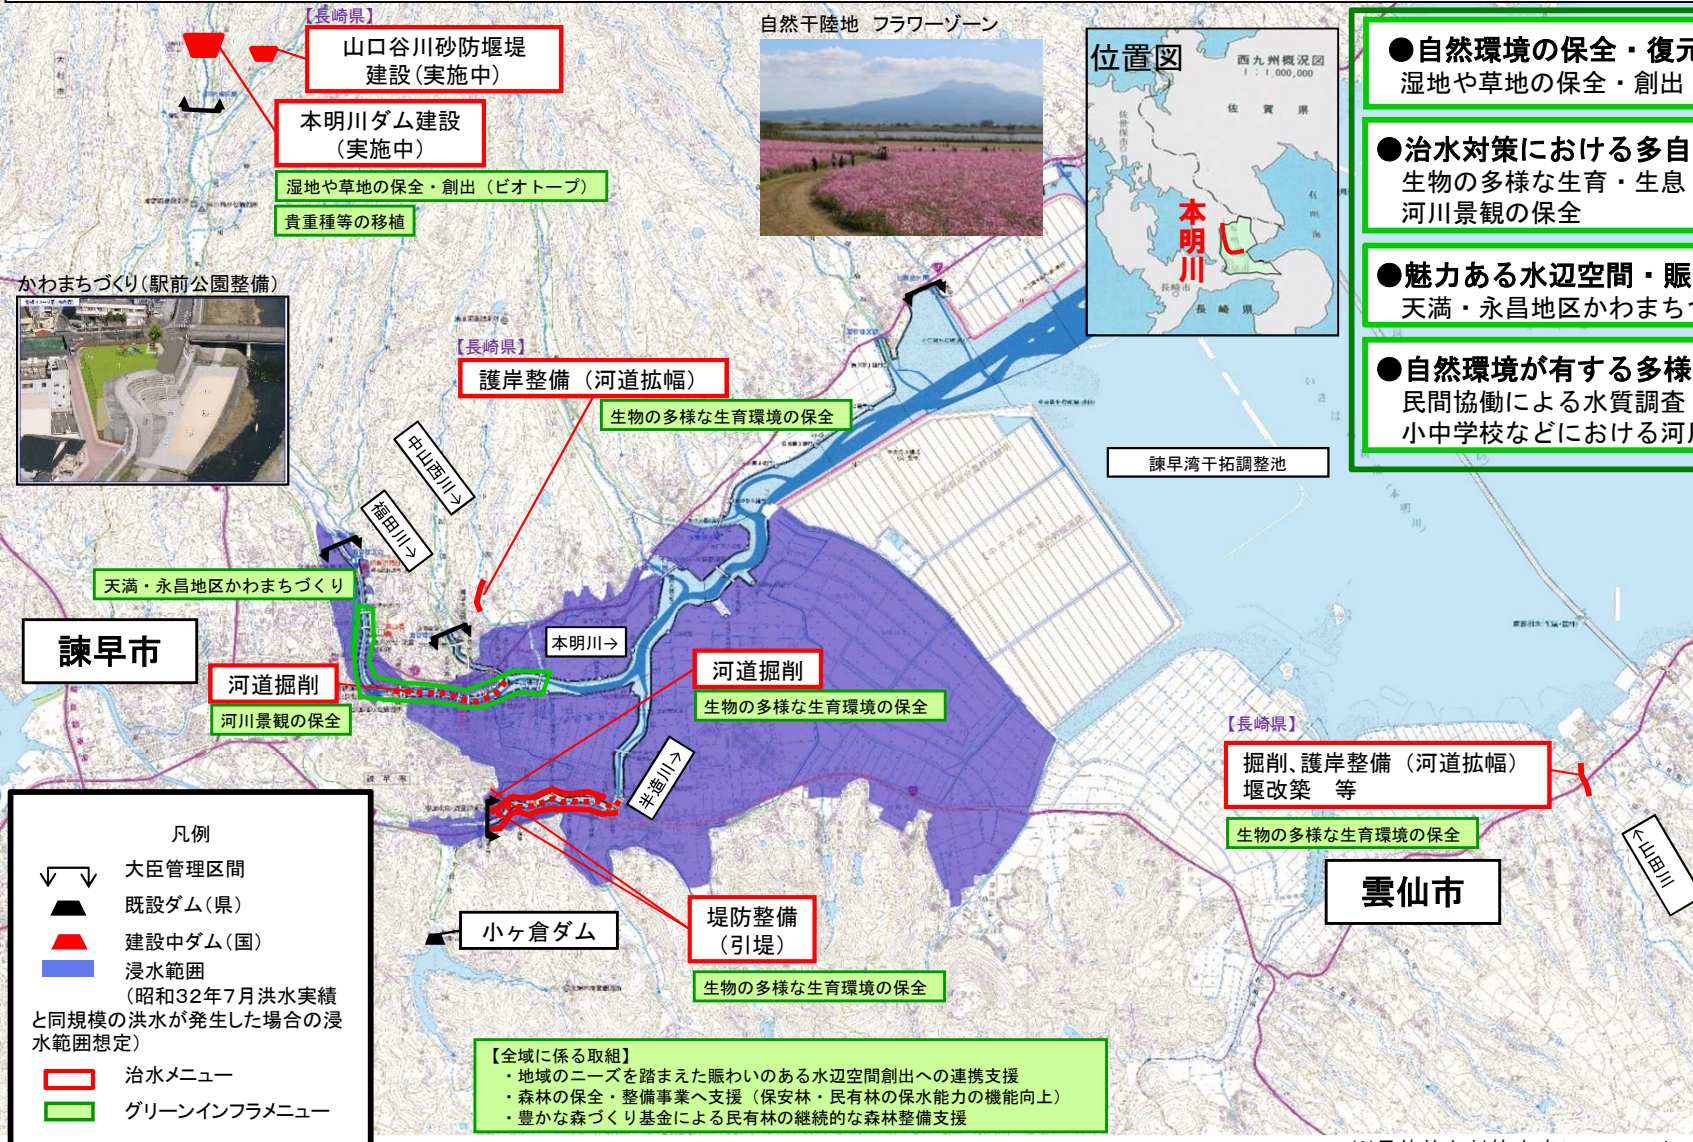

●自然環境の保全・復元などの自然再生

湿地や草地の保全・創出(ビオトープ)、貴重種等の移植

●治水対策における多自然川づくり

生物の多様な生育・生息・繁殖環境の保全
河川景観の保全

●魅力ある水辺空間・賑わい創出

天満・永昌地区かわまちづくり

●自然環境が有する多様な機能活用の取組み

民間協働による水質調査
小中学校などにおける河川環境学習

かわまちづくり(水際環境の創出)



かわまちづくり(管理用通路の整備)



小中学校などにおける環境学習



※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。


本明川水系流域治水プロジェクト【事業効果（国直轄区間）の見える化】

～急流河川本明川の治水対策・急激な水位上昇から自ら身を守る防災・減災対策～

○半造川の嘉一橋下流の堤防整備(引堤)が完了し、昭和32年7月洪水(諫早大水害)が再び発生しても、嘉一橋から下流区間において、HWL以下で安全に流下させることが可能。

短期整備(5か年加速化対策)効果: 河川整備率 約35%→約48%

実施箇所・対策内容

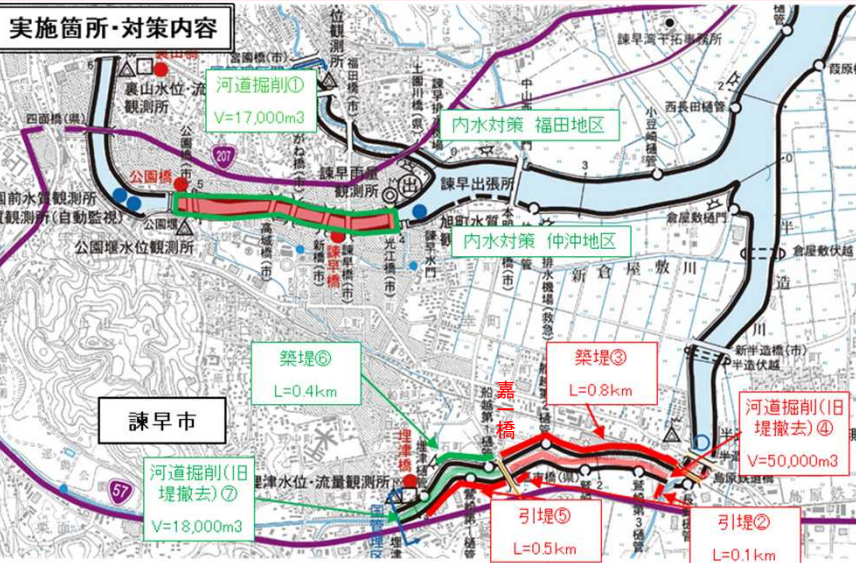

区分	区間	対策内容	工程	
			R3 短期(R3年度～R7年度)	中長期(R8年度～R17年度)
本明川市街地区間		本明川ダムの建設		本明川ダムR14完成
		①河道掘削	概ね1/30→1/30	概ね1/30→1/70
半造川 嘉一橋下流区間		②引堤	概ね1/10→1/30	概ね1/30→1/50
		③築堤	100%	
		④旧堤撤去		
半造川 嘉一橋上流区間		⑤引堤	概ね1/10→1/10	概ね1/10→1/50
		⑥左岸築堤	30%	100%
		⑦旧堤撤去		
堤防質的改良対策・地震対策		耐震対策		100%
福田地区、仲沖地区		内水対策		100%

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

5ヶ年加速化メニュー: 赤字
整備計画残メニュー: 緑字

【短期整備完了の進捗】

本明川市街地区間

①河道掘削 0%→20%

嘉一橋下流区間

②引堤 80%→100%

③左岸築堤 0%→100%

④旧堤撤去 0%→100%

嘉一橋上流区間


⑤⑥⑦引堤・左岸築堤・旧堤撤去

0%→30%

凡例


- 高頻度 (1/10)
- 中高頻度 (1/30)
- 中頻度 (1/50)
- 低頻度 (1/100)
- 想定最大規模

現在

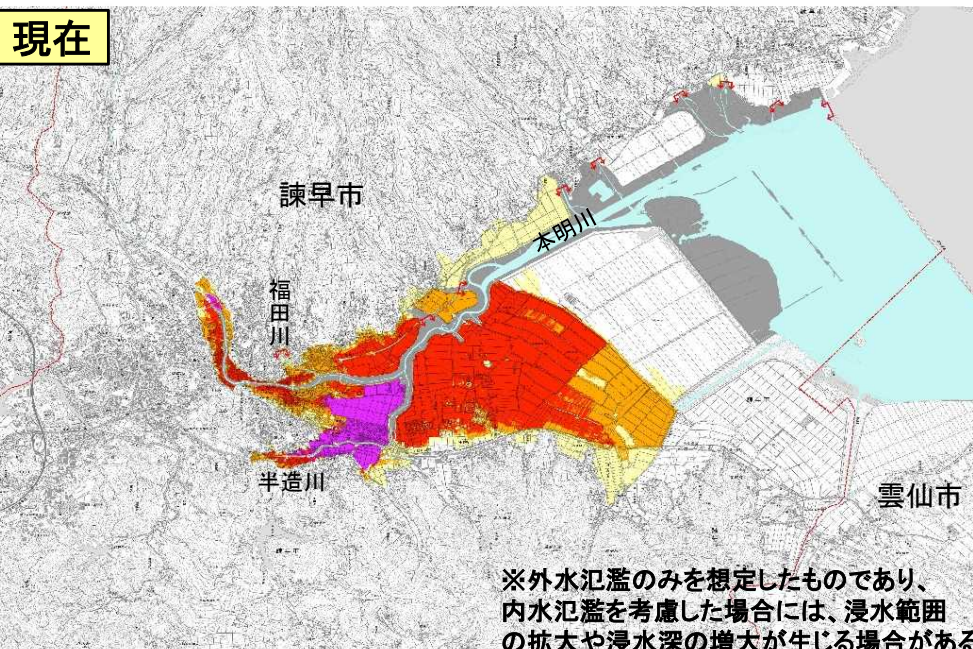

短期

※国直轄事業の実施によるものである。

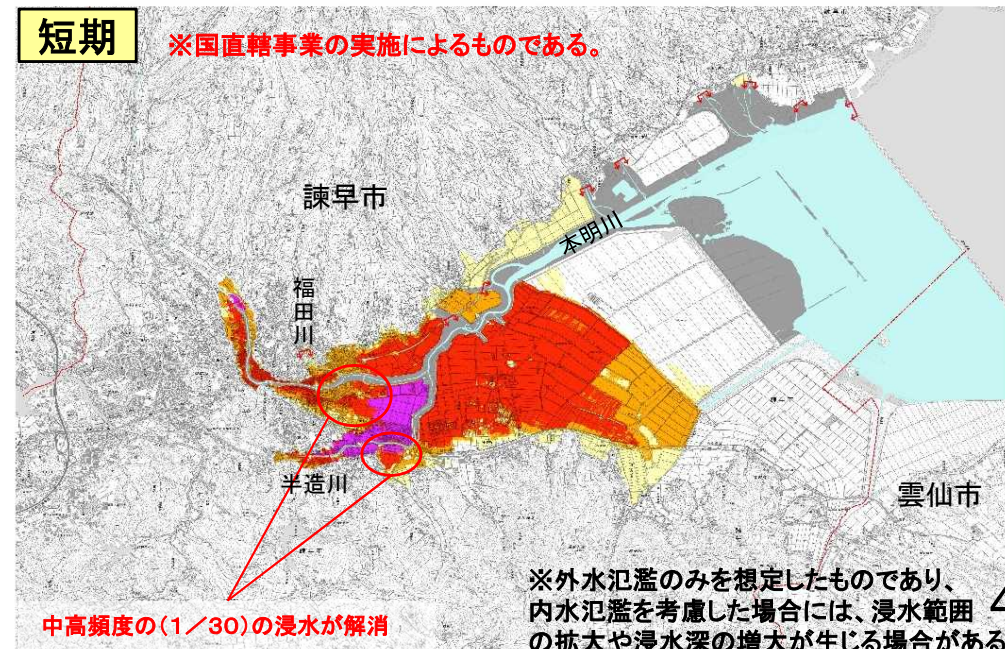

本明川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

～急流河川本明川の治水対策・急激な水位上昇から自ら身を守る防災・減災対策～

戦後最大洪水等に対応した
河川の整備（見込）



整備率：48%

（概ね5か年後）

農地・農業用施設の活用



2市町村

（令和4年度末時点）

流出抑制対策の実施



3施設

（令和3年度実施分）

山地の保水機能向上および
土砂・流木災害対策



治山対策等の
実施箇所
（令和4年度実施分）

0箇所

砂防関係施設の
整備数
（令和4年度完成分）
※施工中 1施設

0施設

立地適正化計画における
防災指針の作成



0市町村

（令和4年12月末時点）

避難のための
ハザード情報の整備



洪水浸水想定
区域

2河川

（令和4年9月末時点）
※一部、令和4年3月末時点

内水浸水想定
区域

0団体

（令和4年9月末時点）

高齢者等避難の
実効性の確保



避難確保
計画

洪水
80施設
土砂
82施設
（令和4年9月末時点）

個別避難計画

2市町村
（令和4年1月1日時点）

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

堤防整備（引堤）半造川（国）



護岸整備（河道拡幅）中山西川（県）



砂防施設の整備による土砂流出抑制（県）



治山施設の整備による土砂流出抑制（県）



半造川、中山西川、山田川の河川整備を実施し、流下能力を向上させる。
砂防、治山施設の整備を実施し、土砂流出を抑制させる。

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

PTA向け防災講座の実施（国・県）



長崎大学教育学部への防災講座
（国・気象台・長崎大学）



在留・在日外国人旅行者に対する防災情報の
普及啓発（気象台）

明日の
天気は？
（あしたの
てんきは？）

雨は
いつまで？
（あめは
いつまで？）

今どこが
危険？
（いまだこが
きけん？）

気象庁のホームページを
ホーム画面に追加しよう
（きしょうのホームページを
ほーむけいめんについかしよう）

iPhone
Android
メーニューボタン「」をタップ
「ホーム画面（がめん）に追加（ついか）」をタップ

気象庁のホームページを
ホーム画面に追加しよう
（きしょうのホームページを
ほーむけいめんについかしよう）

天気（てんき）を
スマートフォンで
みてみよう

はるん

長崎地方気象台
（ながさちほうききうたい）
Nagasaki Local Meteorological Office
☎095-811-4862
〒850-0931
長崎県 長崎市 南手町 1-1-1
（2階）（ながさちほうききうたい）

簡易型河川監視カメラの設置（国・県）



- ・国（河川）、県（砂防）で連携し、PTA連合会向けに防災講座を実施。
- ・教師を目指す学生向けに国、気象台、大学が連携し、防災教育講座を実施。
- ・半造川（国）、山田川（県）に各1基の簡易型河川監視カメラを設置。
