


# 中小工務店における木材の供給遅延の影響について(7月末調査実施)


- 中小工務店132者に対し7月末時点の状況について調査を実施。
- 5月以降9割超の中小工務店に木材供給遅延が発生し、そのうち概ね3割前後で工事に遅れが生じていると回答。
- 木材の供給遅延により、5月以降概ね3割前後の中小工務店が調査日より過去1ヶ月の間に新規の契約締結を見送り、また、概ね3割前後は新たに資金繰りが厳しくなっていると回答。

## ○ 木材の供給遅延

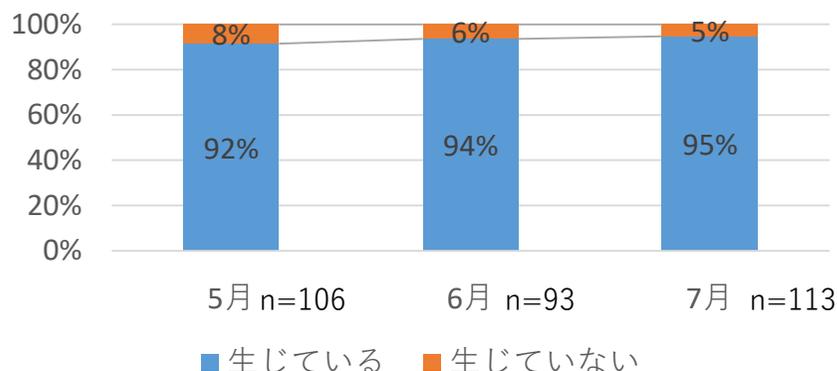


## ○ 新規契約の見送り(※)


ここ1ヶ月の間に新規の契約の締結を見送った物件はあるか

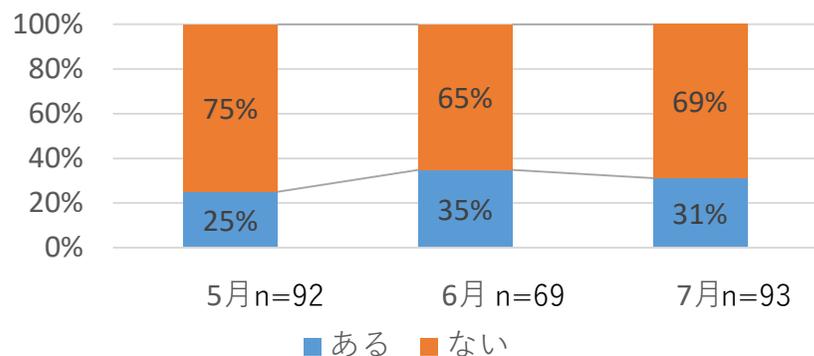

## ○ 工事の遅れ(※)

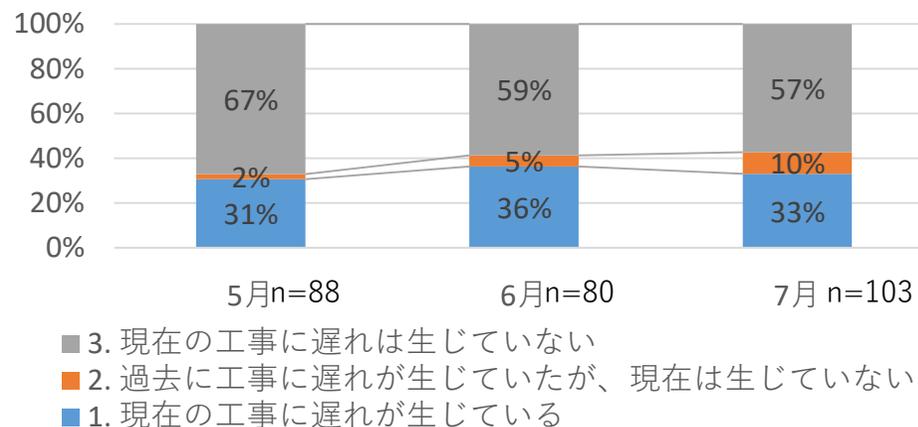

## ○ 資金繰り状況(※)

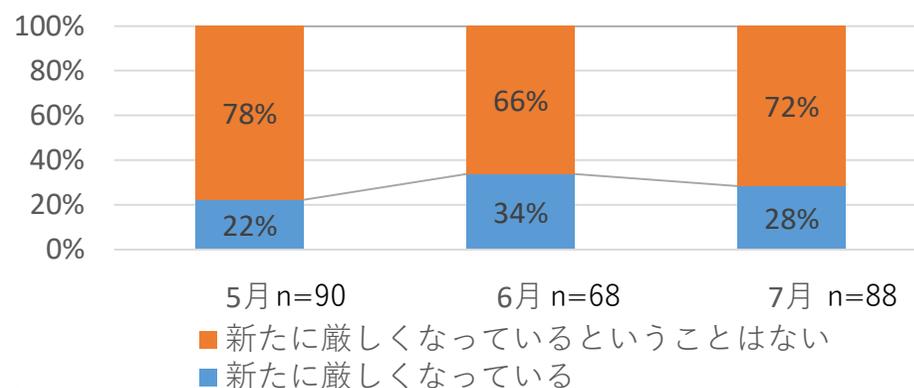


※木材の供給遅延が生じていると回答した者のうちの未回答分は集計に含んでいない。

# 中小工務店における木材の供給遅延の影響について(7月末調査実施)


- 工事に遅れが生じている時期は、着工前から竣工予定1ヶ月前までさまざま。
- 工事の遅れについての建築主との合意は、建築主と調整中との回答が減少し(6月末時点は48%)、約7割が何らかの合意を得られている(6月末時点は37%)。

○ 工事遅延の時期(回答:34者回答)

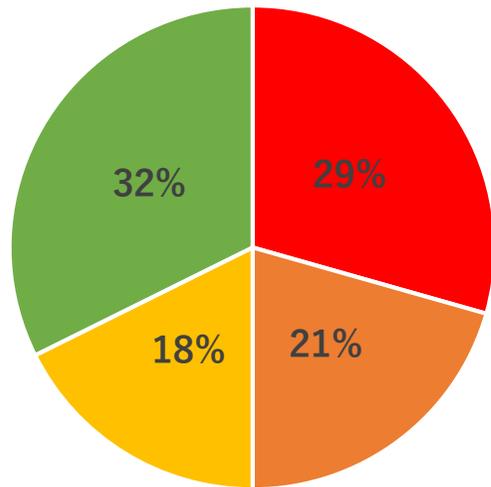

- 竣工1ヶ月前
- 竣工2ヶ月前
- 竣工3ヶ月前
- それ以前

○ 工事遅延についての建築主の合意(回答:34者)

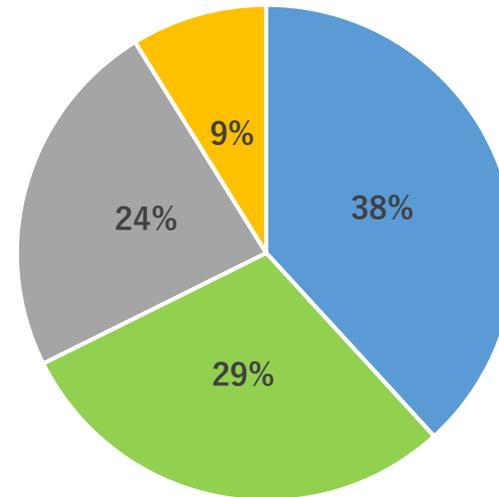

- 建築主の合意を得られ、契約変更や合意書の作成ができた
- 建築主と口頭でのみ合意を得られた
- 建築主と調整中
- 建築主とこれから調整する
