

「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」 調査結果(建設企業)

目次

1 調査の概要<建設企業>	1
2 調査の結果<建設企業>	2
回答者の属性	
F2-1_本社所在地_都道府県(SA)	2
F3_所属団体名(MA)	3
F4_主な許可業種(MA)	5
F5_完工高(SA)	6
F6_従業者数(SA)	7
F7_元請・下請工事の割合(SA)	8
F8_土木・建築工事の割合(SA)	9
F9_公共・民間工事の割合(SA)	10
F10_請け負った工事の元請企業(SA)	11
F11_特定企業への専属比率(SA)	12
F12-1_キャリアアップシステムの登録状況(MA)	13
民間工事全般における工期設定の状況	
問 1-1_注文者から提案された工期は適切だったか(SA)	14
問 1-2_工期の設定はどのように行っているか(SA)	15
問 1-3_協議後の工期の長さは適切だったか(SA)	16
問 1-4_工期不足に対応するために実施したこと(MA)	17
問 1-5_契約において工程に影響を与える条件が適切に明示されていたか(SA)	19
問 1-6_工事に関わる就業者の休日確保に影響すると考えるもの(MA)	20
問 1-8_平均的な休日の取得状況(SA)	21
問 1-9_工期変更が行われたり、一時中止となった工事はあったか(MA)	22

工期変更がなかった個別の民間工事の概要

問 2・3-3_請負階層(SA)	23
問 2・3-4_工事の種類(SA)	24
問 2・3-5_発注者の属性(SA)	25
問 2・3-6_元請企業の属性(SA)	26
問 2・3-7_工事の請負額(SA)	27
問 2・3-8_工事期間(SA)	28
問 2・3-9_工期をどのように設定したか(SA)	29
問 2・3-10_工期は適切だったか(SA)	30
問 2・3-11_実際に取得できた休日状況(SA)	31

工期変更があった個別の民間工事の概要

問 4・5-3_請負階層(SA)	32
問 4・5-4_工事の種類(SA)	33
問 4・5-5_発注者の属性(SA)	34
問 4・5-6_元請企業の属性(SA)	35
問 4・5-7_工事の請負額(SA)	36
問 4・5-8_工事期間(SA)	37
問 4・5-9_工期をどのように設定したか(SA)	38
問 4・5-10_当初工期は適切だったか(SA)	39
問 4・5-11_実際に取得できた休日状況(SA)	40
問 4・5-12_工期変更を提案したのはだれか(SA)	41
問 4・5-13_工期が変更された理由(MA)	42
問 4・5-14_変更後の工期に関する評価(SA)	45
問 4・5-15_工期変更に対して工事費は増加したか(SA)	46
問 4・5-16_工事費が増加した要因(MA)	47
問 4・5-17_増加した工事費に対し交渉は認められたか(SA)	49
問 4・5-18_最終的に利益は確保できたか(SA)	50

適正工期確保や生産性向上に向けた取組

問 6-1_中建審「工期に関する基準」の周知について(SA)	51
問 6-2_工期の適正な設定に関する状況に変化はあったか(SA)	52
問 6-3_適正な工期設定の確保のために必要なことは何か(MA)	53
問 6-4_長時間労働の是正や週休2日の確保に向けて自ら推進している取組(MA)	56
問 6-5_取り組んでいる生産性向上に資する取組(MA)	58

1 調査の概要<建設企業>

〔調査の目的〕

民間発注工事における工期設定の実態及び課題を把握するため、受注者である建設企業の立場から見た工期設定プロセスや課題認識等を明らかにする必要がある。そのため、建設企業を対象に工期設定プロセス等についてアンケート調査を行い、規模・業種・工事内容・階層等別に集計・分析を行う。

〔調査対象〕

建設業法第27条の37の規定に基づく届出団体（111団体）の各団体会員企業

〔調査時点〕

令和4年1月1日現在（令和2年9月以降に請け負った工事）

〔回答方法〕

専用ホームページ（一部FAX）

〔回答企業数〕

1)回答企業数 1,933社

2)うち無効回答（調査対象となる工事の実績がなかった企業の回答を含む）462社

3)有効回答企業数 1,471社

〔調査項目〕

主に民間工事について、工期設定にあたっての受発注者間の協議の有無／工期の適正性／工期変更の理由／工期変更に伴い増加した工事費の負担／休日の取得状況／働き方改革・生産性向上に向けた取組 など

2 調査の結果<建設企業>

回答者の属性

F2-1_本社所在地_都道府県(S A)

地域	回収数		都道府県	回収数	
		全回答に対する割合			全回答に対する割合
全体	1,471	100.0%	全体	1,471	100.0%
北海道	150	10.2%	北海道	150	10.2%
東北	161	10.9%	青森県	38	2.6%
			岩手県	27	1.8%
			秋田県	15	1.0%
			宮城県	35	2.4%
			山形県	24	1.6%
			福島県	22	1.5%
関東	313	21.3%	茨城県	50	3.4%
			栃木県	31	2.1%
			群馬県	18	1.2%
			千葉県	16	1.1%
			東京都	140	9.5%
			埼玉県	26	1.8%
			神奈川県	23	1.6%
			山梨県	3	0.2%
			長野県	6	0.4%
			北陸	88	6.0%
富山県	11	0.7%			
石川県	62	4.2%			
中部	241	14.5%	岐阜県	86	5.8%
			静岡県	19	1.3%
			愛知県	90	6.1%
			三重県	19	1.3%
近畿	181	12.3%	福井県	34	2.3%
			滋賀県	3	0.2%
			京都府	7	0.5%
			大阪府	57	3.9%
			兵庫県	62	4.2%
			奈良県	16	1.1%
			和歌山県	2	0.1%
中国	137	9.3%	鳥取県	14	1.0%
			島根県	41	2.8%
			岡山県	8	0.5%
			広島県	52	3.5%
			山口県	22	1.5%
四国	74	5.0%	香川県	11	0.7%
			徳島県	8	0.5%
			愛媛県	39	2.7%
			高知県	16	1.1%
九州・沖縄	153	10.4%	福岡県	28	1.9%
			佐賀県	4	0.3%
			長崎県	7	0.5%
			大分県	6	0.4%
			熊本県	3	0.2%
			宮崎県	31	2.1%
			鹿児島県	40	2.7%
沖縄県	34	2.3%			

n=1,471

F3_所属団体名(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	全国管工事業協同組合連合会	92	6.3%
2	(一社) 日本空調衛生工事業協会	115	7.8%
3	(一社) 日本建設機械施工協会	18	1.2%
4	(一社) 日本塗装工業会	59	4.0%
5	(一社) 全国建設業協会【各都道府県建設業協会】	652	44.3%
6	(一社) 日本左官業組合連合会	12	0.8%
7	(一社) 日本サッシ協会	2	0.1%
8	(一社) 日本電設工業協会	81	5.5%
9	建設工業経営研究会	8	0.5%
10	(一社) 海外建設協会	7	0.5%
11	(一社) 日本道路建設業協会	37	2.5%
12	(一社) 日本埋立浚渫協会	20	1.4%
13	(一社) 鉄骨建設業協会	3	0.2%
14	(一社) 日本建設組合連合	1	0.1%
15	(一社) 全国中小建設業協会	37	2.5%
16	(一社) 建設産業専門団体連合会	7	0.5%
17	建設業労働災害防止協会	178	12.1%
18	(一社) 情報通信エンジニアリング協会	2	0.1%
19	(一社) 日本橋梁建設協会	4	0.3%
20	(公社) 全国鉄筋工事業協会	40	2.7%
21	(一社) プレハブ建築協会	4	0.3%
22	(一社) 全国さく井協会	1	0.1%
23	(一社) 日本蔦工業連合会	5	0.3%
24	日本室内装飾事業協同組合連合会	7	0.5%
25	(一社) 日本タイル煉瓦工事工業会	5	0.3%
26	全日本板金工業組合連合会	30	2.0%
27	(一社) 日本エレベーター協会	10	0.7%
28	(一社) 情報通信設備協会	4	0.3%
29	(一社) 全国建設産業協会	6	0.4%
30	(一社) 全国クレーン建設業協会	4	0.3%
31	(一社) 日本造園建設業協会	3	0.2%
32	(一社) 日本冷凍空調設備工業連合会	53	3.6%
33	(一社) 日本機械土工協会	2	0.1%
34	(一社) 日本シャッター・ドア協会	5	0.3%
35	(一社) 全国建設室内工事業協会	8	0.5%
36	(一社) 日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会	6	0.4%
37	(一社) 建築開口部協会【旧:(一社)カーテンウォール・防火開口部協会】	1	0.1%
38	(一社) プレストレスト・コンクリート建設業協会	11	0.7%
39	全国建具組合連合会	0	0.0%
40	(一社) 日本保温保冷工業協会	2	0.1%
41	(一社) 全国基礎工事業団体連合会	3	0.2%
42	全国建設業協同組合連合会	8	0.5%
43	(一社) 日本ウエルポイント協会	2	0.1%
44	(一社) 日本グラウト協会【旧:(社) 日本薬液注入会】	1	0.1%
45	(一社) 日本建設軀体工事業団体連合会	9	0.6%
46	(一社) 日本海上起重技術協会	32	2.2%
47	(一社) 日本造園組合連合会	1	0.1%
48	せんい強化セメント板協会	0	0.0%
49	(一社) 日本建設業経営協会	7	0.5%
50	全国浚渫業協会	14	1.0%
51	(一社) 土地改良建設協会	20	1.4%
52	(一社) 全国防水工事業協会	29	2.0%
53	(一社) 日本基礎建設協会	8	0.5%


No.	カテゴリー名	n	%
54	(一社) 全日本瓦工事業連盟	4	0.3%
55	(一社) 日本型枠工事業協会【旧:(社)日本建設大工事業協会】	15	1.0%
56	(一社) 全国ダクト工業団体連合会	64	4.4%
57	日本外壁仕上業協同組合連合会	2	0.1%
58	(一社) 日本建築大工技能士会	0	0.0%
59	(一社) 四国空調衛生工事業協会【旧:(一社)四国電気・管工事業協会】	6	0.4%
60	(一社) 全国コンクリート圧送事業団体連合会	5	0.3%
61	(一社) 全国タイル業協会	22	1.5%
62	(一社) 日本厨房工業会	0	0.0%
63	(一社) 重仮設業協会	6	0.4%
64	(一社) 日本計装工業会	18	1.2%
65	全日本電気工事業工業組合連合会	36	2.4%
66	全国圧気工業協会	0	0.0%
67	(公社) 日本エクステリア建設業協会	12	0.8%
68	(一社) 全国道路標識・標示業協会	23	1.6%
69	(一社) 日本金属屋根協会	2	0.1%
70	(一社) 斜面防災対策技術協会	1	0.1%
71	(一社) 全国建設産業団体連合会	10	0.7%
72	(一社) 日本下水道施設業協会	6	0.4%
73	(一社) 日本内燃力発電設備協会	1	0.1%
74	(一社) 日本建築板金協会	26	1.8%
75	消防施設工事協会	8	0.5%
76	(一社) 日本運動施設建設業協会	1	0.1%
77	全国圧接業協同組合連合会	1	0.1%
78	(一財) 中小建設業住宅センター	0	0.0%
79	全国マスチック事業協同組合連合会	22	1.5%
80	(一社) 全国ポンプ・圧送船協会	6	0.4%
81	全国板硝子工事協同組合連合会	0	0.0%
82	(一社) 日本屋外広告業団体連合会	1	0.1%
83	(一社) 日本家具産業振興会	0	0.0%
84	(公社) 全国解体工事業団体連合会	10	0.7%
85	(公社) 日本推進技術協会	5	0.3%
86	日本建設インテリア事業協同組合連合会	1	0.1%
87	(一社) 日本ウレタン断熱協会	0	0.0%
88	(一社) 日本配管工事業団体連合会	3	0.2%
89	(一社) ビルディング・オートメーション協会	1	0.1%
90	(一社) 日本トンネル専門工事業協会	1	0.1%
91	(一社) 日本アンカー協会	5	0.3%
92	(一社) 日本ツーバイフォー建築協会	0	0.0%
93	(一社) 日本木造住宅産業協会	0	0.0%
94	(一社) 日本潜水協会	13	0.9%
95	(一社) 全国特定法面保護協会	5	0.3%
96	(一社) 日本在来工法住宅協会	3	0.2%
97	ダイヤモンド工事業協同組合	10	0.7%
98	(一社) 日本建設業連合会	56	3.8%
99	(一社) フローリング協会	0	0.0%
100	(一社) 全日本漁港建設協会	26	1.8%
101	(一社) マンション計画修繕施工協会	20	1.4%
102	(一社) プレストレスト・コンクリート工事業協会	16	1.1%
103	(一社) 全国建行協	0	0.0%
104	(一社) 樹脂舗装技術協会	2	0.1%
105	(公財) 建設業適正取引推進機構	20	1.4%
106	(一社) 送電線建設技術研究会	8	0.5%
107	(一社) 日本発破・破砕協会【旧:日本発破工事協会】	1	0.1%
108	(一社) 全国中小建設工事業団体連合会	2	0.1%
109	(一社) コンクリートパイル・ポール協会	2	0.1%

No.	カテゴリー名	n	%
110	全国建設労働組合総連合	1	0.1%
111	(一社) J B N ・ 全国工務店協会	2	0.1%
112	その他の団体	125	8.5%
113	所属団体なし	15	1.0%
	全体	1,471	100.0%

F4_主な許可業種(M A)


No.	カテゴリー名	n	%
1	土木一式工事業	868	59.0%
2	建築一式工事業	654	44.5%
3	大工工事業	233	15.8%
4	左官工事業	135	9.2%
5	とび・土工工事業	698	47.5%
6	石工事業	255	17.3%
7	屋根工事業	203	13.8%
8	電気工事業	267	18.2%
9	管工事業	551	37.5%
10	タイル・れんが・ブロック工事業	189	12.8%
11	鋼構造物工事業	376	25.6%
12	鉄筋工事業	163	11.1%
13	ほ装工事業	554	37.7%
14	しゅんせつ工事業	283	19.2%
15	板金工事業	153	10.4%
16	ガラス工事業	107	7.3%
17	塗装工事業	365	24.8%
18	防水工事業	256	17.4%
19	内装仕上工事業	237	16.1%
20	機械器具設置工事業	122	8.3%
21	熱絶縁工事業	93	6.3%
22	電気通信工事業	104	7.1%
23	造園工事業	234	15.9%
24	さく井工事業	19	1.3%
25	建具工事業	134	9.1%
26	水道施設工事業	498	33.9%
27	消防施設工事業	135	9.2%
28	清掃施設工事業	17	1.2%
29	解体工事業	478	32.5%
	全体	1,471	100.0%

F5_完工高(S A)

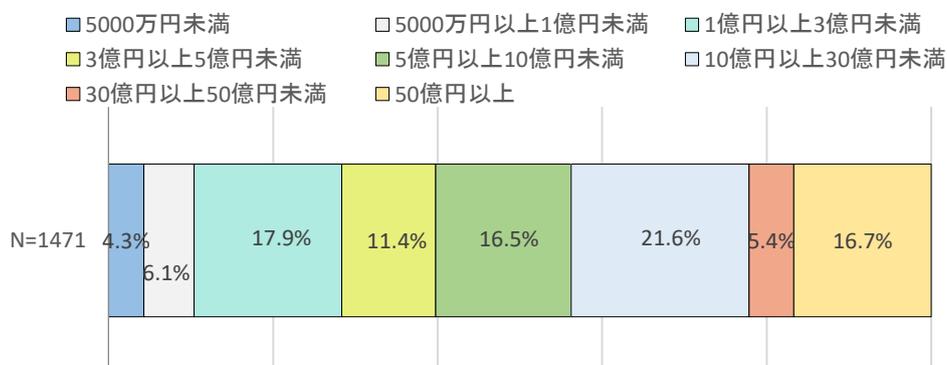


		合計	5000万円未満	5000万円～1億円未満	1億円～3億円未満	3億円～5億円未満	5億円～10億円未満	10億円～30億円未満	30億円～50億円未満	50億円以上
全体		1471 100.0%	63 4.3%	90 6.1%	264 17.9%	168 11.4%	242 16.5%	318 21.6%	80 5.4%	246 16.7%
請負階層	元請工事が主	742 100.0%	19 2.6%	36 4.9%	96 12.9%	68 9.2%	121 16.3%	196 26.4%	51 6.9%	155 20.9%
	下請工事(一次)が主	451 100.0%	26 5.8%	36 8.0%	102 22.6%	61 13.5%	73 16.2%	82 18.2%	19 4.2%	52 11.5%
	下請工事(二次以降)が主	78 100.0%	7 9.0%	7 9.0%	28 35.9%	12 15.4%	9 11.5%	8 10.3%	2 2.6%	5 6.4%
	元請・下請工事はほぼ同程度	200 100.0%	11 5.5%	11 5.5%	38 19.0%	27 13.5%	39 19.5%	32 16.0%	8 4.0%	34 17.0%
公共・民間工事の割合	公共工事がほとんどである	232 100.0%	3 1.3%	11 4.7%	49 21.1%	29 12.5%	55 23.7%	56 24.1%	16 6.9%	13 5.6%
	公共工事が多い	379 100.0%	11 2.9%	27 7.1%	56 14.8%	41 10.8%	60 15.8%	100 26.4%	29 7.7%	55 14.5%
	民間工事がほとんどである	258 100.0%	25 9.7%	18 7.0%	58 22.5%	37 14.3%	28 10.9%	34 13.2%	10 3.9%	48 18.6%
	民間工事が多い	408 100.0%	15 3.7%	22 5.4%	62 15.2%	32 7.8%	66 16.2%	94 23.0%	19 4.7%	98 24.0%
	公共と民間工事はほぼ同程度	194 100.0%	9 4.6%	12 6.2%	39 20.1%	29 14.9%	33 17.0%	34 17.5%	6 3.1%	32 16.5%

F6_従業員数(S A)

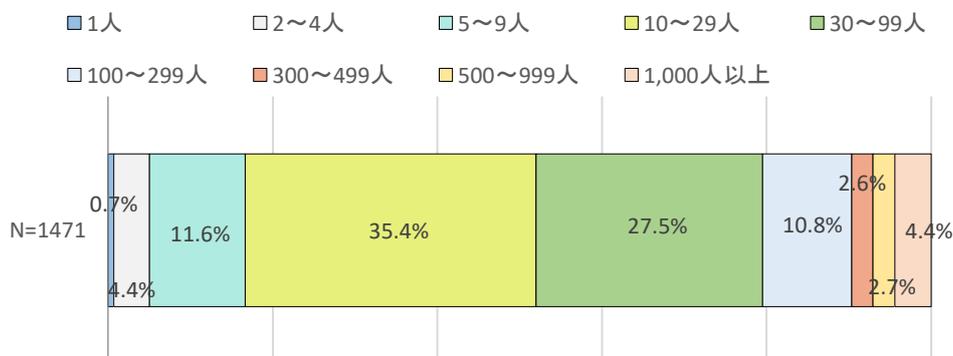


		合計	1人	2~4人	5~9人	10~29人	30~99人	100~299人	300~499人	500~999人	1,000人以上
全体		1471	10	64	171	520	405	159	38	39	65
		100.0%	0.7%	4.4%	11.6%	35.4%	27.5%	10.8%	2.6%	2.7%	4.4%
完工高	5000万円未満	63	5	25	7	16	9	0	0	0	1
		100.0%	7.9%	39.7%	11.1%	25.4%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
	5000万円以上 1億円未満	90	3	22	40	12	12	1	0	0	0
		100.0%	3.3%	24.4%	44.4%	13.3%	13.3%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	1億円以上 3億円未満	264	1	13	94	143	6	3	2	2	0
		100.0%	0.4%	4.9%	35.6%	54.2%	2.3%	1.1%	0.8%	0.8%	0.0%
	3億円以上 5億円未満	168	0	1	25	124	15	3	0	0	0
		100.0%	0.0%	0.6%	14.9%	73.8%	8.9%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%
5億円以上 10億円未満	242	1	3	5	157	73	3	0	0	0	
	100.0%	0.4%	1.2%	2.1%	64.9%	30.2%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
10億円以上 30億円未満	318	0	0	0	68	220	20	1	6	3	
	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%	69.2%	6.3%	0.3%	1.9%	0.9%	
30億円以上 50億円未満	80	0	0	0	0	49	30	1	0	0	
	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61.3%	37.5%	1.3%	0.0%	0.0%	
50億円以上	246	0	0	0	0	21	99	34	31	61	
	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.5%	40.2%	13.8%	12.6%	24.8%	
請負階層	元請工事が主	742	1	14	67	243	244	94	17	19	43
		100.0%	0.1%	1.9%	9.0%	32.7%	32.9%	12.7%	2.3%	2.6%	5.8%
	下請工事 (一次)が主	451	6	35	66	162	111	34	10	13	14
		100.0%	1.3%	7.8%	14.6%	35.9%	24.6%	7.5%	2.2%	2.9%	3.1%
下請工事 (二次以降)が主	78	1	3	20	36	6	9	0	1	2	
	100.0%	1.3%	3.8%	25.6%	46.2%	7.7%	11.5%	0.0%	1.3%	2.6%	
元請・下請工事は ほぼ同程度	200	2	12	18	79	44	22	11	6	6	
	100.0%	1.0%	6.0%	9.0%	39.5%	22.0%	11.0%	5.5%	3.0%	3.0%	
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232	2	4	31	98	78	12	3	3	1
		100.0%	0.9%	1.7%	13.4%	42.2%	33.6%	5.2%	1.3%	1.3%	0.4%
	公共工事が多い	379	0	7	35	137	128	50	8	5	9
		100.0%	0.0%	1.8%	9.2%	36.1%	33.8%	13.2%	2.1%	1.3%	2.4%
	民間工事が ほとんどである	258	4	26	42	84	42	28	8	7	17
	100.0%	1.6%	10.1%	16.3%	32.6%	16.3%	10.9%	3.1%	2.7%	6.6%	
民間工事が多い	408	3	17	37	128	110	45	14	20	34	
	100.0%	0.7%	4.2%	9.1%	31.4%	27.0%	11.0%	3.4%	4.9%	8.3%	
公共と民間工事は ほぼ同程度	194	1	10	26	73	47	24	5	4	4	
	100.0%	0.5%	5.2%	13.4%	37.6%	24.2%	12.4%	2.6%	2.1%	2.1%	

F7_元請・下請工事の割合(SA)

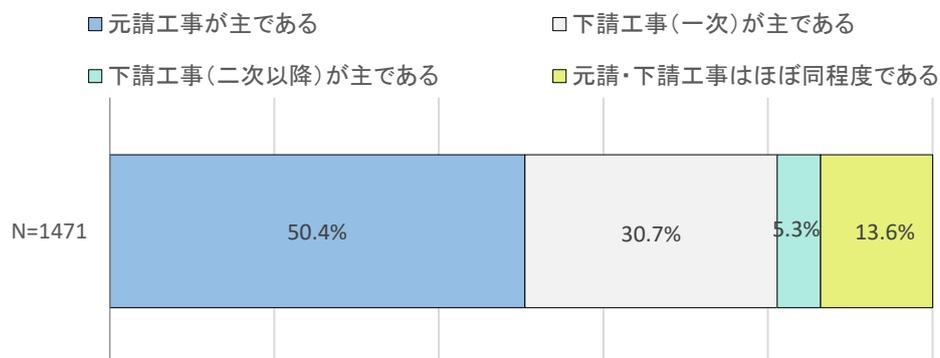


		合計	元請工事が主	下請工事 (一次)が主	下請工事 (二次以降)が 主	元請・下請工事は ほぼ同程度
全体		1471 100.0%	742 50.4%	451 30.7%	78 5.3%	200 13.6%
完工高	5000万円未満	63 100.0%	19 30.2%	26 41.3%	7 11.1%	11 17.5%
	5000万円以上 1億円未満	90 100.0%	36 40.0%	36 40.0%	7 7.8%	11 12.2%
	1億円以上 3億円未満	264 100.0%	96 36.4%	102 38.6%	28 10.6%	38 14.4%
	3億円以上 5億円未満	168 100.0%	68 40.5%	61 36.3%	12 7.1%	27 16.1%
	5億円以上 10億円未満	242 100.0%	121 50.0%	73 30.2%	9 3.7%	39 16.1%
	10億円以上 30億円未満	318 100.0%	196 61.6%	82 25.8%	8 2.5%	32 10.1%
	30億円以上 50億円未満	80 100.0%	51 63.8%	19 23.8%	2 2.5%	8 10.0%
	50億円以上	246 100.0%	155 63.0%	52 21.1%	5 2.0%	34 13.8%
	公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	186 80.2%	26 11.2%	2 0.9%
公共工事が多い		379 100.0%	279 73.6%	55 14.5%	6 1.6%	39 10.3%
民間工事が ほとんどである		258 100.0%	62 24.0%	150 58.1%	20 7.8%	26 10.1%
民間工事が多い		408 100.0%	140 34.3%	175 42.9%	39 9.6%	54 13.2%
公共と民間工事は ほぼ同程度		194 100.0%	75 38.7%	45 23.2%	11 5.7%	63 32.5%

F8_土木・建築工事の割合(S A)

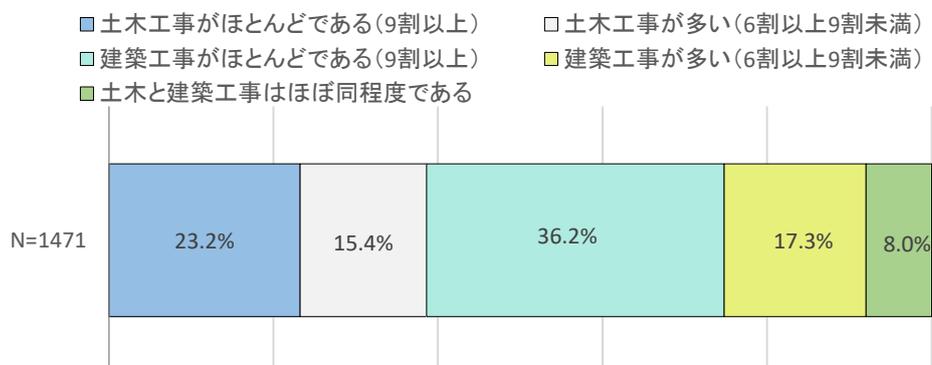


		合計	土木工事がほとんどである(9割以上)	土木工事が多い(6割以上9割未満)	建築工事がほとんどである(9割以上)	建築工事が多い(6割以上9割未満)	土木と建築工事はほぼ同程度
全体		1471 100.0%	342 23.2%	226 15.4%	532 36.2%	254 17.3%	117 8.0%
完工高	5000万円未満	63 100.0%	6 9.5%	5 7.9%	39 61.9%	9 14.3%	4 6.3%
	5000万円以上 1億円未満	90 100.0%	23 25.6%	12 13.3%	33 36.7%	17 18.9%	5 5.6%
	1億円以上 3億円未満	264 100.0%	74 28.0%	33 12.5%	113 42.8%	30 11.4%	14 5.3%
	3億円以上 5億円未満	168 100.0%	47 28.0%	23 13.7%	67 39.9%	22 13.1%	9 5.4%
	5億円以上 10億円未満	242 100.0%	74 30.6%	38 15.7%	73 30.2%	38 15.7%	19 7.9%
	10億円以上 30億円未満	318 100.0%	65 20.4%	68 21.4%	106 33.3%	59 18.6%	20 6.3%
	30億円以上 50億円未満	80 100.0%	20 25.0%	19 23.8%	22 27.5%	9 11.3%	10 12.5%
	50億円以上	246 100.0%	33 13.4%	28 11.4%	79 32.1%	70 28.5%	36 14.6%
請負階層	元請工事が主	742 100.0%	218 29.4%	166 22.4%	137 18.5%	149 20.1%	72 9.7%
	下請工事(一次)が主	451 100.0%	66 14.6%	37 8.2%	261 57.9%	70 15.5%	17 3.8%
	下請工事(二次以降)が主	78 100.0%	3 3.8%	3 3.8%	58 74.4%	11 14.1%	3 3.8%
	元請・下請工事はほぼ同程度	200 100.0%	55 27.5%	20 10.0%	76 38.0%	24 12.0%	25 12.5%
公共・民間工事の割合	公共工事がほとんどである	232 100.0%	175 75.4%	44 19.0%	6 2.6%	6 2.6%	1 0.4%
	公共工事が多い	379 100.0%	109 28.8%	141 37.2%	45 11.9%	42 11.1%	42 11.1%
	民間工事がほとんどである	258 100.0%	10 3.9%	11 4.3%	207 80.2%	25 9.7%	5 1.9%
	民間工事が多い	408 100.0%	21 5.1%	15 3.7%	206 50.5%	142 34.8%	24 5.9%
	公共と民間工事はほぼ同程度	194 100.0%	27 13.9%	15 7.7%	68 35.1%	39 20.1%	45 23.2%

F9_公共・民間工事の割合(S A)

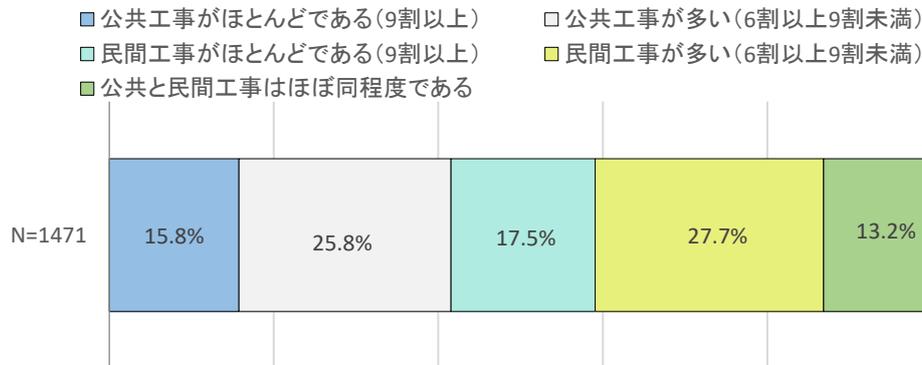


		合計	公共工事がほとんどである(9割以上)	公共工事が多い(6割以上9割未満)	民間工事がほとんどである(9割以上)	民間工事が多い(6割以上9割未満)	公共と民間工事はほぼ同程度
全体		1471 100.0%	232 15.8%	379 25.8%	258 17.5%	408 27.7%	194 13.2%
完工高	5000万円未満	63 100.0%	3 4.8%	11 17.5%	25 39.7%	15 23.8%	9 14.3%
	5000万円以上 1億円未満	90 100.0%	11 12.2%	27 30.0%	18 20.0%	22 24.4%	12 13.3%
	1億円以上 3億円未満	264 100.0%	49 18.6%	56 21.2%	58 22.0%	62 23.5%	39 14.8%
	3億円以上 5億円未満	168 100.0%	29 17.3%	41 24.4%	37 22.0%	32 19.0%	29 17.3%
	5億円以上 10億円未満	242 100.0%	55 22.7%	60 24.8%	28 11.6%	66 27.3%	33 13.6%
	10億円以上 30億円未満	318 100.0%	56 17.6%	100 31.4%	34 10.7%	94 29.6%	34 10.7%
	30億円以上 50億円未満	80 100.0%	16 20.0%	29 36.3%	10 12.5%	19 23.8%	6 7.5%
	50億円以上	246 100.0%	13 5.3%	55 22.4%	48 19.5%	98 39.8%	32 13.0%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	186 25.1%	279 37.6%	62 8.4%	140 18.9%
下請工事(一次)が主		451 100.0%	26 5.8%	55 12.2%	150 33.3%	175 38.8%	45 10.0%
下請工事(二次以降)が主		78 100.0%	2 2.6%	6 7.7%	20 25.6%	39 50.0%	11 14.1%
元請・下請工事はほぼ同程度		200 100.0%	18 9.0%	39 19.5%	26 13.0%	54 27.0%	63 31.5%

F10_請け負った工事の元請企業(S A)

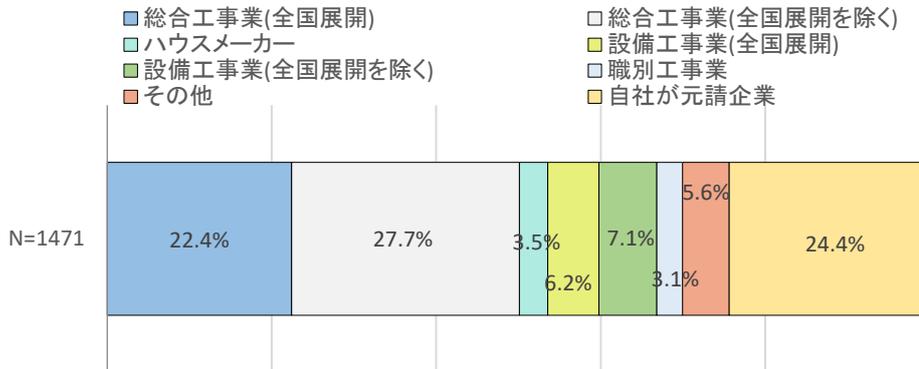


	合計	総合工事業(全国展開)	総合工事業(全国展開を除く)	ハウスメーカー	設備工事業(全国展開)	設備工事業(全国展開を除く)	職別工事業	その他	自社が元請企業	
全体	1471 100.0%	330 22.4%	407 27.7%	51 3.5%	91 6.2%	104 7.1%	46 3.1%	83 5.6%	359 24.4%	
完工高	5000万円未満	63 100.0%	3 4.8%	25 39.7%	7 11.1%	2 3.2%	9 14.3%	5 7.9%	3 4.8%	9 14.3%
	5000万円以上 1億円未満	90 100.0%	9 10.0%	36 40.0%	8 8.9%	5 5.6%	6 6.7%	3 3.3%	6 6.7%	17 18.9%
	1億円以上 3億円未満	264 100.0%	45 17.0%	72 27.3%	15 5.7%	21 8.0%	32 12.1%	13 4.9%	15 5.7%	51 19.3%
	3億円以上 5億円未満	168 100.0%	33 19.6%	51 30.4%	7 4.2%	10 6.0%	14 8.3%	6 3.6%	9 5.4%	38 22.6%
	5億円以上 10億円未満	242 100.0%	54 22.3%	64 26.4%	5 2.1%	16 6.6%	17 7.0%	8 3.3%	17 7.0%	61 25.2%
	10億円以上 30億円未満	318 100.0%	63 19.8%	109 34.3%	5 1.6%	16 5.0%	19 6.0%	9 2.8%	16 5.0%	81 25.5%
	30億円以上 50億円未満	80 100.0%	19 23.8%	19 23.8%	1 1.3%	4 5.0%	4 5.0%	2 2.5%	4 5.0%	27 33.8%
	50億円以上	246 100.0%	104 42.3%	31 12.6%	3 1.2%	17 6.9%	3 1.2%	0 0.0%	13 5.3%	75 30.5%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	102 13.7%	208 28.0%	10 1.3%	14 1.9%	26 3.5%	8 1.1%	47 6.3%
下請工事(一次)が主		451 100.0%	161 35.7%	147 32.6%	28 6.2%	43 9.5%	28 6.2%	28 6.2%	10 2.2%	6 1.3%
下請工事(二次以降)が主		78 100.0%	11 14.1%	6 7.7%	3 3.8%	26 33.3%	26 33.3%	4 5.1%	1 1.3%	1 1.3%
元請・下請工事は ほぼ同程度		200 100.0%	56 28.0%	46 23.0%	10 5.0%	8 4.0%	24 12.0%	6 3.0%	25 12.5%	25 12.5%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	27 11.6%	72 31.0%	2 0.9%	2 0.9%	3 1.3%	5 2.2%	22 9.5%	99 42.7%
	公共工事が多い	379 100.0%	69 18.2%	142 37.5%	2 0.5%	10 2.6%	17 4.5%	9 2.4%	23 6.1%	107 28.2%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	67 26.0%	53 20.5%	27 10.5%	32 12.4%	23 8.9%	10 3.9%	13 5.0%	33 12.8%
	民間工事が多い	408 100.0%	121 29.7%	94 23.0%	14 3.4%	37 9.1%	37 9.1%	17 4.2%	14 3.4%	74 18.1%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	46 23.7%	46 23.7%	6 3.1%	10 5.2%	24 12.4%	5 2.6%	11 5.7%	46 23.7%

F11_特定企業への専属比率(S A)

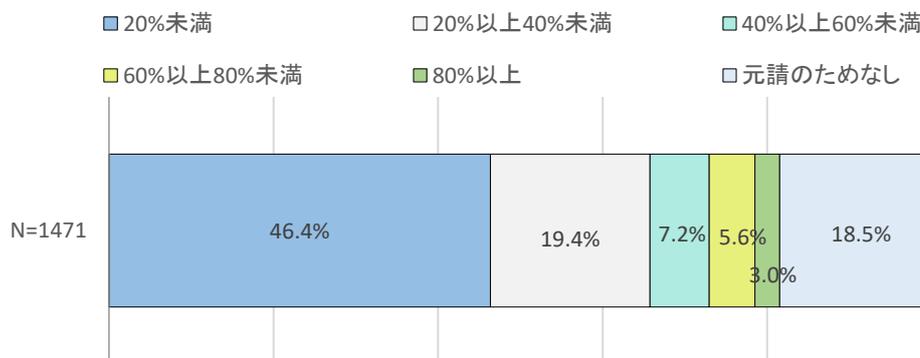

		合計	20%未満	20%以上 40%未満	40%以上 60%未満	60%以上 80%未満	80%以上	元請のため なし
全体		1471 100.0%	682 46.4%	285 19.4%	106 7.2%	82 5.6%	44 3.0%	272 18.5%
完工高	5000万円未満	63 100.0%	23 36.5%	16 25.4%	8 12.7%	7 11.1%	4 6.3%	5 7.9%
	5000万円以上 1億円未満	90 100.0%	37 41.1%	22 24.4%	5 5.6%	6 6.7%	9 10.0%	11 12.2%
	1億円以上 3億円未満	264 100.0%	94 35.6%	71 26.9%	33 12.5%	25 9.5%	8 3.0%	33 12.5%
	3億円以上 5億円未満	168 100.0%	65 38.7%	40 23.8%	25 14.9%	8 4.8%	2 1.2%	28 16.7%
	5億円以上 10億円未満	242 100.0%	116 47.9%	55 22.7%	12 5.0%	15 6.2%	6 2.5%	38 15.7%
	10億円以上 30億円未満	318 100.0%	168 52.8%	52 16.4%	17 5.3%	14 4.4%	7 2.2%	60 18.9%
	30億円以上 50億円未満	80 100.0%	43 53.8%	9 11.3%	3 3.8%	1 1.3%	2 2.5%	22 27.5%
	50億円以上	246 100.0%	136 55.3%	20 8.1%	3 1.2%	6 2.4%	6 2.4%	75 30.5%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	364 49.1%	66 8.9%	20 2.7%	12 1.6%	12 1.6%
下請工事 (一次)が主		451 100.0%	184 40.8%	143 31.7%	44 9.8%	53 11.8%	26 5.8%	1 0.2%
下請工事 (二次以降)が主		78 100.0%	24 30.8%	27 34.6%	12 15.4%	11 14.1%	4 5.1%	0 0.0%
元請・下請工事は ほぼ同程度		200 100.0%	110 55.0%	49 24.5%	30 15.0%	6 3.0%	2 1.0%	3 1.5%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	109 47.0%	26 11.2%	8 3.4%	5 2.2%	6 2.6%	78 33.6%
	公共工事が多い	379 100.0%	200 52.8%	62 16.4%	22 5.8%	13 3.4%	4 1.1%	78 20.6%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	91 35.3%	73 28.3%	29 11.2%	27 10.5%	14 5.4%	24 9.3%
	民間工事が多い	408 100.0%	193 47.3%	86 21.1%	27 6.6%	26 6.4%	15 3.7%	61 15.0%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	89 45.9%	38 19.6%	20 10.3%	11 5.7%	5 2.6%	31 16.0%


F12-1_キャリアアップシステムの登録状況(MA)

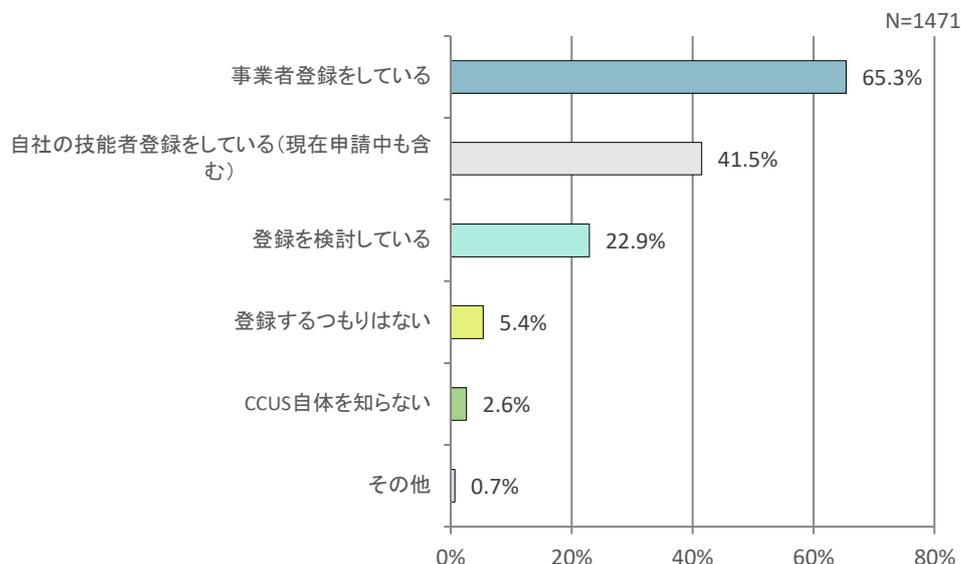

		合計	事業者登録 をしている	技能者登録 をしている (申請中も 含む)	登録を検討 している	登録するつ もりはない	CCUS 自体を 知らない	その他
全体		1471 100.0%	961 65.3%	610 41.5%	337 22.9%	79 5.4%	38 2.6%	10 0.7%
完工高	5000 万円未満	63 100.0%	29 46.0%	21 33.3%	16 25.4%	7 11.1%	7 11.1%	0 0.0%
	5000 万円以上 1 億円未満	90 100.0%	37 41.1%	23 25.6%	25 27.8%	11 12.2%	11 12.2%	0 0.0%
	1 億円以上 3 億円未満	264 100.0%	141 53.4%	94 35.6%	81 30.7%	26 9.8%	10 3.8%	1 0.4%
	3 億円以上 5 億円未満	168 100.0%	106 63.1%	72 42.9%	42 25.0%	8 4.8%	4 2.4%	3 1.8%
	5 億円以上 10 億円未満	242 100.0%	156 64.5%	109 45.0%	67 27.7%	9 3.7%	4 1.7%	0 0.0%
	10 億円以上 30 億円未満	318 100.0%	229 72.0%	161 50.6%	64 20.1%	12 3.8%	2 0.6%	1 0.3%
	30 億円以上 50 億円未満	80 100.0%	57 71.3%	39 48.8%	16 20.0%	2 2.5%	0 0.0%	1 1.3%
	50 億円以上	246 100.0%	206 83.7%	91 37.0%	26 10.6%	4 1.6%	0 0.0%	4 1.6%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	425 57.3%	213 28.7%	234 31.5%	48 6.5%	13 1.8%
下請工事 (一次) が主		451 100.0%	338 74.9%	258 57.2%	59 13.1%	17 3.8%	16 3.5%	2 0.4%
下請工事 (二次以降) が主		78 100.0%	62 79.5%	40 51.3%	6 7.7%	4 5.1%	4 5.1%	0 0.0%
元請・下請工事は ほぼ同程度		200 100.0%	136 68.0%	99 49.5%	38 19.0%	10 5.0%	5 2.5%	2 1.0%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	144 62.1%	84 36.2%	73 31.5%	13 5.6%	0 0.0%	1 0.4%
	公共工事が多い	379 100.0%	238 62.8%	157 41.4%	91 24.0%	21 5.5%	6 1.6%	2 0.5%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	157 60.9%	100 38.8%	54 20.9%	24 9.3%	15 5.8%	4 1.6%
	民間工事が多い	408 100.0%	287 70.3%	184 45.1%	79 19.4%	13 3.2%	13 3.2%	2 0.5%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	135 69.6%	85 43.8%	40 20.6%	8 4.1%	4 2.1%	1 0.5%

民間工事全般における工期設定の状況

問 1-1_注文者から提案された工期は適切だったか(S A)

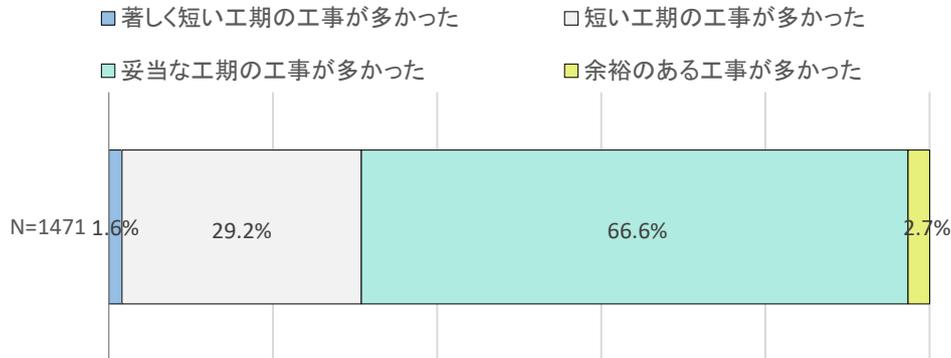


		合計	著しく短い工期の工事が多かった	短い工期の工事が多かった	妥当な工期の工事が多かった	余裕のある工事が多かった
全体		1471 100.0%	24 1.6%	429 29.2%	979 66.6%	39 2.7%
完工高	5000万円未満	63 100.0%	1 1.6%	20 31.7%	38 60.3%	4 6.3%
	5000万円以上 1億円未満	90 100.0%	1 1.1%	16 17.8%	68 75.6%	5 5.6%
	1億円以上 3億円未満	264 100.0%	10 3.8%	67 25.4%	179 67.8%	8 3.0%
	3億円以上 5億円未満	168 100.0%	2 1.2%	50 29.8%	108 64.3%	8 4.8%
	5億円以上 10億円未満	242 100.0%	5 2.1%	56 23.1%	173 71.5%	8 3.3%
	10億円以上 30億円未満	318 100.0%	1 0.3%	94 29.6%	217 68.2%	6 1.9%
	30億円以上 50億円未満	80 100.0%	1 1.3%	23 28.8%	56 70.0%	0 0.0%
	50億円以上	246 100.0%	3 1.2%	103 41.9%	140 56.9%	0 0.0%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	5 0.7%	192 25.9%	519 69.9%
下請工事 (一次)が主		451 100.0%	12 2.7%	154 34.1%	279 61.9%	6 1.3%
下請工事 (二次以降)が主		78 100.0%	6 7.7%	29 37.2%	42 53.8%	1 1.3%
元請・下請工事は ほぼ同程度		200 100.0%	1 0.5%	54 27.0%	139 69.5%	6 3.0%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	1 0.4%	33 14.2%	184 79.3%	14 6.0%
	公共工事が多い	379 100.0%	5 1.3%	109 28.8%	255 67.3%	10 2.6%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	6 2.3%	78 30.2%	170 65.9%	4 1.6%
	民間工事が多い	408 100.0%	8 2.0%	149 36.5%	244 59.8%	7 1.7%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	4 2.1%	60 30.9%	126 64.9%	4 2.1%

問 1-2_工期の設定はどのように行っているか(S A)


- 注文者の意向を優先し協議は依頼しないことが多い
- 注文者の意向が優先され、協議は依頼しても応じてもらえないことが多い
- 注文者と協議を行うが、受注者の要望は受け入れられないことが多い
- 注文者と協議を行い、受注者の要望も受け入れられることは少なくない
- 注文者と協議を行い、受注者の要望も受け入れられることが多い

N=1471




		合計	協議は依頼しないことが多い	協議は依頼しても応じてもらえないことが多い	協議を行うが、要望は受け入れられないことが多い	協議を行い、要望も受け入れられることは少なくない	協議を行い、要望も受け入れられることが多い
全体		1471 100.0%	289 19.6%	165 11.2%	221 15.0%	433 29.4%	363 24.7%
完工高	5000万円未満	63 100.0%	12 19.0%	5 7.9%	9 14.3%	17 27.0%	20 31.7%
	5000万円以上 1億円未満	90 100.0%	15 16.7%	7 7.8%	10 11.1%	24 26.7%	34 37.8%
	1億円以上 3億円未満	264 100.0%	49 18.6%	30 11.4%	36 13.6%	71 26.9%	78 29.5%
	3億円以上 5億円未満	168 100.0%	39 23.2%	16 9.5%	21 12.5%	41 24.4%	51 30.4%
	5億円以上 10億円未満	242 100.0%	54 22.3%	23 9.5%	28 11.6%	71 29.3%	66 27.3%
	10億円以上 30億円未満	318 100.0%	62 19.5%	40 12.6%	42 13.2%	110 34.6%	64 20.1%
	30億円以上 50億円未満	80 100.0%	9 11.3%	9 11.3%	15 18.8%	22 27.5%	25 31.3%
	50億円以上	246 100.0%	49 19.9%	35 14.2%	60 24.4%	77 31.3%	25 10.2%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	125 16.8%	63 8.5%	98 13.2%	224 30.2%
下請工事(一次)が主		451 100.0%	94 20.8%	69 15.3%	84 18.6%	125 27.7%	79 17.5%
下請工事(二次以降)が主		78 100.0%	23 29.5%	17 21.8%	14 17.9%	19 24.4%	5 6.4%
元請・下請工事は ほぼ同程度		200 100.0%	47 23.5%	16 8.0%	25 12.5%	65 32.5%	47 23.5%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	52 22.4%	10 4.3%	10 4.3%	54 23.3%	106 45.7%
	公共工事が多い	379 100.0%	69 18.2%	41 10.8%	52 13.7%	118 31.1%	99 26.1%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	42 16.3%	38 14.7%	35 13.6%	86 33.3%	57 22.1%
	民間工事が多い	408 100.0%	91 22.3%	49 12.0%	89 21.8%	124 30.4%	55 13.5%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	35 18.0%	27 13.9%	35 18.0%	51 26.3%	46 23.7%

問 1-3_協議後の工期の長さは適切だったか(S A)

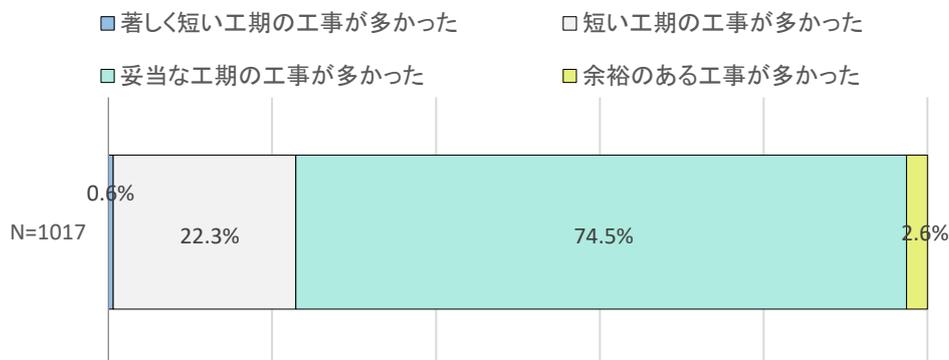

		合計	著しく短い工期の工事が多かった	短い工期の工事が多かった	妥当な工期の工事が多かった	余裕のある工事が多かった
全体		1017 100.0%	6 0.6%	227 22.3%	758 74.5%	26 2.6%
完工高	5000万円未満	46 100.0%	0 0.0%	9 19.6%	34 73.9%	3 6.5%
	5000万円以上 1億円未満	68 100.0%	2 2.9%	5 7.4%	58 85.3%	3 4.4%
	1億円以上 3億円未満	185 100.0%	2 1.1%	40 21.6%	137 74.1%	6 3.2%
	3億円以上 5億円未満	113 100.0%	0 0.0%	29 25.7%	79 69.9%	5 4.4%
	5億円以上 10億円未満	165 100.0%	2 1.2%	30 18.2%	129 78.2%	4 2.4%
	10億円以上 30億円未満	216 100.0%	0 0.0%	46 21.3%	166 76.9%	4 1.9%
	30億円以上 50億円未満	62 100.0%	0 0.0%	13 21.0%	48 77.4%	1 1.6%
	50億円以上	162 100.0%	0 0.0%	55 34.0%	107 66.0%	0 0.0%
	請負階層	元請工事が主	554 100.0%	1 0.2%	99 17.9%	434 78.3%
下請工事 (一次)が主		288 100.0%	3 1.0%	84 29.2%	199 69.1%	2 0.7%
下請工事 (二次以降)が主		38 100.0%	2 5.3%	15 39.5%	20 52.6%	1 2.6%
元請・下請工事は ほぼ同程度		137 100.0%	0 0.0%	29 21.2%	105 76.6%	3 2.2%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	170 100.0%	0 0.0%	12 7.1%	150 88.2%	8 4.7%
	公共工事が多い	269 100.0%	2 0.7%	47 17.5%	212 78.8%	8 3.0%
	民間工事が ほとんどである	178 100.0%	0 0.0%	41 23.0%	135 75.8%	2 1.1%
	民間工事が多い	268 100.0%	3 1.1%	85 31.7%	176 65.7%	4 1.5%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	132 100.0%	1 0.8%	42 31.8%	85 64.4%	4 3.0%

問 1-4_工期不足に対応するために実施したこと(MA)

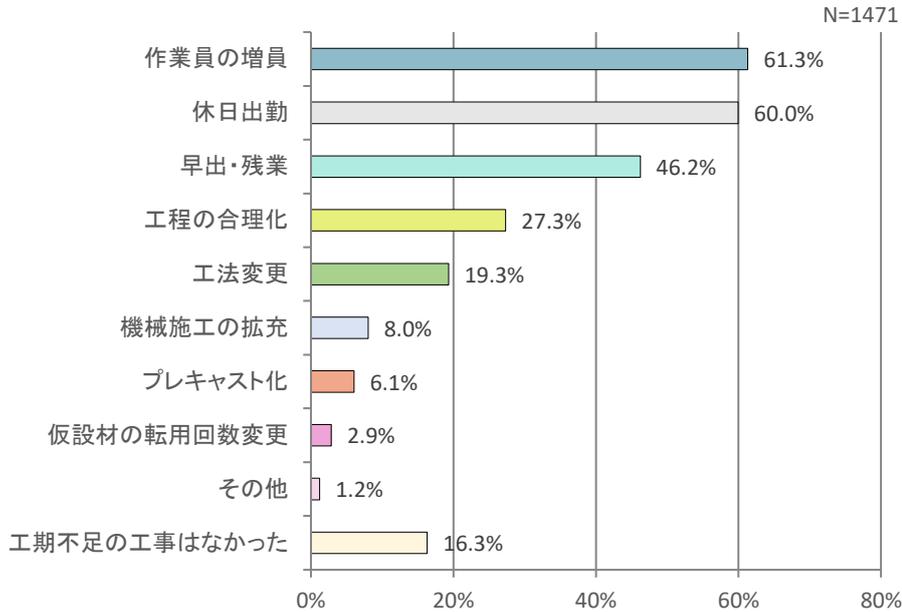

	合計	休日出勤	作業員の増員	早出・残業	仮設材の転用回数変更	工法変更	工程の合理化	機械施工の拡充	プレキャスト化	その他	工期不足の工事はなかった	
全体	1471	882	902	680	42	284	402	118	89	18	240	
	100.0%	60.0%	61.3%	46.2%	2.9%	19.3%	27.3%	8.0%	6.1%	1.2%	16.3%	
完工高	5000万円未満	63	31	27	22	0	7	15	4	1	0	16
		100.0%	49.2%	42.9%	34.9%	0.0%	11.1%	23.8%	6.3%	1.6%	0.0%	25.4%
	5000万円以上 1億円未満	90	44	43	32	1	11	19	6	1	0	20
		100.0%	48.9%	47.8%	35.6%	1.1%	12.2%	21.1%	6.7%	1.1%	0.0%	22.2%
	1億円以上 3億円未満	264	137	148	105	2	35	52	19	8	3	52
		100.0%	51.9%	56.1%	39.8%	0.8%	13.3%	19.7%	7.2%	3.0%	1.1%	19.7%
	3億円以上 5億円未満	168	96	113	72	2	21	32	9	4	0	32
		100.0%	57.1%	67.3%	42.9%	1.2%	12.5%	19.0%	5.4%	2.4%	0.0%	19.0%
	5億円以上 10億円未満	242	134	134	106	7	36	53	18	7	3	46
	100.0%	55.4%	55.4%	43.8%	2.9%	14.9%	21.9%	7.4%	2.9%	1.2%	19.0%	
10億円以上 30億円未満	318	210	198	156	7	65	83	22	17	1	49	
	100.0%	66.0%	62.3%	49.1%	2.2%	20.4%	26.1%	6.9%	5.3%	0.3%	15.4%	
30億円以上 50億円未満	80	43	48	35	5	8	29	3	8	2	13	
	100.0%	53.8%	60.0%	43.8%	6.3%	10.0%	36.3%	3.8%	10.0%	2.5%	16.3%	
50億円以上	246	187	191	152	18	101	119	37	43	9	12	
	100.0%	76.0%	77.6%	61.8%	7.3%	41.1%	48.4%	15.0%	17.5%	3.7%	4.9%	
請負階層	元請工事が主	742	428	403	295	22	141	223	60	48	8	164
		100.0%	57.7%	54.3%	39.8%	3.0%	19.0%	30.1%	8.1%	6.5%	1.1%	22.1%
	下請工事 (一次)が主	451	280	307	233	15	81	104	36	26	5	47
		100.0%	62.1%	68.1%	51.7%	3.3%	18.0%	23.1%	8.0%	5.8%	1.1%	10.4%
下請工事 (二次以降)が主	78	50	56	55	0	10	15	1	2	3	4	
	100.0%	64.1%	71.8%	70.5%	0.0%	12.8%	19.2%	1.3%	2.6%	3.8%	5.1%	
元請・下請工事は ほぼ同程度	200	124	136	97	5	52	60	21	13	2	25	
	100.0%	62.0%	68.0%	48.5%	2.5%	26.0%	30.0%	10.5%	6.5%	1.0%	12.5%	
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232	96	96	66	6	24	36	11	10	5	80
		100.0%	41.4%	41.4%	28.4%	2.6%	10.3%	15.5%	4.7%	4.3%	2.2%	34.5%
	公共工事が多い	379	223	209	160	7	62	87	30	19	0	80
		100.0%	58.8%	55.1%	42.2%	1.8%	16.4%	23.0%	7.9%	5.0%	0.0%	21.1%
	民間工事が ほとんどである	258	157	178	139	9	52	72	19	19	3	30
	100.0%	60.9%	69.0%	53.9%	3.5%	20.2%	27.9%	7.4%	7.4%	1.2%	11.6%	
民間工事が多い	408	279	289	218	14	108	141	39	34	8	32	
	100.0%	68.4%	70.8%	53.4%	3.4%	26.5%	34.6%	9.6%	8.3%	2.0%	7.8%	
公共と民間工事は ほぼ同程度	194	127	130	97	6	38	66	19	7	2	18	
	100.0%	65.5%	67.0%	50.0%	3.1%	19.6%	34.0%	9.8%	3.6%	1.0%	9.3%	

「その他」の記述から

工期延期[10～29 人／元請工事が主である]

外注に発注[10～29 人／下請工事（一次）が主である]

情報共有による対応の迅速化[10～29 人／下請工事（二次以降）が主である]

製作外注[10～29 人／下請工事（二次以降）が主である]

同業他社からの応援[30～99 人／下請工事（一次）が主である]

仕様変更[30～99 人／下請工事（一次）が主である]

荷揚工登用[30～99 人／下請工事（一次）が主である]

工期延長申入れ[100～299 人／元請工事が主である]

材料納期[100～299 人／元請工事が主である]

下請け会社との調整

工場製品納期の調整[100～299 人／元請工事が主である]

変更協議[100～299 人／元請工事が主である]

型枠早期解体特定支保工クイックサポート等特殊工法の採用[100～299 人／元請工事が主である]

荒天時の振替[100～299 人／元請・下請工事はほぼ同程度である]


材料の変更[500～999 人／元請工事が主である]

設計施工一貫方式におけるフロントローディング[1,000 人以上／元請工事が主である]

仕様変更[1,000 人以上／下請工事（一次）が主である]


先行施工、プレハブ化[1,000 人以上／元請・下請工事はほぼ同程度である]

問 1-5_契約において工程に影響を与える条件が適切に明示されていたか(S A)

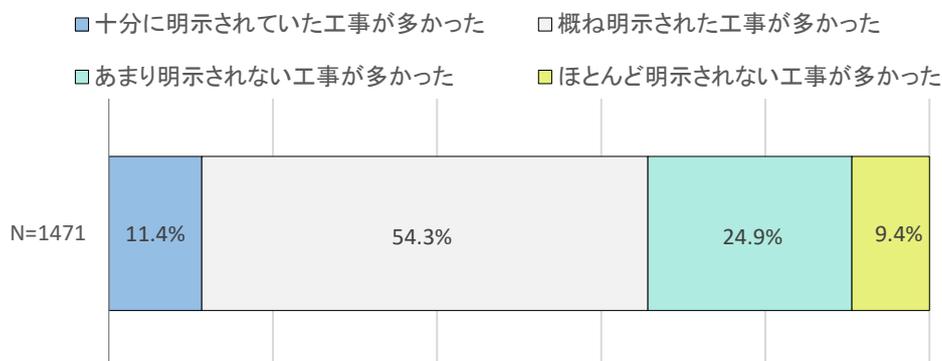


		合計	十分に明示されていた工事が多かった	概ね明示された工事が多かった	あまり明示されない工事が多かった	ほとんど明示されない工事が多かった
全体		1471 100.0%	167 11.4%	799 54.3%	366 24.9%	139 9.4%
完工高	5000万円未満	63 100.0%	14 22.2%	33 52.4%	9 14.3%	7 11.1%
	5000万円以上 1億円未満	90 100.0%	8 8.9%	45 50.0%	26 28.9%	11 12.2%
	1億円以上 3億円未満	264 100.0%	26 9.8%	143 54.2%	63 23.9%	32 12.1%
	3億円以上 5億円未満	168 100.0%	30 17.9%	81 48.2%	36 21.4%	21 12.5%
	5億円以上 10億円未満	242 100.0%	34 14.0%	133 55.0%	55 22.7%	20 8.3%
	10億円以上 30億円未満	318 100.0%	34 10.7%	183 57.5%	75 23.6%	26 8.2%
	30億円以上 50億円未満	80 100.0%	5 6.3%	46 57.5%	24 30.0%	5 6.3%
	50億円以上	246 100.0%	16 6.5%	135 54.9%	78 31.7%	17 6.9%
請負階層	元請工事が主	742 100.0%	91 12.3%	431 58.1%	168 22.6%	52 7.0%
	下請工事 (一次)が主	451 100.0%	50 11.1%	221 49.0%	122 27.1%	58 12.9%
	下請工事 (二次以降)が主	78 100.0%	6 7.7%	26 33.3%	25 32.1%	21 26.9%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	200 100.0%	20 10.0%	121 60.5%	51 25.5%	8 4.0%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	46 19.8%	128 55.2%	41 17.7%	17 7.3%
	公共工事が多い	379 100.0%	43 11.3%	226 59.6%	87 23.0%	23 6.1%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	32 12.4%	133 51.6%	60 23.3%	33 12.8%
	民間工事が多い	408 100.0%	32 7.8%	216 52.9%	117 28.7%	43 10.5%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	14 7.2%	96 49.5%	61 31.4%	23 11.9%

問 1-6_工事に関わる就業者の休日確保に影響すると考えるもの(MA)

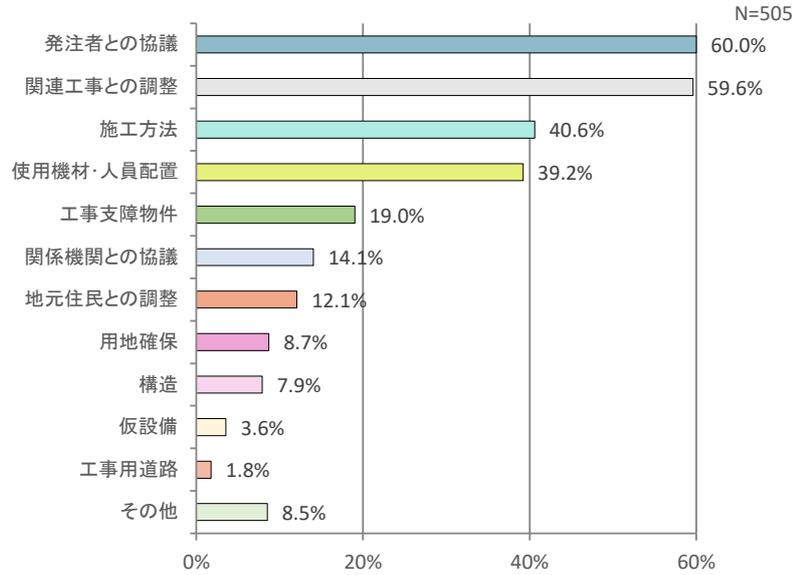


		合計	関連工事との調整	発注者との協議	関係機関との協議	地元住民との調整	施工方法	構造	使用機材・人員配置	仮設備	工用道路	用地確保	工事支障物件	その他
全体		505	301	303	71	61	205	40	198	18	9	44	96	43
		100.0%	59.6%	60.0%	14.1%	12.1%	40.6%	7.9%	39.2%	3.6%	1.8%	8.7%	19.0%	8.5%
完工高	5000万円未満	16	9	9	1	1	5	2	6	0	0	1	2	2
		100.0%	56.3%	56.3%	6.3%	6.3%	31.3%	12.5%	37.5%	0.0%	0.0%	6.3%	12.5%	12.5%
	5000万円以上 1億円未満	37	24	21	7	6	12	2	15	0	1	1	6	5
		100.0%	64.9%	56.8%	18.9%	16.2%	32.4%	5.4%	40.5%	0.0%	2.7%	2.7%	16.2%	13.5%
	1億円以上 3億円未満	95	59	63	9	11	31	7	38	3	0	10	14	13
		100.0%	62.1%	66.3%	9.5%	11.6%	32.6%	7.4%	40.0%	3.2%	0.0%	10.5%	14.7%	13.7%
	3億円以上 5億円未満	57	38	35	9	3	27	1	26	0	2	5	9	6
		100.0%	66.7%	61.4%	15.8%	5.3%	47.4%	1.8%	45.6%	0.0%	3.5%	8.8%	15.8%	10.5%
	5億円以上 10億円未満	75	41	42	14	11	32	5	22	3	1	4	14	5
		100.0%	54.7%	56.0%	18.7%	14.7%	42.7%	6.7%	29.3%	4.0%	1.3%	5.3%	18.7%	6.7%
10億円以上 30億円未満	101	57	61	15	10	44	14	40	4	0	10	19	7	
	100.0%	56.4%	60.4%	14.9%	9.9%	43.6%	13.9%	39.6%	4.0%	0.0%	9.9%	18.8%	6.9%	
30億円以上 50億円未満	29	14	21	3	2	17	0	16	0	0	2	5	2	
	100.0%	48.3%	72.4%	10.3%	6.9%	58.6%	0.0%	55.2%	0.0%	0.0%	6.9%	17.2%	6.9%	
50億円以上	95	59	51	13	17	37	9	35	8	5	11	27	3	
	100.0%	62.1%	53.7%	13.7%	17.9%	38.9%	9.5%	36.8%	8.4%	5.3%	11.6%	28.4%	3.2%	
請負階層	元請工事が主	220	112	124	44	36	83	19	82	7	6	21	57	15
		100.0%	50.9%	56.4%	20.0%	16.4%	37.7%	8.6%	37.3%	3.2%	2.7%	9.5%	25.9%	6.8%
	下請工事(一次)が主	180	107	116	20	14	81	12	79	7	2	18	22	21
		100.0%	59.4%	64.4%	11.1%	7.8%	45.0%	6.7%	43.9%	3.9%	1.1%	10.0%	12.2%	11.7%
下請工事(二次以降)が主	46	37	26	2	2	25	6	12	1	0	2	4	2	
	100.0%	80.4%	56.5%	4.3%	4.3%	54.3%	13.0%	26.1%	2.2%	0.0%	4.3%	8.7%	4.3%	
元請・下請工事はほぼ同程度	59	45	37	5	9	16	3	25	3	1	3	13	5	
	100.0%	76.3%	62.7%	8.5%	15.3%	27.1%	5.1%	42.4%	5.1%	1.7%	5.1%	22.0%	8.5%	
公共・民間工事の割合	公共工事がほとんどである	58	29	28	12	12	25	6	20	3	0	4	20	3
		100.0%	50.0%	48.3%	20.7%	20.7%	43.1%	10.3%	34.5%	5.2%	0.0%	6.9%	34.5%	5.2%
	公共工事が多い	110	59	68	21	15	37	9	44	4	2	12	22	9
		100.0%	53.6%	61.8%	19.1%	13.6%	33.6%	8.2%	40.0%	3.6%	1.8%	10.9%	20.0%	8.2%
	民間工事がほとんどである	93	56	67	6	10	37	6	36	3	0	5	11	10
	100.0%	60.2%	72.0%	6.5%	10.8%	39.8%	6.5%	38.7%	3.2%	0.0%	5.4%	11.8%	10.8%	
民間工事が多い	160	104	86	20	13	74	14	67	6	4	15	26	14	
	100.0%	65.0%	53.8%	12.5%	8.1%	46.3%	8.8%	41.9%	3.8%	2.5%	9.4%	16.3%	8.8%	
公共と民間工事はほぼ同程度	84	53	54	12	11	32	5	31	2	3	8	17	7	
	100.0%	63.1%	64.3%	14.3%	13.1%	38.1%	6.0%	36.9%	2.4%	3.6%	9.5%	20.2%	8.3%	

問 1-8_平均的な休日の取得状況(S A)

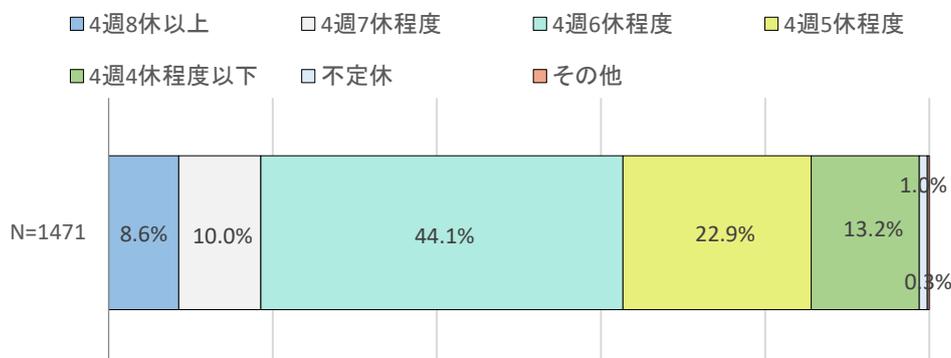

		合計	4週8休以上	4週7休程度	4週6休程度	4週5休程度	4週4休程度以下	不定休	その他
全体		1471	126	147	649	337	194	14	4
		100.0%	8.6%	10.0%	44.1%	22.9%	13.2%	1.0%	0.3%
完工高	5000万円未満	63	6	7	26	13	6	5	0
		100.0%	9.5%	11.1%	41.3%	20.6%	9.5%	7.9%	0.0%
	5000万円以上 1億円未満	90	12	9	39	18	10	1	1
		100.0%	13.3%	10.0%	43.3%	20.0%	11.1%	1.1%	1.1%
	1億円以上 3億円未満	264	17	29	105	75	33	4	1
		100.0%	6.4%	11.0%	39.8%	28.4%	12.5%	1.5%	0.4%
	3億円以上 5億円未満	168	17	18	84	32	16	1	0
		100.0%	10.1%	10.7%	50.0%	19.0%	9.5%	0.6%	0.0%
5億円以上 10億円未満	242	25	30	116	49	21	0	1	
	100.0%	10.3%	12.4%	47.9%	20.2%	8.7%	0.0%	0.4%	
10億円以上 30億円未満	318	22	30	142	74	47	3	0	
	100.0%	6.9%	9.4%	44.7%	23.3%	14.8%	0.9%	0.0%	
30億円以上 50億円未満	80	10	6	31	16	16	0	1	
	100.0%	12.5%	7.5%	38.8%	20.0%	20.0%	0.0%	1.3%	
50億円以上	246	17	18	106	60	45	0	0	
	100.0%	6.9%	7.3%	43.1%	24.4%	18.3%	0.0%	0.0%	
請負階層	元請工事が主	742	80	85	364	127	80	3	3
		100.0%	10.8%	11.5%	49.1%	17.1%	10.8%	0.4%	0.4%
	下請工事 (一次)が主	451	22	37	161	143	78	9	1
		100.0%	4.9%	8.2%	35.7%	31.7%	17.3%	2.0%	0.2%
下請工事 (二次以降)が主	78	3	4	27	24	20	0	0	
	100.0%	3.8%	5.1%	34.6%	30.8%	25.6%	0.0%	0.0%	
元請・下請工事は ほぼ同程度	200	21	21	97	43	16	2	0	
	100.0%	10.5%	10.5%	48.5%	21.5%	8.0%	1.0%	0.0%	
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232	42	38	113	21	15	1	2
		100.0%	18.1%	16.4%	48.7%	9.1%	6.5%	0.4%	0.9%
	公共工事が多い	379	36	39	191	66	43	3	1
		100.0%	9.5%	10.3%	50.4%	17.4%	11.3%	0.8%	0.3%
	民間工事が ほとんどである	258	13	18	99	78	42	7	1
	100.0%	5.0%	7.0%	38.4%	30.2%	16.3%	2.7%	0.4%	
民間工事が多い	408	23	30	165	125	63	2	0	
	100.0%	5.6%	7.4%	40.4%	30.6%	15.4%	0.5%	0.0%	
公共と民間工事は ほぼ同程度	194	12	22	81	47	31	1	0	
	100.0%	6.2%	11.3%	41.8%	24.2%	16.0%	0.5%	0.0%	

問 1-9_工期変更が行われたり、一時中止となった工事はあったか(M A)

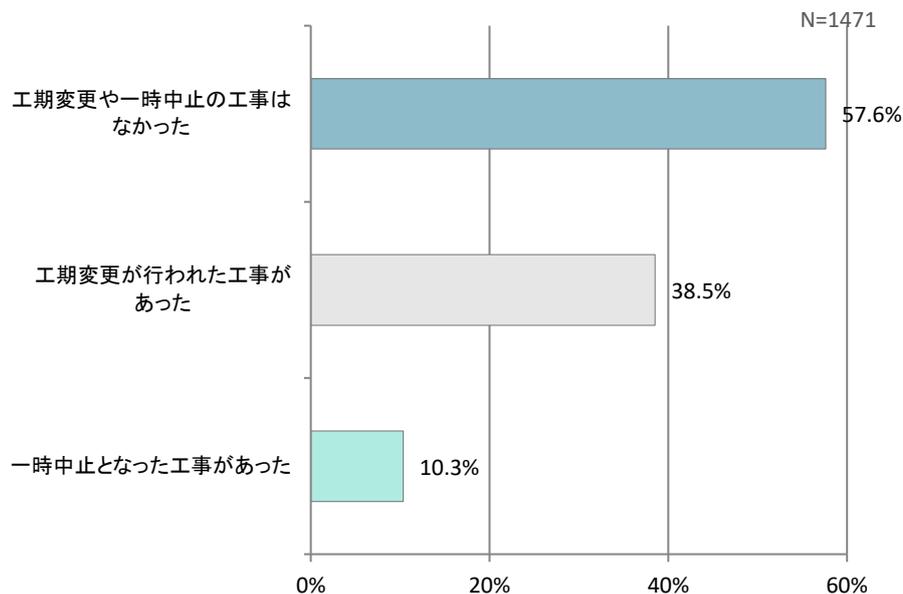


		合計	工期変更が行われた工事があった	一時中止となった工事があった	工期変更や一時中止の工事はなかった
全体		1471 100.0%	567 38.5%	152 10.3%	848 57.6%
完工高	5000万円未満	63 100.0%	20 31.7%	1 1.6%	43 68.3%
	5000万円以上 1億円未満	90 100.0%	29 32.2%	9 10.0%	58 64.4%
	1億円以上 3億円未満	264 100.0%	93 35.2%	29 11.0%	162 61.4%
	3億円以上 5億円未満	168 100.0%	49 29.2%	14 8.3%	109 64.9%
	5億円以上 10億円未満	242 100.0%	84 34.7%	16 6.6%	149 61.6%
	10億円以上 30億円未満	318 100.0%	118 37.1%	38 11.9%	187 58.8%
	30億円以上 50億円未満	80 100.0%	38 47.5%	6 7.5%	41 51.3%
	50億円以上	246 100.0%	136 55.3%	39 15.9%	99 40.2%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	249 33.6%	52 7.0%
下請工事 (一次)が主		451 100.0%	200 44.3%	59 13.1%	231 51.2%
下請工事 (二次以降)が主		78 100.0%	33 42.3%	15 19.2%	39 50.0%
元請・下請工事は ほぼ同程度		200 100.0%	85 42.5%	26 13.0%	106 53.0%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	68 29.3%	13 5.6%	160 69.0%
	公共工事が多い	379 100.0%	121 31.9%	32 8.4%	246 64.9%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	125 48.4%	38 14.7%	122 47.3%
	民間工事が多い	408 100.0%	171 41.9%	47 11.5%	220 53.9%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	82 42.3%	22 11.3%	100 51.5%

工期変更がなかった個別の民間工事の概要


(※ 問2・問3の回答を統合して集計)

問2・3-3_請負階層(SA)

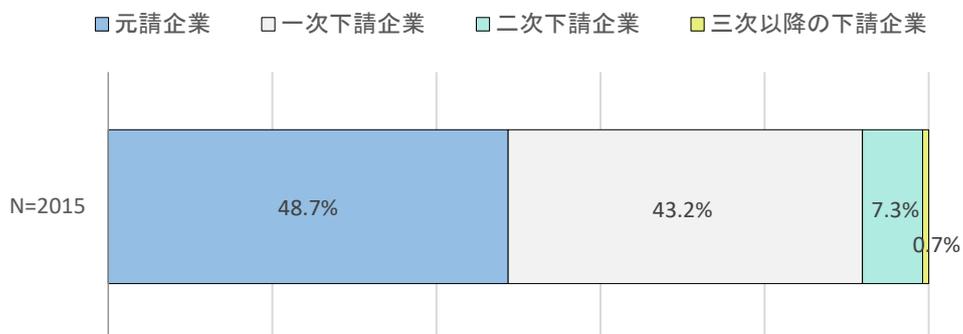


		合計	元請企業	一次下請企業	二次下請企業	三次以降の下請企業
全体		2,015 100.0%	982 48.7%	870 43.2%	148 7.3%	15 0.7%
完工高	5000万円未満	80 100.0%	20 25.0%	47 58.8%	10 12.5%	3 3.8%
	5000万円以上 1億円未満	119 100.0%	48 40.3%	58 48.7%	12 10.1%	1 0.8%
	1億円以上 3億円未満	326 100.0%	107 32.8%	170 52.1%	44 13.5%	5 1.5%
	3億円以上 5億円未満	215 100.0%	90 41.9%	98 45.6%	27 12.6%	0 0.0%
	5億円以上 10億円未満	328 100.0%	156 47.6%	146 44.5%	26 7.9%	0 0.0%
	10億円以上 30億円未満	430 100.0%	242 56.3%	169 39.3%	16 3.7%	3 0.7%
	30億円以上 50億円未満	110 100.0%	66 60.0%	39 35.5%	4 3.6%	1 0.9%
	50億円以上	407 100.0%	253 62.2%	143 35.1%	9 2.2%	2 0.5%
	請負階層	元請工事が主	1040 100.0%	811 78.0%	211 20.3%	18 1.7%
下請工事 (一次)が主		593 100.0%	60 10.1%	488 82.3%	40 6.7%	5 0.8%
下請工事 (二次以降)が主		108 100.0%	2 1.9%	26 24.1%	70 64.8%	10 9.3%
元請・下請工事は ほぼ同程度		274 100.0%	109 39.8%	145 52.9%	20 7.3%	0 0.0%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	277 100.0%	185 66.8%	80 28.9%	12 4.3%	0 0.0%
	公共工事が多い	522 100.0%	311 59.6%	184 35.2%	26 5.0%	1 0.2%
	民間工事が ほとんどである	351 100.0%	108 30.8%	207 59.0%	33 9.4%	3 0.9%
	民間工事が多い	610 100.0%	254 41.6%	289 47.4%	56 9.2%	11 1.8%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	255 100.0%	124 48.6%	110 43.1%	21 8.2%	0 0.0%

問 2・3-4_工事の種類(S A)

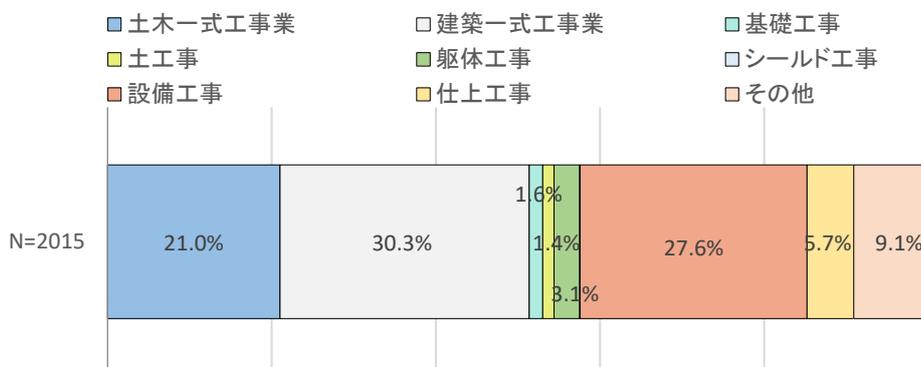


		合計	土木一式工事業	建築一式工事業	基礎工事	土工事	躯体工事	シールド工事	設備工事	仕上工事	その他
全体		2,015 100.0%	424 21.0%	611 30.3%	33 1.6%	28 1.4%	63 3.1%	1 0.0%	557 27.6%	114 5.7%	184 9.1%
完工高	5000万円未満	80 100.0%	7 8.8%	25 31.3%	2 2.5%	0 0.0%	3 3.8%	0 0.0%	24 30.0%	11 13.8%	8 10.0%
	5000万円以上 1億円未満	119 100.0%	25 21.0%	28 23.5%	4 3.4%	0 0.0%	3 2.5%	0 0.0%	34 28.6%	8 6.7%	17 14.3%
	1億円以上 3億円未満	326 100.0%	79 24.2%	37 11.3%	4 1.2%	10 3.1%	20 6.1%	0 0.0%	109 33.4%	29 8.9%	38 11.7%
	3億円以上 5億円未満	215 100.0%	56 26.0%	40 18.6%	1 0.5%	4 1.9%	11 5.1%	1 0.5%	56 26.0%	25 11.6%	21 9.8%
	5億円以上 10億円未満	328 100.0%	93 28.4%	69 21.0%	3 0.9%	5 1.5%	10 3.0%	0 0.0%	90 27.4%	23 7.0%	35 10.7%
	10億円以上 30億円未満	430 100.0%	77 17.9%	172 40.0%	5 1.2%	5 1.2%	13 3.0%	0 0.0%	111 25.8%	12 2.8%	35 8.1%
	30億円以上 50億円未満	110 100.0%	21 19.1%	56 50.9%	3 2.7%	1 0.9%	2 1.8%	0 0.0%	19 17.3%	4 3.6%	4 3.6%
	50億円以上	407 100.0%	66 16.2%	184 45.2%	11 2.7%	3 0.7%	1 0.2%	0 0.0%	114 28.0%	2 0.5%	26 6.4%
請負階層	元請工事が主	1040 100.0%	302 29.0%	495 47.6%	5 0.5%	10 1.0%	6 0.6%	1 0.1%	138 13.3%	6 0.6%	77 7.4%
	下請工事 (一次)が主	593 100.0%	62 10.5%	74 12.5%	24 4.0%	14 2.4%	53 8.9%	0 0.0%	205 34.6%	84 14.2%	77 13.0%
	下請工事 (二次以降)が主	108 100.0%	5 4.6%	6 5.6%	3 2.8%	0 0.0%	4 3.7%	0 0.0%	83 76.9%	2 1.9%	5 4.6%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	274 100.0%	55 20.1%	36 13.1%	1 0.4%	4 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	131 47.8%	22 8.0%	25 9.1%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	277 100.0%	163 58.8%	43 15.5%	6 2.2%	9 3.2%	0 0.0%	0 0.0%	13 4.7%	3 1.1%	40 14.4%
	公共工事が多い	522 100.0%	163 31.2%	191 36.6%	9 1.7%	7 1.3%	5 1.0%	1 0.2%	90 17.2%	4 0.8%	52 10.0%
	民間工事が ほとんどである	351 100.0%	14 4.0%	86 24.5%	2 0.6%	4 1.1%	32 9.1%	0 0.0%	136 38.7%	53 15.1%	24 6.8%
	民間工事が多い	610 100.0%	46 7.5%	205 33.6%	13 2.1%	7 1.1%	14 2.3%	0 0.0%	243 39.8%	38 6.2%	44 7.2%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	255 100.0%	38 14.9%	86 33.7%	3 1.2%	1 0.4%	12 4.7%	0 0.0%	75 29.4%	16 6.3%	24 9.4%

問 2・3-5_発注者の属性(S A)

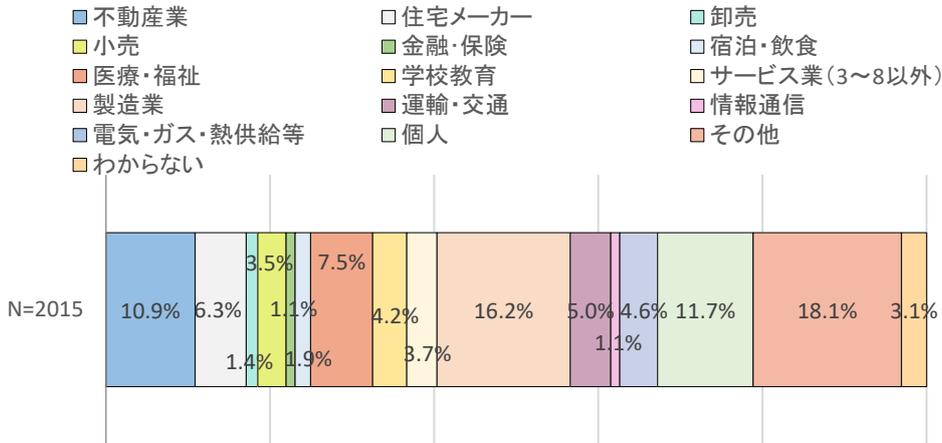


		合計	不動産業	住宅メーカー	卸売	小売	金融・保険	宿泊・飲食	医療・福祉	学校教育	サービス業	製造業	運輸・交通	情報通信	電気・ガス・熱供給等	個人	その他	わからない
全体		2015	219	126	28	70	22	38	152	84	74	327	100	22	92	235	364	62
		100.0%	10.9%	6.3%	1.4%	3.5%	1.1%	1.9%	7.5%	4.2%	3.7%	16.2%	5.0%	4.6%	11.7%	18.1%	3.1%	
完工高	5000万円未満	80	3	16	0	4	0	2	1	2	6	11	0	1	4	14	12	4
		100.0%	3.8%	20.0%	0.0%	5.0%	0.0%	2.5%	1.3%	2.5%	7.5%	13.8%	0.0%	1.3%	5.0%	17.5%	15.0%	5.0%
	5000万円以上 1億円未満	119	5	22	3	1	1	3	5	2	5	11	3	1	3	25	24	5
		100.0%	4.2%	18.5%	2.5%	0.8%	0.8%	2.5%	4.2%	1.7%	4.2%	9.2%	2.5%	0.8%	2.5%	21.0%	20.2%	4.2%
	1億円以上 3億円未満	326	30	26	3	14	4	5	19	14	7	55	18	2	13	30	67	19
		100.0%	9.2%	8.0%	0.9%	4.3%	1.2%	1.5%	5.8%	4.3%	2.1%	16.9%	5.5%	0.6%	4.0%	9.2%	20.6%	5.8%
	3億円以上 5億円未満	215	16	10	4	6	3	3	18	5	6	32	8	0	4	40	49	11
		100.0%	7.4%	4.7%	1.9%	2.8%	1.4%	1.4%	8.4%	2.3%	2.8%	14.9%	3.7%	0.0%	1.9%	18.6%	22.8%	5.1%
5億円以上 10億円未満	328	30	19	2	9	1	5	24	12	14	54	11	1	17	55	68	6	
	100.0%	9.1%	5.8%	0.6%	2.7%	0.3%	1.5%	7.3%	3.7%	4.3%	16.5%	3.4%	0.3%	5.2%	16.8%	20.7%	1.8%	
10億円以上 30億円未満	430	53	17	10	19	6	6	43	23	10	69	23	3	20	48	71	9	
	100.0%	12.3%	4.0%	2.3%	4.4%	1.4%	1.4%	10.0%	5.3%	2.3%	16.0%	5.3%	0.7%	4.7%	11.2%	16.5%	2.1%	
30億円以上 50億円未満	110	8	2	1	1	1	5	6	5	4	17	11	0	4	17	25	3	
	100.0%	7.3%	1.8%	0.9%	0.9%	0.9%	4.5%	5.5%	4.5%	3.6%	15.5%	10.0%	0.0%	3.6%	15.5%	22.7%	2.7%	
50億円以上	407	74	14	5	16	6	9	36	21	22	78	26	14	27	6	48	5	
	100.0%	18.2%	3.4%	1.2%	3.9%	1.5%	2.2%	8.8%	5.2%	5.4%	19.2%	6.4%	3.4%	6.6%	1.5%	11.8%	1.2%	
請負階層	元請工事が主	1040	89	40	18	44	12	11	80	45	47	159	47	10	62	172	195	9
		100.0%	8.6%	3.8%	1.7%	4.2%	1.2%	1.1%	7.7%	4.3%	4.5%	15.3%	4.5%	1.0%	6.0%	16.5%	18.8%	0.9%
	下請工事が主 (一次)が主	533	96	60	7	7	5	18	49	21	14	82	34	8	21	26	107	38
		100.0%	16.2%	10.1%	1.2%	1.2%	0.8%	3.0%	8.3%	3.5%	2.4%	13.8%	5.7%	1.3%	3.5%	4.4%	18.0%	6.4%
下請工事が主 (二次以降)が主	108	11	6	0	10	1	2	9	6	1	23	2	1	4	3	19	10	
	100.0%	10.2%	5.6%	0.0%	9.3%	0.9%	1.9%	8.3%	5.6%	0.9%	21.3%	1.9%	0.9%	3.7%	2.8%	17.6%	9.3%	
元請・下請工事は ほぼ同程度	274	23	20	3	9	4	7	14	12	12	63	17	3	5	34	43	5	
	100.0%	8.4%	7.3%	1.1%	3.3%	1.5%	2.6%	5.1%	4.4%	4.4%	23.0%	6.2%	1.1%	1.8%	12.4%	15.7%	1.8%	
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	277	8	8	1	5	1	1	5	9	7	30	19	1	16	67	95	4
		100.0%	2.9%	2.9%	0.4%	1.8%	0.4%	0.4%	1.8%	3.2%	2.5%	10.8%	6.9%	0.4%	5.8%	24.2%	34.3%	1.4%
	公共工事が多い	522	40	34	9	12	8	7	40	13	22	84	20	3	31	84	101	14
		100.0%	7.7%	6.5%	1.7%	2.3%	1.5%	1.3%	7.7%	2.5%	4.2%	16.1%	3.8%	0.6%	5.9%	16.1%	19.3%	2.7%
	民間工事が ほとんどである	351	67	34	6	11	5	8	20	5	8	66	16	6	14	29	47	9
	100.0%	19.1%	9.7%	1.7%	3.1%	1.4%	2.3%	5.7%	1.4%	2.3%	18.8%	4.6%	1.7%	4.0%	8.3%	13.4%	2.6%	
民間工事が多い	610	75	41	8	30	6	15	64	42	23	99	28	9	23	35	84	28	
	100.0%	12.3%	6.7%	1.3%	4.9%	1.0%	2.5%	10.5%	6.9%	3.8%	16.2%	4.6%	1.5%	3.8%	5.7%	13.8%	4.6%	
公共と民間工事は ほぼ同程度	255	29	9	4	12	2	7	23	15	14	48	17	3	8	20	37	7	
	100.0%	11.4%	3.5%	1.6%	4.7%	0.8%	2.7%	9.0%	5.9%	5.5%	18.8%	6.7%	1.2%	3.1%	7.8%	14.5%	2.7%	

問 2・3-6_元請企業の属性(SA)

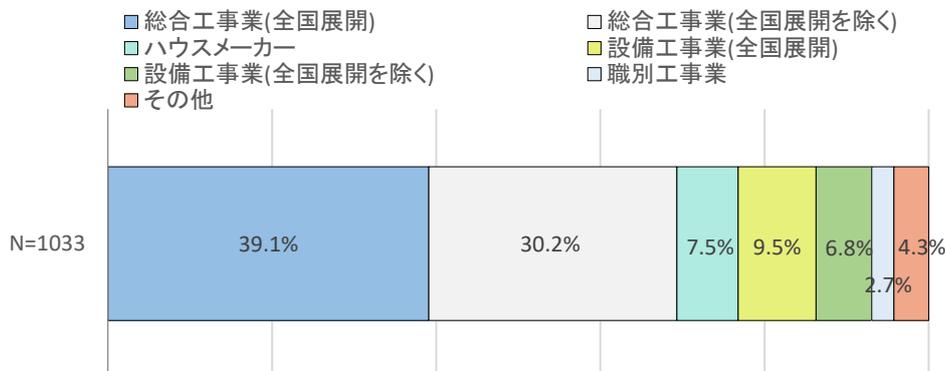

		合計	総合工事業 (全国展開)	総合工事業 (全国展開を 除く)	ハウスメーカー	設備工事業 (全国展開)	設備工事業 (全国展開を 除く)	職別工事業	その他
全体		1,033 100.0%	404 39.1%	312 30.2%	77 7.5%	98 9.5%	70 6.8%	28 2.7%	44 4.3%
完工高	5000万円未満	60 100.0%	13 21.7%	24 40.0%	11 18.3%	3 5.0%	4 6.7%	5 8.3%	0 0.0%
	5000万円以上 1億円未満	71 100.0%	14 19.7%	22 31.0%	15 21.1%	4 5.6%	9 12.7%	1 1.4%	6 8.5%
	1億円以上 3億円未満	219 100.0%	70 32.0%	59 26.9%	21 9.6%	30 13.7%	27 12.3%	7 3.2%	5 2.3%
	3億円以上 5億円未満	125 100.0%	41 32.8%	42 33.6%	7 5.6%	13 10.4%	10 8.0%	1 0.8%	11 8.8%
	5億円以上 10億円未満	172 100.0%	56 32.6%	58 33.7%	12 7.0%	17 9.9%	8 4.7%	10 5.8%	11 6.4%
	10億円以上 30億円未満	188 100.0%	70 37.2%	78 41.5%	6 3.2%	13 6.9%	11 5.9%	4 2.1%	6 3.2%
	30億円以上 50億円未満	44 100.0%	25 56.8%	14 31.8%	0 0.0%	3 6.8%	1 2.3%	0 0.0%	1 2.3%
	50億円以上	154 100.0%	115 74.7%	15 9.7%	5 3.2%	15 9.7%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.6%
請負階層	元請工事が主	229 100.0%	68 29.7%	96 41.9%	13 5.7%	13 5.7%	12 5.2%	7 3.1%	20 8.7%
	下請工事 (一次)が主	533 100.0%	241 45.2%	153 28.7%	43 8.1%	41 7.7%	27 5.1%	16 3.0%	12 2.3%
	下請工事 (二次以降)が主	106 100.0%	26 24.5%	15 14.2%	6 5.7%	33 31.1%	23 21.7%	2 1.9%	1 0.9%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	165 100.0%	69 41.8%	48 29.1%	15 9.1%	11 6.7%	8 4.8%	3 1.8%	11 6.7%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	92 100.0%	28 30.4%	33 35.9%	5 5.4%	6 6.5%	2 2.2%	5 5.4%	13 14.1%
	公共工事が多い	211 100.0%	73 34.6%	88 41.7%	12 5.7%	10 4.7%	15 7.1%	4 1.9%	9 4.3%
	民間工事が ほとんどである	243 100.0%	96 39.5%	55 22.6%	27 11.1%	28 11.5%	23 9.5%	5 2.1%	9 3.7%
	民間工事が多い	356 100.0%	158 44.4%	96 27.0%	22 6.2%	44 12.4%	17 4.8%	11 3.1%	8 2.2%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	131 100.0%	49 37.4%	40 30.5%	11 8.4%	10 7.6%	13 9.9%	3 2.3%	5 3.8%


問 2・3-7_工事の請負額(S A)

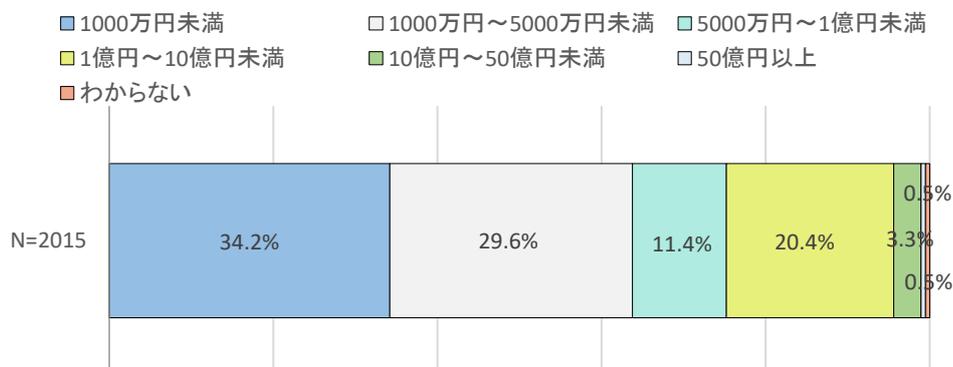

		合計	1000万円未満	1000万円～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1億円～10億円未満	10億円～50億円未満	50億円以上	わからない
全体		2,015 100.0%	689 34.2%	596 29.6%	230 11.4%	411 20.4%	67 3.3%	11 0.5%	11 0.5%
完工高	5000万円未満	80 100.0%	61 76.3%	17 21.3%	0 0.0%	2 2.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	5000万円以上1億円未満	119 100.0%	75 63.0%	28 23.5%	6 5.0%	8 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.7%
	1億円以上3億円未満	326 100.0%	188 57.7%	115 35.3%	11 3.4%	10 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.6%
	3億円以上5億円未満	215 100.0%	102 47.4%	68 31.6%	30 14.0%	13 6.0%	1 0.5%	0 0.0%	1 0.5%
	5億円以上10億円未満	328 100.0%	131 39.9%	114 34.8%	56 17.1%	26 7.9%	1 0.3%	0 0.0%	0 0.0%
	10億円以上30億円未満	430 100.0%	100 23.3%	156 36.3%	57 13.3%	107 24.9%	8 1.9%	1 0.2%	1 0.2%
	30億円以上50億円未満	110 100.0%	14 12.7%	36 32.7%	19 17.3%	37 33.6%	2 1.8%	0 0.0%	2 1.8%
	50億円以上	407 100.0%	18 4.4%	62 15.2%	51 12.5%	208 51.1%	55 13.5%	10 2.5%	3 0.7%
	請負階層	元請工事が主	1040 100.0%	333 32.0%	266 25.6%	116 11.2%	261 25.1%	51 4.9%	9 0.9%
下請工事(一次)が主		593 100.0%	216 36.4%	198 33.4%	74 12.5%	92 15.5%	8 1.3%	1 0.2%	4 0.7%
下請工事(二次以降)が主		108 100.0%	41 38.0%	39 36.1%	17 15.7%	10 9.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.9%
元請・下請工事はほぼ同程度		274 100.0%	99 36.1%	93 33.9%	23 8.4%	48 17.5%	8 2.9%	1 0.4%	2 0.7%
公共・民間工事の割合	公共工事がほとんどである	277 100.0%	165 59.6%	70 25.3%	18 6.5%	24 8.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	公共工事が多い	522 100.0%	187 35.8%	167 32.0%	66 12.6%	86 16.5%	14 2.7%	0 0.0%	2 0.4%
	民間工事がほとんどである	351 100.0%	130 37.0%	98 27.9%	36 10.3%	64 18.2%	16 4.6%	4 1.1%	3 0.9%
	民間工事が多い	610 100.0%	127 20.8%	181 29.7%	79 13.0%	183 30.0%	27 4.4%	7 1.1%	6 1.0%
	公共と民間工事はほぼ同程度	255 100.0%	80 31.4%	80 31.4%	31 12.2%	54 21.2%	10 3.9%	0 0.0%	0 0.0%

問 2・3-8_工事期間(S A)


■3か月未満 □3～6か月未満 ■6～12か月未満 ■12か月以上

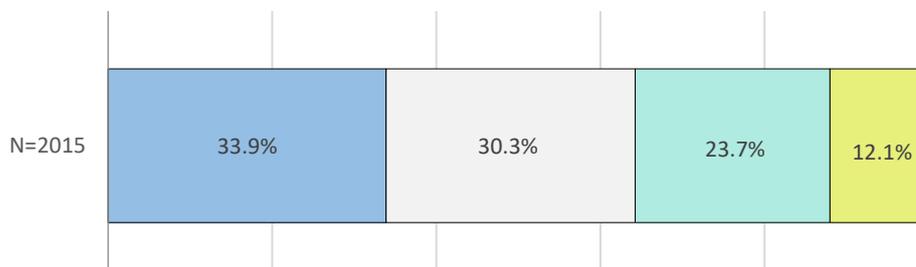

		合計	3か月未満	3～6か月未満	6～12か月未満	12か月以上	
全体		2,015 100.0%	683 33.9%	611 30.3%	478 23.7%	243 12.1%	
完工高	5000万円未満	80 100.0%	51 63.8%	25 31.3%	3 3.8%	1 1.3%	
	5000万円以上 1億円未満	119 100.0%	55 46.2%	42 35.3%	18 15.1%	4 3.4%	
	1億円以上 3億円未満	326 100.0%	153 46.9%	117 35.9%	43 13.2%	13 4.0%	
	3億円以上 5億円未満	215 100.0%	96 44.7%	59 27.4%	49 22.8%	11 5.1%	
	5億円以上 10億円未満	328 100.0%	141 43.0%	101 30.8%	73 22.3%	13 4.0%	
	10億円以上 30億円未満	430 100.0%	124 28.8%	138 32.1%	117 27.2%	51 11.9%	
	30億円以上 50億円未満	110 100.0%	24 21.8%	42 38.2%	26 23.6%	18 16.4%	
	50億円以上	407 100.0%	39 9.6%	87 21.4%	149 36.6%	132 32.4%	
	請負階層	元請工事が主	1040 100.0%	338 32.5%	314 30.2%	260 25.0%	128 12.3%
		下請工事 (一次)が主	593 100.0%	218 36.8%	168 28.3%	134 22.6%	73 12.3%
下請工事 (二次以降)が主		108 100.0%	29 26.9%	43 39.8%	27 25.0%	9 8.3%	
元請・下請工事は ほぼ同程度		274 100.0%	98 35.8%	86 31.4%	57 20.8%	33 12.0%	
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	277 100.0%	162 58.5%	68 24.5%	38 13.7%	9 3.2%	
	公共工事が多い	522 100.0%	189 36.2%	186 35.6%	111 21.3%	36 6.9%	
	民間工事が ほとんどである	351 100.0%	129 36.8%	92 26.2%	74 21.1%	56 16.0%	
	民間工事が多い	610 100.0%	141 23.1%	169 27.7%	183 30.0%	117 19.2%	
	公共と民間工事は ほぼ同程度	255 100.0%	62 24.3%	96 37.6%	72 28.2%	25 9.8%	
発注者の属性	不動産業	219 100.0%	42 19.2%	40 18.3%	51 23.3%	86 39.3%	
	住宅メーカー	126 100.0%	57 45.2%	39 31.0%	20 15.9%	10 7.9%	
	卸売	28 100.0%	7 25.0%	8 28.6%	10 35.7%	3 10.7%	
	小売	70 100.0%	28 40.0%	26 37.1%	12 17.1%	4 5.7%	
	金融・保険	22 100.0%	5 22.7%	6 27.3%	10 45.5%	1 4.5%	
	宿泊・飲食	38 100.0%	12 31.6%	9 23.7%	10 26.3%	7 18.4%	
	医療・福祉	152 100.0%	40 26.3%	39 25.7%	50 32.9%	23 15.1%	
	学校教育	84 100.0%	17 20.2%	31 36.9%	19 22.6%	17 20.2%	
	サービス業 (上記以外)	74 100.0%	28 37.8%	19 25.7%	23 31.1%	4 5.4%	
	製造業	327 100.0%	119 36.4%	98 30.0%	86 26.3%	24 7.3%	
	運輸・交通	100 100.0%	25 25.0%	30 30.0%	32 32.0%	13 13.0%	
	情報通信	22 100.0%	3 13.6%	8 36.4%	7 31.8%	4 18.2%	
	電気・ガス・熱供給等	92 100.0%	26 28.3%	29 31.5%	21 22.8%	16 17.4%	
	個人	235 100.0%	128 54.5%	70 29.8%	36 15.3%	1 0.4%	
	その他	364 100.0%	122 33.5%	134 36.8%	82 22.5%	26 7.1%	

問 2・3-9_工期をどのように設定したか(S A)


- 注文者の意向を優先し協議は依頼しなかった
- 注文者の意向が優先され、協議は応じてもらえなかった
- 注文者と協議を行ったが、受注者の要望は受け入れられなかった
- 注文者と協議を行い、受注者の要望も受け入れられた

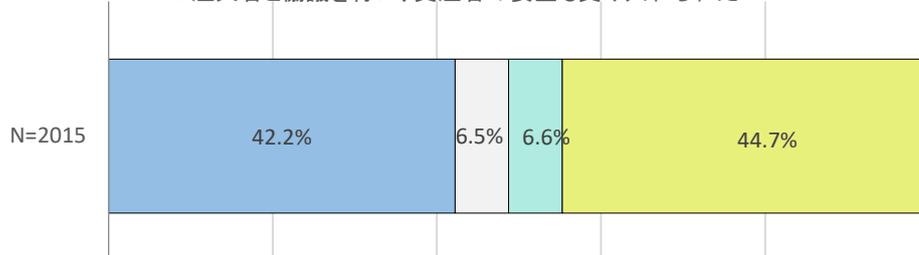

		合計	協議は依頼しなかった	協議は応じてもらえなかった	協議を行ったが、要望は受け入れられなかった	協議を行い、要望も受け入れられた	
全体		2,015 100.0%	851 42.2%	131 6.5%	132 6.6%	901 44.7%	
完工高	5000万円未満	80 100.0%	38 47.5%	3 3.8%	4 5.0%	35 43.8%	
	5000万円以上 1億円未満	119 100.0%	45 37.8%	5 4.2%	6 5.0%	63 52.9%	
	1億円以上 3億円未満	326 100.0%	144 44.2%	18 5.5%	12 3.7%	152 46.6%	
	3億円以上 5億円未満	215 100.0%	98 45.6%	12 5.6%	8 3.7%	97 45.1%	
	5億円以上 10億円未満	328 100.0%	134 40.9%	28 8.5%	20 6.1%	146 44.5%	
	10億円以上 30億円未満	430 100.0%	173 40.2%	24 5.6%	29 6.7%	204 47.4%	
	30億円以上 50億円未満	110 100.0%	36 32.7%	7 6.4%	8 7.3%	59 53.6%	
	50億円以上	407 100.0%	183 45.0%	34 8.4%	45 11.1%	145 35.6%	
	請負階層	元請工事が主	1040 100.0%	371 35.7%	55 5.3%	61 5.9%	553 53.2%
		下請工事 (一次)が主	593 100.0%	278 46.9%	48 8.1%	50 8.4%	217 36.6%
下請工事 (二次以降)が主		108 100.0%	70 64.8%	11 10.2%	9 8.3%	18 16.7%	
元請・下請工事は ほぼ同程度		274 100.0%	132 48.2%	17 6.2%	12 4.4%	113 41.2%	
公共・民間工事	公共工事が ほとんどである	277 100.0%	100 36.1%	9 3.2%	6 2.2%	162 58.5%	
	公共工事が多い	522 100.0%	192 36.8%	26 5.0%	34 6.5%	270 51.7%	
	民間工事が ほとんどである	351 100.0%	158 45.0%	20 5.7%	20 5.7%	153 43.6%	
	民間工事が多い	610 100.0%	284 46.6%	52 8.5%	58 9.5%	216 35.4%	
	公共と民間工事は ほぼ同程度	255 100.0%	117 45.9%	24 9.4%	14 5.5%	100 39.2%	
発注者の属性	不動産業	219 100.0%	90 41.1%	25 11.4%	21 9.6%	83 37.9%	
	住宅メーカー	126 100.0%	68 54.0%	10 7.9%	10 7.9%	38 30.2%	
	卸売	28 100.0%	11 39.3%	1 3.6%	1 3.6%	15 53.6%	
	小売	70 100.0%	26 37.1%	7 10.0%	4 5.7%	33 47.1%	
	金融・保険	22 100.0%	10 45.5%	4 18.2%	1 4.5%	7 31.8%	
	宿泊・飲食	38 100.0%	15 39.5%	4 10.5%	2 5.3%	17 44.7%	
	医療・福祉	152 100.0%	63 41.4%	15 9.9%	16 10.5%	58 38.2%	
	学校教育	84 100.0%	42 50.0%	4 4.8%	10 11.9%	28 33.3%	
	サービス業 (上記以外)	74 100.0%	28 37.8%	5 6.8%	4 5.4%	37 50.0%	
	製造業	327 100.0%	147 45.0%	17 5.2%	20 6.1%	143 43.7%	
	運輸・交通	100 100.0%	45 45.0%	3 3.0%	6 6.0%	46 46.0%	
	情報通信	22 100.0%	8 36.4%	2 9.1%	1 4.5%	11 50.0%	
	電気・ガス・熱供給等	92 100.0%	36 39.1%	2 2.2%	9 9.8%	45 48.9%	
	個人	235 100.0%	66 28.1%	4 1.7%	7 3.0%	158 67.2%	
	その他	364 100.0%	168 46.2%	15 4.1%	18 4.9%	163 44.8%	


問 2・3-10 工期は適切だったか(S A)

- 著しく短い工期の工事だった
- 短い工期の工事だった
- 妥当な工期の工事だった
- 余裕のある工事だった

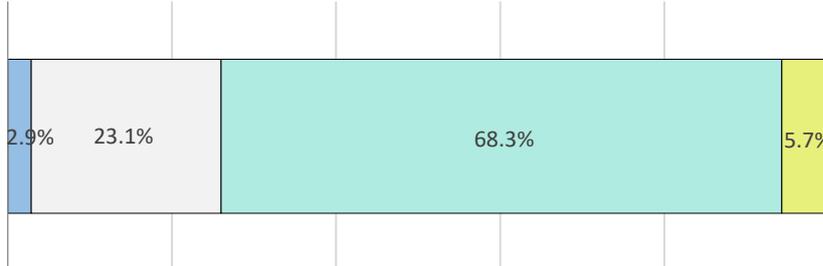

		合計	著しく短い工期の 工事だった	短い工期の 工事だった	妥当な工期の 工事だった	余裕のある工事だ った
全体		2,015 100.0%	58 2.9%	466 23.1%	1,376 68.3%	115 5.7%
完工高	5000万円未満	80 100.0%	0 0.0%	15 18.8%	58 72.5%	7 8.8%
	5000万円以上 1億円未満	119 100.0%	2 1.7%	21 17.6%	87 73.1%	9 7.6%
	1億円以上 3億円未満	326 100.0%	15 4.6%	65 19.9%	216 66.3%	30 9.2%
	3億円以上 5億円未満	215 100.0%	6 2.8%	42 19.5%	142 66.0%	25 11.6%
	5億円以上 10億円未満	328 100.0%	11 3.4%	70 21.3%	233 71.0%	14 4.3%
	10億円以上 30億円未満	430 100.0%	5 1.2%	99 23.0%	307 71.4%	19 4.4%
	30億円以上 50億円未満	110 100.0%	3 2.7%	27 24.5%	79 71.8%	1 0.9%
	50億円以上	407 100.0%	16 3.9%	127 31.2%	254 62.4%	10 2.5%
請負階層	元請工事が主	1040 100.0%	28 2.7%	216 20.8%	737 70.9%	59 5.7%
	下請工事 (一次)が主	593 100.0%	21 3.5%	161 27.2%	379 63.9%	32 5.4%
	下請工事 (二次以降)が主	108 100.0%	3 2.8%	31 28.7%	67 62.0%	7 6.5%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	274 100.0%	6 2.2%	58 21.2%	193 70.4%	17 6.2%
公共・民間工事 の割合	公共工事が ほとんどである	277 100.0%	3 1.1%	30 10.8%	212 76.5%	32 11.6%
	公共工事が多い	522 100.0%	17 3.3%	116 22.2%	366 70.1%	23 4.4%
	民間工事が ほとんどである	351 100.0%	7 2.0%	81 23.1%	245 69.8%	18 5.1%
	民間工事が多い	610 100.0%	25 4.1%	168 27.5%	394 64.6%	23 3.8%
発注者の属性	公共と民間工事は ほぼ同程度	255 100.0%	6 2.4%	71 27.8%	159 62.4%	19 7.5%
	不動産業	219 100.0%	8 3.7%	76 34.7%	130 59.4%	5 2.3%
	住宅メーカー	126 100.0%	5 4.0%	24 19.0%	94 74.6%	3 2.4%
	卸売	28 100.0%	0 0.0%	5 17.9%	19 67.9%	4 14.3%
	小売	70 100.0%	4 5.7%	27 38.6%	39 55.7%	0 0.0%
	金融・保険	22 100.0%	0 0.0%	6 27.3%	15 68.2%	1 4.5%
	宿泊・飲食	38 100.0%	2 5.3%	11 28.9%	24 63.2%	1 2.6%
	医療・福祉	152 100.0%	7 4.6%	45 29.6%	94 61.8%	6 3.9%
	学校教育	84 100.0%	4 4.8%	28 33.3%	49 58.3%	3 3.6%
	サービス業 (上記以外)	74 100.0%	3 4.1%	16 21.6%	50 67.6%	5 6.8%
	製造業	327 100.0%	8 2.4%	79 24.2%	227 69.4%	13 4.0%
	運輸・交通	100 100.0%	2 2.0%	21 21.0%	74 74.0%	3 3.0%
	情報通信	22 100.0%	1 4.5%	5 22.7%	15 68.2%	1 4.5%
	電気・ガス・熱供給等	92 100.0%	2 2.2%	12 13.0%	71 77.2%	7 7.6%
	個人	235 100.0%	3 1.3%	25 10.6%	189 80.4%	18 7.7%
	その他	364 100.0%	5 1.4%	64 17.6%	252 69.2%	43 11.8%

問 2・3-11_実際に取得できた休日状況(S A)

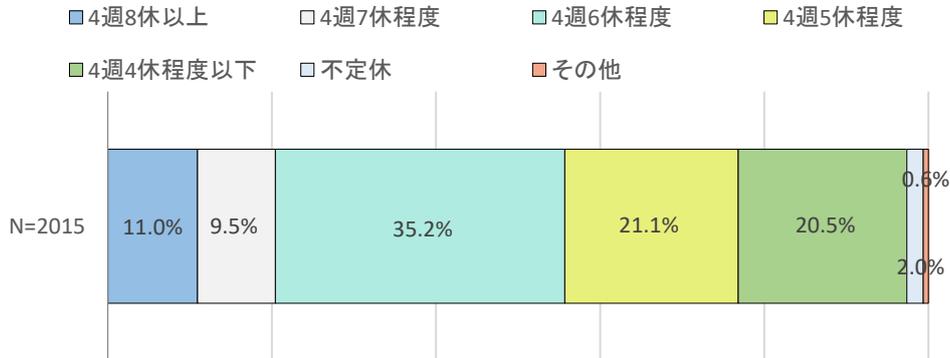


	合計	4週8休以上	4週7休程度	4週6休程度	4週5休程度	4週4休程度以下	不定休	その他		
全体	2,015 100.0%	221 11.0%	191 9.5%	710 35.2%	426 21.1%	414 20.5%	40 2.0%	13 0.6%		
完工高	5000万円未満	80 100.0%	8 10.0%	9 11.3%	28 35.0%	16 20.0%	13 16.3%	6 7.5%	0 0.0%	
	5000万円以上 1億円未満	119 100.0%	15 12.6%	13 10.9%	47 39.5%	24 20.2%	19 16.0%	0 0.0%	1 0.8%	
	1億円以上 3億円未満	326 100.0%	30 9.2%	35 10.7%	107 32.8%	77 23.6%	68 20.9%	7 2.1%	2 0.6%	
	3億円以上 5億円未満	215 100.0%	34 15.8%	18 8.4%	84 39.1%	38 17.7%	36 16.7%	5 2.3%	0 0.0%	
	5億円以上 10億円未満	328 100.0%	40 12.2%	34 10.4%	137 41.8%	56 17.1%	50 15.2%	8 2.4%	3 0.9%	
	10億円以上 30億円未満	430 100.0%	42 9.8%	35 8.1%	159 37.0%	89 20.7%	92 21.4%	10 2.3%	3 0.7%	
	30億円以上 50億円未満	110 100.0%	9 8.2%	15 13.6%	36 32.7%	22 20.0%	26 23.6%	1 0.9%	1 0.9%	
	407 50億円以上	100.0%	43 10.6%	32 7.9%	112 27.5%	104 25.6%	110 27.0%	3 0.7%	3 0.7%	
	請負階層	元請工事が主	1040 100.0%	142 13.7%	106 10.2%	413 39.7%	178 17.1%	182 17.5%	12 1.2%	7 0.7%
		下請工事 (一次)が主	593 100.0%	41 6.9%	52 8.8%	165 27.8%	154 26.0%	156 26.3%	20 3.4%	5 0.8%
下請工事 (二次以降)が主		108 100.0%	8 7.4%	6 5.6%	30 27.8%	31 28.7%	31 28.7%	2 1.9%	0 0.0%	
元請・下請工事は ほぼ同程度		274 100.0%	30 10.9%	27 9.9%	102 37.2%	63 23.0%	45 16.4%	6 2.2%	1 0.4%	
公共・民間工事	公共工事が ほとんどである	277 100.0%	72 26.0%	32 11.6%	116 41.9%	20 7.2%	26 9.4%	4 1.4%	7 2.5%	
	公共工事が多い	522 100.0%	62 11.9%	58 11.1%	197 37.7%	98 18.8%	94 18.0%	9 1.7%	4 0.8%	
	民間工事が ほとんどである	351 100.0%	19 5.4%	29 8.3%	104 29.6%	100 28.5%	87 24.8%	11 3.1%	1 0.3%	
	民間工事が多い	610 100.0%	53 8.7%	47 7.7%	194 31.8%	157 25.7%	148 24.3%	10 1.6%	1 0.2%	
公共と民間工事は ほぼ同程度	255 100.0%	15 5.9%	25 9.8%	99 38.8%	51 20.0%	59 23.1%	6 2.4%	0 0.0%		
発注者の属性	不動産業	219 100.0%	10 4.6%	14 6.4%	70 32.0%	62 28.3%	57 26.0%	5 2.3%	1 0.5%	
	住宅メーカー	126 100.0%	7 5.6%	15 11.9%	36 28.6%	33 26.2%	25 19.8%	7 5.6%	3 2.4%	
	卸売	28 100.0%	2 7.1%	1 3.6%	16 57.1%	5 17.9%	4 14.3%	0 0.0%	0 0.0%	
	小売	70 100.0%	3 4.3%	4 5.7%	18 25.7%	19 27.1%	23 32.9%	2 2.9%	1 1.4%	
	金融・保険	22 100.0%	2 9.1%	4 18.2%	5 22.7%	5 22.7%	6 27.3%	0 0.0%	0 0.0%	
	宿泊・飲食	38 100.0%	4 10.5%	0 0.0%	9 23.7%	13 34.2%	12 31.6%	0 0.0%	0 0.0%	
	医療・福祉	152 100.0%	8 5.3%	13 8.6%	58 38.2%	33 21.7%	36 23.7%	4 2.6%	0 0.0%	
	学校教育	84 100.0%	7 8.3%	5 6.0%	34 40.5%	14 16.7%	24 28.6%	0 0.0%	0 0.0%	
	サービス業 (上記以外)	74 100.0%	12 16.2%	6 8.1%	24 32.4%	24 32.4%	18 24.3%	2 2.7%	0 0.0%	
	製造業	327 100.0%	30 9.2%	30 9.2%	110 33.6%	84 25.7%	66 20.2%	6 1.8%	1 0.3%	
	運輸・交通	100 100.0%	8 8.0%	7 7.0%	48 48.0%	13 13.0%	19 19.0%	4 4.0%	1 1.0%	
	情報通信	22 100.0%	6 27.3%	6 27.3%	4 18.2%	4 18.2%	2 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	
	電気・ガス・熱供給等	92 100.0%	13 14.1%	21 22.8%	37 40.2%	12 13.0%	8 8.7%	1 1.1%	0 0.0%	
	個人	235 100.0%	31 13.2%	29 12.3%	105 44.7%	31 13.2%	34 14.5%	3 1.3%	2 0.9%	
	その他	364 100.0%	73 20.1%	35 9.6%	119 32.7%	71 19.5%	57 15.7%	5 1.4%	4 1.1%	

工期変更があった個別の民間工事の概要

(※ 問4・問5の回答を統合して集計)


問4・5-3_請負階層(SA)

■ 元請企業
 □ 一次下請企業
 ■ 二次下請企業
 ■ 三次以降の下請企業

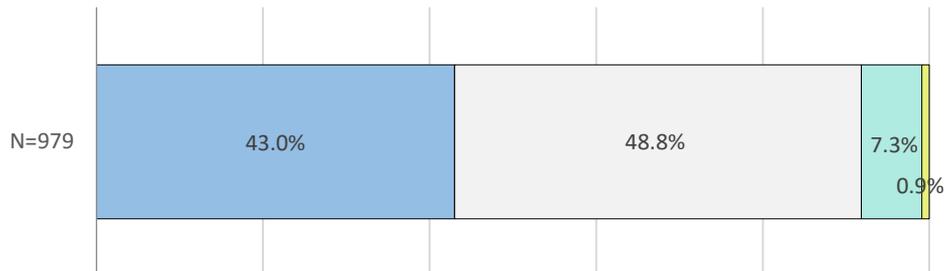


		合計	元請企業	一次下請企業	二次下請企業	三次以降の下請企業
全体		979 100.0%	421 43.0%	478 48.8%	71 7.3%	9 0.9%
完工高	5000万円未満	33 100.0%	6 18.2%	23 69.7%	4 12.1%	0 0.0%
	5000万円以上 1億円未満	49 100.0%	16 32.7%	26 53.1%	6 12.2%	1 2.0%
	1億円以上 3億円未満	142 100.0%	36 25.4%	81 57.0%	20 14.1%	5 3.5%
	3億円以上 5億円未満	85 100.0%	19 22.4%	53 62.4%	13 15.3%	0 0.0%
	5億円以上 10億円未満	143 100.0%	67 46.9%	65 45.5%	11 7.7%	0 0.0%
	10億円以上 30億円未満	201 100.0%	91 45.3%	97 48.3%	12 6.0%	1 0.5%
	30億円以上 50億円未満	57 100.0%	24 42.1%	29 50.9%	4 7.0%	0 0.0%
	50億円以上	269 100.0%	162 60.2%	104 38.7%	1 0.4%	2 0.7%
請負階層	元請工事が主	431 100.0%	336 78.0%	89 20.6%	5 1.2%	1 0.2%
	下請工事 (一次)が主	338 100.0%	25 7.4%	289 85.5%	23 6.8%	1 0.3%
	下請工事 (二次以降)が主	55 100.0%	2 3.6%	12 21.8%	36 65.5%	5 9.1%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	155 100.0%	58 37.4%	88 56.8%	7 4.5%	2 1.3%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	96 100.0%	65 67.7%	24 25.0%	6 6.3%	1 1.0%
	公共工事が多い	201 100.0%	100 49.8%	90 44.8%	10 5.0%	1 0.5%
	民間工事が ほとんどである	211 100.0%	51 24.2%	132 62.6%	25 11.8%	3 1.4%
	民間工事が多い	319 100.0%	131 41.1%	170 53.3%	16 5.0%	2 0.6%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	152 100.0%	74 48.7%	62 40.8%	14 9.2%	2 1.3%

問 4・5-4_工事の種類(S A)

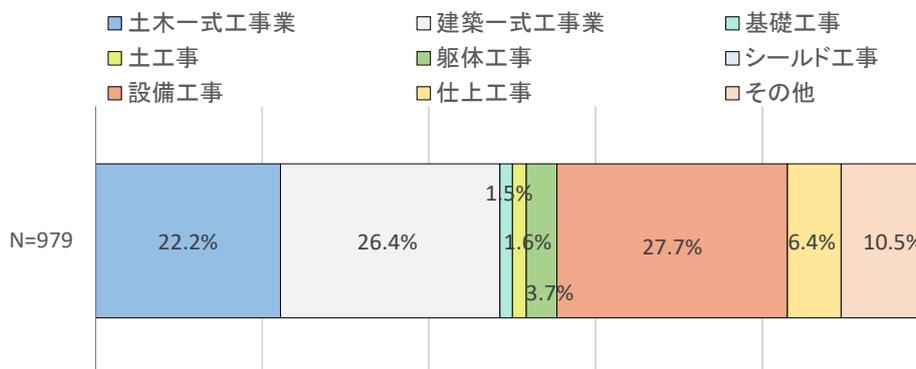


		合計	土木一式工事業	建築一式工事業	基礎工事	土工事	躯体工事	シールド工事	設備工事	仕上工事	その他
全体		979	217	258	15	16	36	0	271	63	103
		100.0%	22.2%	26.4%	1.5%	1.6%	3.7%	0.0%	27.7%	6.4%	10.5%
完工高	5000万円未満	33	2	9	2	0	1	0	7	5	7
		100.0%	6.1%	27.3%	6.1%	0.0%	3.0%	0.0%	21.2%	15.2%	21.2%
	5000万円以上 1億円未満	49	15	11	0	1	1	0	16	2	3
		100.0%	30.6%	22.4%	0.0%	2.0%	2.0%	0.0%	32.7%	4.1%	6.1%
	1億円以上 3億円未満	142	32	14	0	6	11	0	42	18	19
		100.0%	22.5%	9.9%	0.0%	4.2%	7.7%	0.0%	29.6%	12.7%	13.4%
	3億円以上 5億円未満	85	18	16	1	1	5	0	21	9	14
		100.0%	21.2%	18.8%	1.2%	1.2%	5.9%	0.0%	24.7%	10.6%	16.5%
5億円以上 10億円未満	143	38	27	1	0	6	0	38	15	18	
	100.0%	26.6%	18.9%	0.7%	0.0%	4.2%	0.0%	26.6%	10.5%	12.6%	
10億円以上 30億円未満	201	41	62	4	2	10	0	56	10	16	
	100.0%	20.4%	30.8%	2.0%	1.0%	5.0%	0.0%	27.9%	5.0%	8.0%	
30億円以上 50億円未満	57	16	19	0	4	1	0	11	2	4	
	100.0%	28.1%	33.3%	0.0%	7.0%	1.8%	0.0%	19.3%	3.5%	7.0%	
50億円以上	269	55	100	7	2	1	0	80	2	22	
	100.0%	20.4%	37.2%	2.6%	0.7%	0.4%	0.0%	29.7%	0.7%	8.2%	
請負階層	元請工事が主	431	142	195	2	6	4	0	54	1	27
		100.0%	32.9%	45.2%	0.5%	1.4%	0.9%	0.0%	12.5%	0.2%	6.3%
	下請工事 (一次)が主	338	39	45	13	7	26	0	106	49	53
		100.0%	11.5%	13.3%	3.8%	2.1%	7.7%	0.0%	31.4%	14.5%	15.7%
下請工事 (二次以降)が主	55	4	1	0	0	4	0	40	2	4	
	100.0%	7.3%	1.8%	0.0%	0.0%	7.3%	0.0%	72.7%	3.6%	7.3%	
元請・下請工事は ほぼ同程度	155	32	17	0	3	2	0	71	11	19	
	100.0%	20.6%	11.0%	0.0%	1.9%	1.3%	0.0%	45.8%	7.1%	12.3%	
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	96	59	14	1	5	1	0	3	1	12
		100.0%	61.5%	14.6%	1.0%	5.2%	1.0%	0.0%	3.1%	1.0%	12.5%
	公共工事が多い	201	89	52	1	5	2	0	23	6	23
		100.0%	44.3%	25.9%	0.5%	2.5%	1.0%	0.0%	11.4%	3.0%	11.4%
	民間工事が ほとんどである	211	14	37	1	1	20	0	83	29	26
	100.0%	6.6%	17.5%	0.5%	0.5%	9.5%	0.0%	39.3%	13.7%	12.3%	
民間工事が多い	319	28	106	8	4	8	0	120	18	27	
	100.0%	8.8%	33.2%	2.5%	1.3%	2.5%	0.0%	37.6%	5.6%	8.5%	
公共と民間工事は ほぼ同程度	152	27	49	4	1	5	0	42	9	15	
	100.0%	17.8%	32.2%	2.6%	0.7%	3.3%	0.0%	27.6%	5.9%	9.9%	

問 4・5-5_発注者の属性(S A)

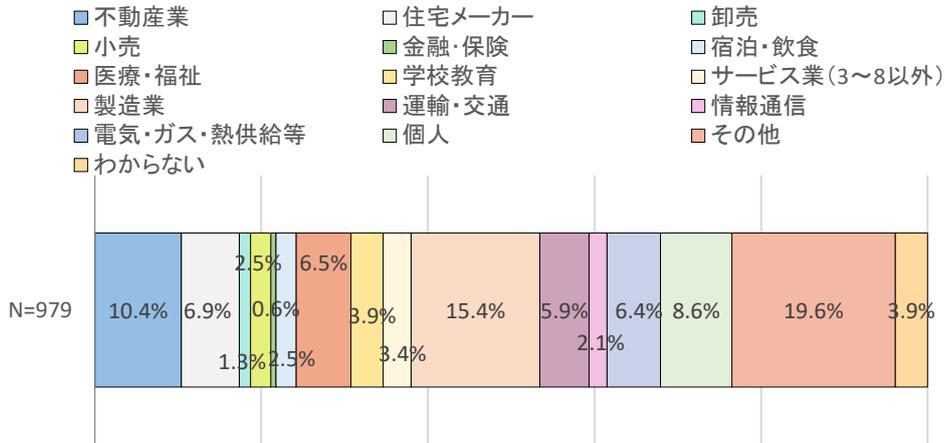


		合計	不動産業	住宅メーカー	卸売	小売	金融・保険	宿泊・飲食	医療・福祉	学校教育	サービス業	製造業	運輸・交通	情報通信	電気・ガス・熱供給等	個人	その他	わからない
全体		979 100.0%	102 10.4%	68 6.9%	13 1.3%	24 2.5%	6 0.6%	24 2.5%	64 6.5%	38 3.9%	33 3.4%	151 15.4%	58 5.9%	21 2.1%	63 6.4%	84 8.6%	192 19.6%	38 3.9%
完工高	5000万円未満	33 100.0%	3 9.1%	10 30.3%	0 0.0%	2 6.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.1%	2 6.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.0%	2 6.1%	10 30.3%	1 3.0%
	5000万円以上 1億円未満	49 100.0%	0 0.0%	8 16.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 8.2%	3 6.1%	0 0.0%	7 14.3%	1 2.0%	0 0.0%	2 4.1%	7 14.3%	14 28.6%	3 6.1%
	1億円以上 3億円未満	142 100.0%	9 6.3%	12 8.5%	2 1.4%	2 1.4%	0 0.0%	8 5.6%	7 4.9%	4 2.8%	0 0.0%	23 16.2%	6 4.2%	3 2.1%	9 6.3%	17 12.0%	27 19.0%	13 9.2%
	3億円以上 5億円未満	85 100.0%	7 8.2%	12 14.1%	0 0.0%	4 4.7%	2 2.4%	1 1.2%	1 1.2%	5 5.9%	2 2.4%	10 11.8%	1 1.2%	1 1.2%	2 2.4%	9 10.6%	23 27.1%	5 5.9%
	5億円以上 10億円未満	143 100.0%	10 7.0%	9 6.3%	3 2.1%	1 0.7%	0 0.0%	4 2.8%	6 4.2%	4 2.8%	7 4.9%	18 12.6%	3 2.1%	3 2.1%	8 5.6%	26 18.2%	38 26.6%	3 2.1%
	10億円以上 30億円未満	201 100.0%	22 10.9%	6 3.0%	4 2.0%	6 3.0%	0 0.0%	6 3.0%	22 10.9%	10 5.0%	9 4.5%	32 15.9%	14 7.0%	4 2.0%	9 4.5%	16 8.0%	34 16.9%	7 3.5%
	30億円以上 50億円未満	57 100.0%	3 5.3%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	0 0.0%	3 5.3%	3 5.3%	3 5.3%	0 0.0%	13 22.8%	2 3.5%	0 0.0%	8 14.0%	3 5.3%	14 24.6%	3 5.3%
	50億円以上	239 100.0%	48 17.8%	11 4.1%	3 1.1%	8 3.0%	4 1.5%	2 0.7%	21 7.8%	9 3.3%	13 4.8%	46 17.1%	31 11.5%	10 3.7%	24 8.9%	4 1.5%	32 11.9%	3 1.1%
請負階層	元請工事が主	431 100.0%	41 9.5%	17 3.9%	8 1.9%	10 2.3%	2 0.5%	5 1.2%	32 7.4%	14 3.2%	13 3.0%	76 17.6%	29 6.7%	6 1.4%	34 7.9%	50 11.6%	88 20.4%	6 1.4%
	下請工事 (一次)が主	338 100.0%	41 12.1%	41 12.1%	3 0.9%	5 1.5%	1 0.3%	15 4.4%	20 5.9%	15 4.4%	12 3.6%	38 11.2%	22 6.5%	10 3.0%	18 5.3%	10 3.0%	68 20.1%	19 5.6%
	下請工事 (二次以降)が主	55 100.0%	5 9.1%	3 5.5%	0 0.0%	1 1.8%	2 3.6%	2 3.6%	3 5.5%	4 7.3%	3 5.5%	11 20.0%	2 3.6%	0 0.0%	3 5.5%	3 5.5%	10 18.2%	3 5.5%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	155 100.0%	15 9.7%	7 4.5%	2 1.3%	8 5.2%	1 0.6%	2 1.3%	9 5.8%	5 3.2%	5 3.2%	26 16.8%	5 3.2%	5 3.2%	8 5.2%	21 13.5%	26 16.8%	10 6.5%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	96 100.0%	3 3.1%	2 2.1%	1 1.0%	1 1.0%	0 0.0%	1 1.0%	1 1.0%	1 1.0%	2 2.1%	9 9.4%	4 4.2%	2 2.1%	6 6.3%	20 20.8%	37 38.5%	6 6.3%
	公共工事が多い	201 100.0%	25 12.4%	3 1.5%	2 1.0%	6 3.0%	1 0.5%	0 0.0%	9 4.5%	4 2.0%	4 2.0%	32 15.9%	16 8.0%	5 2.5%	19 9.5%	20 10.0%	47 23.4%	8 4.0%
	民間工事が ほとんどである	211 100.0%	24 11.4%	25 11.8%	2 0.9%	5 2.4%	3 1.4%	7 3.3%	8 3.8%	2 0.9%	8 3.8%	39 18.5%	17 8.1%	5 2.4%	13 6.2%	12 5.7%	35 16.6%	6 2.8%
	民間工事が多い	339 100.0%	43 13.5%	26 8.2%	4 1.3%	9 2.8%	2 0.6%	11 3.4%	38 11.9%	20 6.3%	13 4.1%	39 12.2%	14 4.4%	6 1.9%	15 4.7%	18 5.6%	46 14.4%	15 4.7%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	152 100.0%	7 4.6%	12 7.9%	4 2.6%	3 2.0%	0 0.0%	5 3.3%	8 5.3%	11 7.2%	6 3.9%	32 21.1%	7 4.6%	3 2.0%	10 6.6%	14 9.2%	27 17.8%	3 2.0%

問 4・5-6_元請企業の属性(SA)

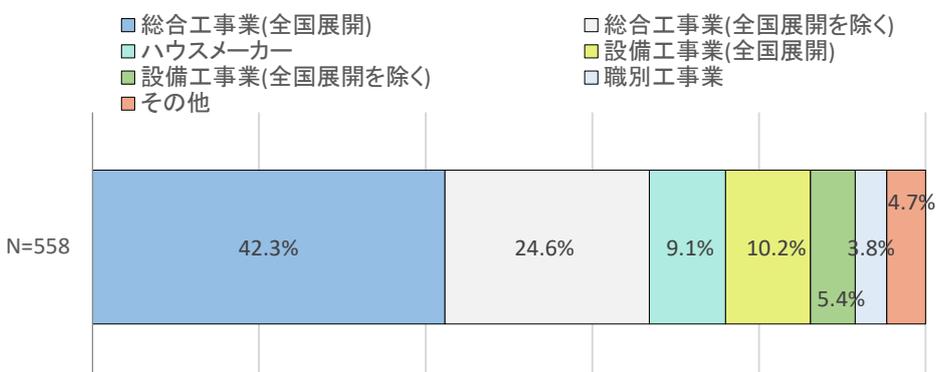

		合計	総合工事業 (全国展開)	総合工事業 (全国展開を 除く)	ハウスメーカー	設備工事業 (全国展開)	設備工事業 (全国展開を 除く)	職別工事業	その他
全体		558 100.0%	236 42.3%	137 24.6%	51 9.1%	57 10.2%	30 5.4%	21 3.8%	26 4.7%
完工高	5000万円未満	27 100.0%	5 18.5%	12 44.4%	10 37.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	5000万円以上 1億円未満	33 100.0%	7 21.2%	5 15.2%	6 18.2%	4 12.1%	5 15.2%	3 9.1%	3 9.1%
	1億円以上 3億円未満	106 100.0%	39 36.8%	26 24.5%	11 10.4%	11 10.4%	10 9.4%	6 5.7%	3 2.8%
	3億円以上 5億円未満	66 100.0%	18 27.3%	21 31.8%	9 13.6%	6 9.1%	5 7.6%	3 4.5%	4 6.1%
	5億円以上 10億円未満	76 100.0%	17 22.4%	21 27.6%	8 10.5%	14 18.4%	7 9.2%	5 6.6%	4 5.3%
	10億円以上 30億円未満	110 100.0%	50 45.5%	34 30.9%	4 3.6%	8 7.3%	1 0.9%	4 3.6%	9 8.2%
	30億円以上 50億円未満	33 100.0%	17 51.5%	9 27.3%	0 0.0%	4 12.1%	1 3.0%	0 0.0%	2 6.1%
	50億円以上	107 100.0%	83 77.6%	9 8.4%	3 2.8%	10 9.3%	1 0.9%	0 0.0%	1 0.9%
	請負階層	元請工事が主	95 100.0%	33 34.7%	31 32.6%	6 6.3%	8 8.4%	8 8.4%	2 2.1%
下請工事 (一次)が主		313 100.0%	145 46.3%	81 25.9%	31 9.9%	24 7.7%	9 2.9%	13 4.2%	10 3.2%
下請工事 (二次以降)が主		53 100.0%	12 22.6%	5 9.4%	3 5.7%	19 35.8%	12 22.6%	2 3.8%	0 0.0%
元請・下請工事は ほぼ同程度		97 100.0%	46 47.4%	20 20.6%	11 11.3%	6 6.2%	1 1.0%	4 4.1%	9 9.3%
公共・民間工 事の割合	公共工事が ほとんどである	31 100.0%	12 38.7%	8 25.8%	1 3.2%	5 16.1%	1 3.2%	0 0.0%	4 12.9%
	公共工事が多い	101 100.0%	47 46.5%	31 30.7%	0 0.0%	5 5.0%	8 7.9%	4 4.0%	6 5.9%
	民間工事が ほとんどである	160 100.0%	61 38.1%	34 21.3%	23 14.4%	21 13.1%	7 4.4%	6 3.8%	8 5.0%
	民間工事が多い	188 100.0%	95 50.5%	43 22.9%	16 8.5%	17 9.0%	6 3.2%	6 3.2%	5 2.7%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	78 100.0%	21 26.9%	21 26.9%	11 14.1%	9 11.5%	8 10.3%	5 6.4%	3 3.8%


問 4・5-7_工事の請負額(S A)

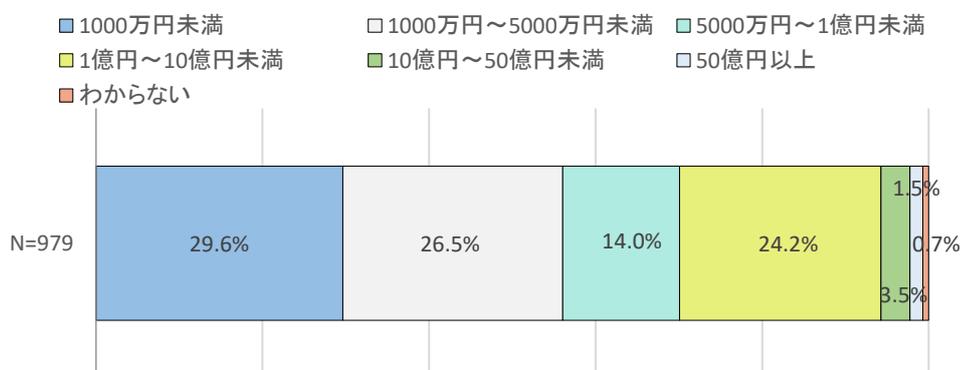

		合計	1000万円未満	1000万円～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1億円～10億円未満	10億円～50億円未満	50億円以上	わからない
全体		979 100.0%	290 29.6%	259 26.5%	137 14.0%	237 24.2%	34 3.5%	15 1.5%	7 0.7%
完工高	5000万円未満	33 100.0%	28 84.8%	4 12.1%	0 0.0%	1 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	5000万円以上 1億円未満	49 100.0%	29 59.2%	13 26.5%	5 10.2%	2 4.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	1億円以上 3億円未満	142 100.0%	91 64.1%	38 26.8%	4 2.8%	5 3.5%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.8%
	3億円以上 5億円未満	85 100.0%	33 38.8%	33 38.8%	10 11.8%	9 10.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	5億円以上 10億円未満	143 100.0%	52 36.4%	55 38.5%	23 16.1%	13 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	10億円以上 30億円未満	201 100.0%	36 17.9%	61 30.3%	41 20.4%	55 27.4%	5 2.5%	2 1.0%	1 0.5%
	30億円以上 50億円未満	57 100.0%	8 14.0%	15 26.3%	11 19.3%	23 40.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	50億円以上	269 100.0%	13 4.8%	40 14.9%	43 16.0%	129 48.0%	29 10.8%	13 4.8%	2 0.7%
	請負階層	元請工事が主	431 100.0%	94 21.8%	102 23.7%	56 13.0%	141 32.7%	26 6.0%	10 2.3%
下請工事 (一次)が主		338 100.0%	123 36.4%	91 26.9%	55 16.3%	60 17.8%	5 1.5%	2 0.6%	2 0.6%
下請工事 (二次以降)が主		55 100.0%	24 43.6%	20 36.4%	9 16.4%	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%
元請・下請工事は ほぼ同程度		155 100.0%	49 31.6%	46 29.7%	17 11.0%	35 22.6%	3 1.9%	3 1.9%	2 1.3%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	96 100.0%	48 50.0%	28 29.2%	7 7.3%	12 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%
	公共工事が多い	201 100.0%	56 27.9%	65 32.3%	38 18.9%	36 17.9%	5 2.5%	0 0.0%	1 0.5%
	民間工事が ほとんどである	211 100.0%	80 37.9%	51 24.2%	23 10.9%	42 19.9%	8 3.8%	6 2.8%	1 0.5%
	民間工事が多い	319 100.0%	56 17.6%	74 23.2%	52 16.3%	110 34.5%	15 4.7%	8 2.5%	4 1.3%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	152 100.0%	50 32.9%	41 27.0%	17 11.2%	37 24.3%	6 3.9%	1 0.7%	0 0.0%

問 4・5-8_工事期間(S A)


■ 3か月未満 □ 3～6か月未満 ■ 6～12か月未満 ■ 12か月以上

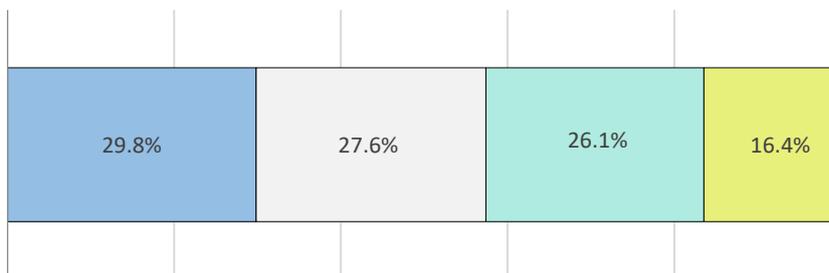

		合計	3か月未満	3～6か月未満	6～12か月未満	12か月以上
全体		979 100.0%	292 29.8%	270 27.6%	256 26.1%	161 16.4%
完工高	5000万円未満	33 100.0%	23 69.7%	9 27.3%	1 3.0%	0 0.0%
	5000万円以上 1億円未満	49 100.0%	16 32.7%	17 34.7%	14 28.6%	2 4.1%
	1億円以上 3億円未満	142 100.0%	78 54.9%	36 25.4%	23 16.2%	5 3.5%
	3億円以上 5億円未満	85 100.0%	35 41.2%	25 29.4%	21 24.7%	4 4.7%
	5億円以上 10億円未満	143 100.0%	56 39.2%	50 35.0%	30 21.0%	7 4.9%
	10億円以上 30億円未満	201 100.0%	48 23.9%	52 25.9%	64 31.8%	37 18.4%
	30億円以上 50億円未満	57 100.0%	14 24.6%	22 38.6%	11 19.3%	10 17.5%
	50億円以上	269 100.0%	22 8.2%	59 21.9%	92 34.2%	96 35.7%
	請負階層	元請工事が主	431 100.0%	107 24.8%	109 25.3%	130 30.2%
下請工事 (一次)が主		338 100.0%	120 35.5%	91 26.9%	77 22.8%	50 14.8%
下請工事 (二次以降)が主		55 100.0%	20 36.4%	22 40.0%	10 18.2%	3 5.5%
元請・下請工事は ほぼ同程度		155 100.0%	45 29.0%	48 31.0%	39 25.2%	23 14.8%
公共・民間工事	公共工事が ほとんどである	96 100.0%	49 51.0%	23 24.0%	16 16.7%	8 8.3%
	公共工事が多い	201 100.0%	57 28.4%	71 35.3%	51 25.4%	22 10.9%
	民間工事が ほとんどである	211 100.0%	86 40.8%	43 20.4%	43 20.4%	39 18.5%
	民間工事が多い	319 100.0%	62 19.4%	85 26.6%	93 29.2%	79 24.8%
公共と民間工事は ほぼ同程度	152 100.0%	38 25.0%	48 31.6%	53 34.9%	13 8.6%	
発注者の属性	不動産業	102 100.0%	21 20.6%	22 21.6%	28 27.5%	31 30.4%
	住宅メーカー	68 100.0%	37 54.4%	12 17.6%	12 17.6%	7 10.3%
	卸売	13 100.0%	4 30.8%	2 15.4%	3 23.1%	4 30.8%
	小売	24 100.0%	10 41.7%	4 16.7%	7 29.2%	3 12.5%
	金融・保険	6 100.0%	2 33.3%	0 0.0%	3 50.0%	1 16.7%
	宿泊・飲食	24 100.0%	7 29.2%	5 20.8%	5 20.8%	7 29.2%
	医療・福祉	64 100.0%	9 14.1%	22 34.4%	20 31.3%	13 20.3%
	学校教育	38 100.0%	6 15.8%	12 31.6%	13 34.2%	7 18.4%
	サービス業 (上記以外)	33 100.0%	9 27.3%	8 24.2%	11 33.3%	5 15.2%
	製造業	151 100.0%	52 34.4%	42 27.8%	38 25.2%	19 12.6%
	運輸・交通	58 100.0%	12 20.7%	8 13.8%	15 25.9%	23 39.7%
	情報通信	21 100.0%	3 14.3%	12 57.1%	4 19.0%	2 9.5%
	電気・ガス・熱供給等	63 100.0%	14 22.2%	17 27.0%	17 27.0%	15 23.8%
	個人	84 100.0%	40 47.6%	29 34.5%	15 17.9%	0 0.0%
	その他	192 100.0%	54 28.1%	60 31.3%	56 29.2%	22 11.5%

問 4・5-9_工期をどのように設定したか(S A)


- 注文者の意向を優先し協議は依頼しなかった
- 注文者の意向が優先され、協議は応じてもらえなかった
- 注文者と協議を行ったが、受注者の要望は受け入れられなかった
- 注文者と協議を行い、受注者の要望も受け入れられた



		合計	協議は依頼しなかった	協議は応じてもらえなかった	協議を行ったが、要望は受け入れられなかった	協議を行い、要望も受け入れられた
全体		979	373	86	82	438
		100.0%	38.1%	8.8%	8.4%	44.7%
完工高	5000万円未満	33	16	4	2	11
		100.0%	48.5%	12.1%	6.1%	33.3%
	5000万円以上 1億円未満	49	18	1	4	26
		100.0%	36.7%	2.0%	8.2%	53.1%
	1億円以上 3億円未満	142	51	12	12	67
		100.0%	35.9%	8.5%	8.5%	47.2%
	3億円以上 5億円未満	85	40	3	7	35
		100.0%	47.1%	3.5%	8.2%	41.2%
	5億円以上 10億円未満	143	52	14	11	66
		100.0%	36.4%	9.8%	7.7%	46.2%
請負階層	10億円以上 30億円未満	201	64	30	16	91
		100.0%	31.8%	14.9%	8.0%	45.3%
	30億円以上 50億円未満	57	19	4	4	30
		100.0%	33.3%	7.0%	7.0%	52.6%
	50億円以上	269	113	18	26	112
		100.0%	42.0%	6.7%	9.7%	41.6%
	元請工事が主	431	129	32	41	229
		100.0%	29.9%	7.4%	9.5%	53.1%
	下請工事 (一次)が主	338	152	36	28	122
		100.0%	45.0%	10.7%	8.3%	36.1%
公共・民間工事の割合	下請工事 (二次以降)が主	55	27	10	5	13
		100.0%	49.1%	18.2%	9.1%	23.6%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	155	65	8	8	74
		100.0%	41.9%	5.2%	5.2%	47.7%
	公共工事が ほとんどである	96	25	6	6	59
		100.0%	26.0%	6.3%	6.3%	61.5%
	公共工事が多い	201	68	16	14	103
		100.0%	33.8%	8.0%	7.0%	51.2%
	民間工事が ほとんどである	211	102	23	12	74
		100.0%	48.3%	10.9%	5.7%	35.1%
発注者の属性	民間工事が多い	319	125	28	36	130
		100.0%	39.2%	8.8%	11.3%	40.8%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	152	53	13	14	72
		100.0%	34.9%	8.6%	9.2%	47.4%
	不動産業	102	36	15	9	42
		100.0%	35.3%	14.7%	8.8%	41.2%
	住宅メーカー	68	38	5	5	20
		100.0%	55.9%	7.4%	7.4%	29.4%
	卸売	13	3	2	0	8
		100.0%	23.1%	15.4%	0.0%	61.5%
	小売	24	10	3	3	8
		100.0%	41.7%	12.5%	12.5%	33.3%
	金融・保険	6	4	1	0	1
		100.0%	66.7%	16.7%	0.0%	16.7%
	宿泊・飲食	24	9	4	4	7
		100.0%	37.5%	16.7%	16.7%	29.2%
	医療・福祉	64	20	10	8	26
		100.0%	31.3%	15.6%	12.5%	40.6%
	学校教育	38	15	1	2	20
	100.0%	39.5%	2.6%	5.3%	52.6%	
サービス業 (上記以外)	33	12	4	2	15	
	100.0%	36.4%	12.1%	6.1%	45.5%	
製造業	151	58	12	16	65	
	100.0%	38.4%	7.9%	10.6%	43.0%	
運輸・交通	58	25	5	2	26	
	100.0%	43.1%	8.6%	3.4%	44.8%	
情報通信	21	8	1	1	11	
	100.0%	38.1%	4.8%	4.8%	52.4%	
電気・ガス・熱供給等	63	24	2	6	31	
	100.0%	38.1%	3.2%	9.5%	49.2%	
個人	84	20	1	8	55	
	100.0%	23.8%	1.2%	9.5%	65.5%	
その他	192	80	13	12	87	
	100.0%	41.7%	6.8%	6.3%	45.3%	

問 4・5-10_当初工期は適切だったか(S A)


- 著しく短い工期の工事だった
- 短い工期の工事だった
- 妥当な工期の工事だった
- 余裕のある工事だった

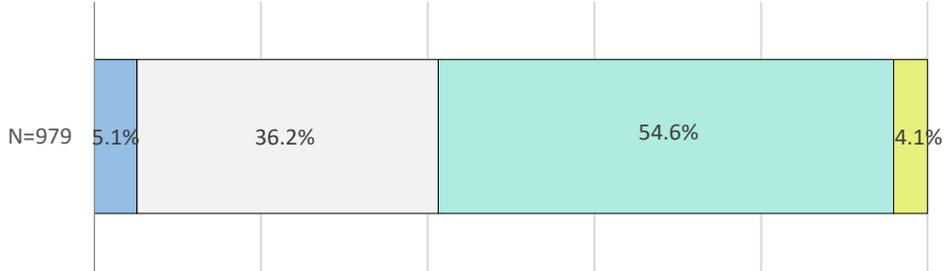

		合計	著しく短い工期の工事だった	短い工期の工事だった	妥当な工期の工事だった	余裕のある工事だった
全体		979	50	354	535	40
		100.0%	5.1%	36.2%	54.6%	4.1%
完工高	5000万円未満	33	1	15	16	1
		100.0%	3.0%	45.5%	48.5%	3.0%
	5000万円以上 1億円未満	49	2	11	31	5
		100.0%	4.1%	22.4%	63.3%	10.2%
	1億円以上 3億円未満	142	9	55	70	8
		100.0%	6.3%	38.7%	49.3%	5.6%
	3億円以上 5億円未満	85	3	36	42	4
		100.0%	3.5%	42.4%	49.4%	4.7%
	5億円以上 10億円未満	143	6	43	88	6
		100.0%	4.2%	30.1%	61.5%	4.2%
請負階層	元請工事が主	201	12	81	99	9
		100.0%	6.0%	40.3%	49.3%	4.5%
	30億円以上 50億円未満	57	4	19	33	1
		100.0%	7.0%	33.3%	57.9%	1.8%
	50億円以上	269	13	94	156	6
	100.0%	4.8%	34.9%	58.0%	2.2%	
公共の割合・民間工事	元請工事が主	431	18	147	255	11
		100.0%	4.2%	34.1%	59.2%	2.6%
	下請工事が主 (一次)が主	338	23	135	160	20
		100.0%	6.8%	39.9%	47.3%	5.9%
発注者の属性	下請工事が主 (二次以降)が主	55	3	23	27	2
		100.0%	5.5%	41.8%	49.1%	3.6%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	155	6	49	93	7
		100.0%	3.9%	31.6%	60.0%	4.5%
	公共工事が ほとんどである	96	1	26	64	5
		100.0%	1.0%	27.1%	66.7%	5.2%
	公共工事が多い	201	11	65	119	6
		100.0%	5.5%	32.3%	59.2%	3.0%
	民間工事が ほとんどである	211	7	79	116	9
		100.0%	3.3%	37.4%	55.0%	4.3%
発注者の属性	民間工事が多い	319	19	132	152	16
		100.0%	6.0%	41.4%	47.6%	5.0%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	152	12	52	84	4
		100.0%	7.9%	34.2%	55.3%	2.6%
	不動産業	102	1	49	47	5
		100.0%	1.0%	48.0%	46.1%	4.9%
	住宅メーカー	68	2	33	31	2
		100.0%	2.9%	48.5%	45.6%	2.9%
	卸売	13	2	5	6	0
		100.0%	15.4%	38.5%	46.2%	0.0%
	小売	24	2	14	8	0
		100.0%	8.3%	58.3%	33.3%	0.0%
	金融・保険	6	0	2	4	0
		100.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%
	宿泊・飲食	24	1	11	11	1
		100.0%	4.2%	45.8%	45.8%	4.2%
	医療・福祉	64	11	24	26	3
		100.0%	17.2%	37.5%	40.6%	4.7%
	学校教育	38	1	18	18	1
		100.0%	2.6%	47.4%	47.4%	2.6%
サービス業 (上記以外)	33	3	12	17	1	
	100.0%	9.1%	36.4%	51.5%	3.0%	
製造業	151	8	57	79	7	
	100.0%	5.3%	37.7%	52.3%	4.6%	
運輸・交通	58	7	15	32	4	
	100.0%	12.1%	25.9%	55.2%	6.9%	
情報通信	21	0	5	14	2	
	100.0%	0.0%	23.8%	66.7%	9.5%	
電気・ガス・熱供給等	63	4	14	45	0	
	100.0%	6.3%	22.2%	71.4%	0.0%	
個人	84	3	20	56	5	
	100.0%	3.6%	23.8%	66.7%	6.0%	
その他	192	4	60	119	9	
	100.0%	2.1%	31.3%	62.0%	4.7%	


問 4・5-11_実際に取得できた休日状況(S A)

■ 4週8休以上 □ 4週7休程度 ■ 4週6休程度 ■ 4週5休程度
■ 4週4休程度以下 □ 不定休 ■ その他

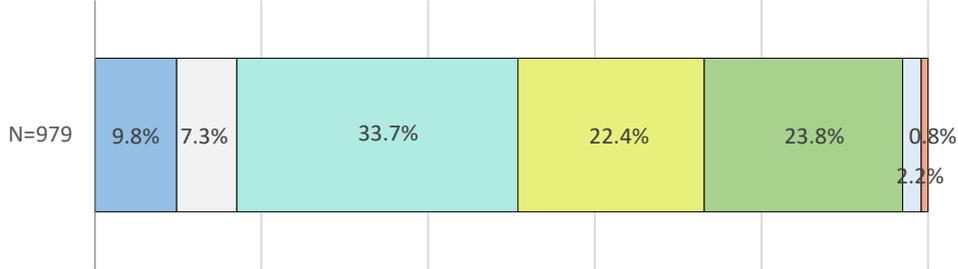


		合計	4週8休以上	4週7休程度	4週6休程度	4週5休程度	4週4休程度以下	不定休	その他
全体		979	96	71	330	219	233	22	8
		100.0%	9.8%	7.3%	33.7%	22.4%	23.8%	2.2%	0.8%
完工高	5000万円未満	33	2	3	12	2	8	6	0
		100.0%	6.1%	9.1%	36.4%	6.1%	24.2%	18.2%	0.0%
	5000万円以上 1億円未満	49	7	2	27	8	2	1	2
		100.0%	14.3%	4.1%	55.1%	16.3%	4.1%	2.0%	4.1%
	1億円以上 3億円未満	142	15	9	46	37	33	1	1
		100.0%	10.6%	6.3%	32.4%	26.1%	23.2%	0.7%	0.7%
	3億円以上 5億円未満	85	7	9	33	17	18	1	0
		100.0%	8.2%	10.6%	38.8%	20.0%	21.2%	1.2%	0.0%
	5億円以上 10億円未満	143	11	10	60	28	31	2	1
		100.0%	7.7%	7.0%	42.0%	19.6%	21.7%	1.4%	0.7%
10億円以上 30億円未満	201	13	15	51	52	61	7	2	
	100.0%	6.5%	7.5%	25.4%	25.9%	30.3%	3.5%	1.0%	
30億円以上 50億円未満	57	7	4	22	11	13	0	0	
	100.0%	12.3%	7.0%	38.6%	19.3%	22.8%	0.0%	0.0%	
50億円以上	269	34	19	79	64	67	4	2	
	100.0%	12.6%	7.1%	29.4%	23.8%	24.9%	1.5%	0.7%	
請負階層	元請工事が主	431	54	30	168	79	93	6	1
		100.0%	12.5%	7.0%	39.0%	18.3%	21.6%	1.4%	0.2%
	下請工事 (一次)が主	338	18	26	85	94	93	15	7
		100.0%	5.3%	7.7%	25.1%	27.8%	27.5%	4.4%	2.1%
下請工事 (二次以降)が主	55	8	1	13	13	20	0	0	
	100.0%	14.5%	1.8%	23.6%	23.6%	36.4%	0.0%	0.0%	
元請・下請工事は ほぼ同程度	155	16	14	64	33	27	1	0	
	100.0%	10.3%	9.0%	41.3%	21.3%	17.4%	0.6%	0.0%	
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	96	22	7	52	5	9	1	0
		100.0%	22.9%	7.3%	54.2%	5.2%	9.4%	1.0%	0.0%
	公共工事が多い	201	22	17	74	33	48	4	3
		100.0%	10.9%	8.5%	36.8%	16.4%	23.9%	2.0%	1.5%
	民間工事が ほとんどである	211	16	14	60	56	54	10	1
	100.0%	7.6%	6.6%	28.4%	26.5%	25.6%	4.7%	0.5%	
民間工事が多い	319	21	21	93	82	91	7	4	
	100.0%	6.6%	6.6%	29.2%	25.7%	28.5%	2.2%	1.3%	
公共と民間工事は ほぼ同程度	152	15	12	51	43	31	0	0	
	100.0%	9.9%	7.9%	33.6%	28.3%	20.4%	0.0%	0.0%	
発注者の属性	不動産業	102	5	7	31	26	30	1	2
		100.0%	4.9%	6.9%	30.4%	25.5%	29.4%	1.0%	2.0%
	住宅メーカー	68	4	8	21	17	14	4	0
		100.0%	5.9%	11.8%	30.9%	25.0%	20.6%	5.9%	0.0%
	卸売	13	0	1	5	4	3	0	0
		100.0%	0.0%	7.7%	38.5%	30.8%	23.1%	0.0%	0.0%
	小売	24	1	1	3	5	12	1	1
		100.0%	4.2%	4.2%	12.5%	20.8%	50.0%	4.2%	4.2%
	金融・保険	6	0	1	3	1	1	0	0
		100.0%	0.0%	16.7%	50.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%
	宿泊・飲食	24	4	0	4	3	13	0	0
		100.0%	16.7%	0.0%	16.7%	12.5%	54.2%	0.0%	0.0%
	医療・福祉	64	2	0	16	15	28	3	0
		100.0%	3.1%	0.0%	25.0%	23.4%	43.8%	4.7%	0.0%
	学校教育	38	4	2	9	9	14	0	0
		100.0%	10.5%	5.3%	23.7%	23.7%	36.8%	0.0%	0.0%
	サービス業 (上記以外)	33	2	2	10	7	10	2	0
		100.0%	6.1%	6.1%	30.3%	21.2%	30.3%	6.1%	0.0%
	製造業	151	13	10	53	36	35	4	0
		100.0%	8.6%	6.6%	35.1%	23.8%	23.2%	2.6%	0.0%
運輸・交通	58	8	4	21	16	8	1	0	
	100.0%	13.8%	6.9%	36.2%	27.6%	13.8%	1.7%	0.0%	
情報通信	21	4	5	2	5	4	1	0	
	100.0%	19.0%	23.8%	9.5%	23.8%	19.0%	4.8%	0.0%	
電気・ガス・熱供給等	63	8	10	20	15	10	0	0	
	100.0%	12.7%	15.9%	31.7%	23.8%	15.9%	0.0%	0.0%	
個人	84	10	10	37	12	11	1	3	
	100.0%	11.9%	11.9%	44.0%	14.3%	13.1%	1.2%	3.6%	
その他	192	26	8	82	39	33	2	2	
	100.0%	13.5%	4.2%	42.7%	20.3%	17.2%	1.0%	1.0%	

問 4・5-12_工期変更を提案したのはだれか(S A)

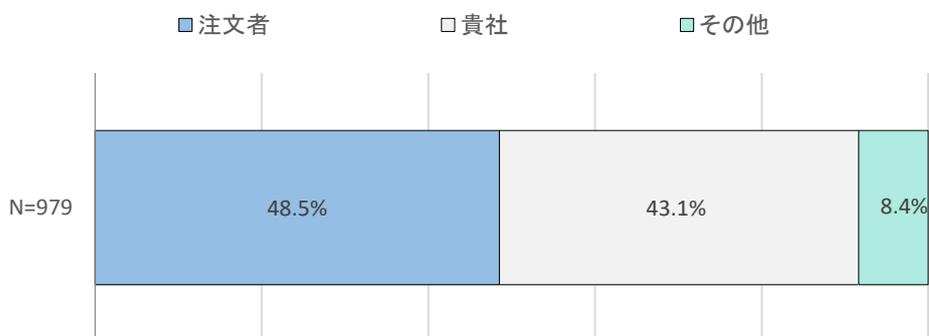

		合計	注文者	貴社	その他	
全体		979	475	422	82	
		100.0%	48.5%	43.1%	8.4%	
完工高	5000万円未満	33	16	9	8	
		100.0%	48.5%	27.3%	24.2%	
	5000万円以上 1億円未満	49	25	23	1	
		100.0%	51.0%	46.9%	2.0%	
	1億円以上 3億円未満	142	71	52	19	
		100.0%	50.0%	36.6%	13.4%	
	3億円以上 5億円未満	85	46	31	8	
		100.0%	54.1%	36.5%	9.4%	
	5億円以上 10億円未満	143	66	67	10	
	100.0%	46.2%	46.9%	7.0%		
請負階層	10億円以上 30億円未満	201	90	97	14	
		100.0%	44.8%	48.3%	7.0%	
	30億円以上 50億円未満	57	34	21	2	
		100.0%	59.6%	36.8%	3.5%	
	50億円以上	269	127	122	20	
	100.0%	47.2%	45.4%	7.4%		
公共・ 割民間 工事	元請工事が主	431	165	252	14	
		100.0%	38.3%	58.5%	3.2%	
	下請工事 (一次)が主	338	210	88	40	
		100.0%	62.1%	26.0%	11.8%	
発注者の 属性	下請工事 (二次以降)が主	55	36	7	12	
		100.0%	65.5%	12.7%	21.8%	
	元請・下請工事は ほぼ同程度	155	64	75	16	
		100.0%	41.3%	48.4%	10.3%	
	公共工事が ほとんどである	96	35	57	4	
	100.0%	36.5%	59.4%	4.2%		
発注者の 属性	公共工事が多い	201	93	94	14	
		100.0%	46.3%	46.8%	7.0%	
	民間工事が ほとんどである	211	128	64	19	
		100.0%	60.7%	30.3%	9.0%	
	民間工事が多い	319	144	142	33	
		100.0%	45.1%	44.5%	10.3%	
	公共と民間工事は ほぼ同程度	152	75	65	12	
		100.0%	49.3%	42.8%	7.9%	
	発注者の 属性	不動産業	102	43	47	12
			100.0%	42.2%	46.1%	11.8%
		住宅メーカー	68	34	28	6
			100.0%	50.0%	41.2%	8.8%
		卸売	13	4	9	0
			100.0%	30.8%	69.2%	0.0%
		小売	24	15	8	1
			100.0%	62.5%	33.3%	4.2%
金融・保険		6	4	1	1	
		100.0%	66.7%	16.7%	16.7%	
宿泊・飲食		24	14	6	4	
		100.0%	58.3%	25.0%	16.7%	
医療・福祉		64	27	34	3	
		100.0%	42.2%	53.1%	4.7%	
学校教育		38	17	15	6	
		100.0%	44.7%	39.5%	15.8%	
サービス業 (上記以外)	33	18	11	4		
	100.0%	54.5%	33.3%	12.1%		
製造業	151	81	62	8		
	100.0%	53.6%	41.1%	5.3%		
運輸・交通	58	33	23	2		
	100.0%	56.9%	39.7%	3.4%		
情報通信	21	14	5	2		
	100.0%	66.7%	23.8%	9.5%		
電気・ガス・熱供給等	63	35	21	7		
	100.0%	55.6%	33.3%	11.1%		
個人	84	21	58	5		
	100.0%	25.0%	69.0%	6.0%		
その他	192	97	80	15		
	100.0%	50.5%	41.7%	7.8%		

問 4・5-13_工期が変更された理由(MA)

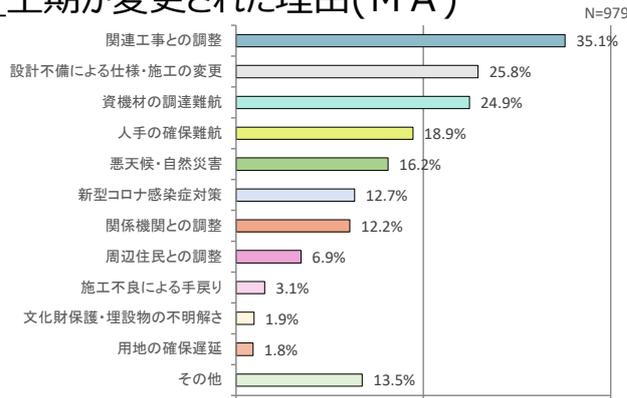

属性	項目	合計	理由												
			設計不備による仕様・施工の変更	資機材の調達難航	人手の確保難航	関連工事との調整	周辺住民との調整	関係機関との調整	用地の確保遅延	文化財保護・埋設物の不明解さ	自然災害	悪天候・自然災害	新型コロナウイルス感染症対策	施工不良による手戻り	その他
完工高	全体	979	25.3%	24.9%	18.5%	34.4%	6.8%	11.9%	1.8%	1.9%	15.9%	12.4%	3.0%	13.2%	
	5000万円未満	33	6.1%	10.0%	10.0%	12.0%	1.0%	3.0%	0.0%	0.0%	8.0%	3.0%	1.0%	2.0%	
	5000万円以上1億円未満	49	13.0%	16.0%	13.0%	25.0%	7.0%	6.0%	1.0%	0.0%	19.0%	10.0%	2.0%	5.0%	
	1億円以上3億円未満	142	42.0%	30.0%	26.0%	52.0%	10.0%	18.0%	2.0%	0.0%	37.0%	26.0%	6.0%	10.0%	
	3億円以上5億円未満	85	24.0%	12.0%	23.0%	29.0%	7.0%	12.0%	0.0%	1.0%	24.0%	12.0%	3.0%	4.0%	
	5億円以上10億円未満	143	35.0%	48.0%	30.0%	51.0%	10.0%	11.0%	2.0%	2.0%	28.0%	19.0%	1.0%	14.0%	
	10億円以上30億円未満	201	56.0%	60.0%	49.0%	69.0%	14.0%	18.0%	5.0%	2.0%	23.0%	23.0%	3.0%	28.0%	
	30億円以上50億円未満	57	14.0%	17.0%	8.0%	20.0%	1.0%	10.0%	0.0%	2.0%	4.0%	5.0%	3.0%	7.0%	
	50億円以上	269	67.0%	51.0%	26.0%	86.0%	18.0%	41.0%	8.0%	12.0%	16.0%	26.0%	11.0%	62.0%	
	請負階層	元請工事が主	431	103.0%	110.0%	60.0%	129.0%	30.0%	65.0%	9.0%	9.0%	70.0%	31.0%	6.0%	81.0%
下請工事が主(一次)		338	92.0%	75.0%	90.0%	136.0%	20.0%	34.0%	5.0%	7.0%	52.0%	16.0%	36.0%		
下請工事が主(二次以降)		55	19.0%	13.0%	11.0%	37.0%	2.0%	5.0%	0.0%	0.0%	6.0%	3.0%	4.0%		
元請・下請工事はほぼ同程度		155	39.0%	46.0%	24.0%	42.0%	16.0%	15.0%	4.0%	3.0%	31.0%	22.0%	5.0%	11.0%	
公共工事が多い		201	46.0%	43.0%	25.0%	77.0%	18.0%	32.0%	4.0%	1.0%	36.0%	12.0%	5.0%	29.0%	
公共の割合	公共工事がほとんどである	96	16.7%	21.0%	20.0%	31.0%	11.0%	13.0%	4.0%	2.0%	30.0%	5.0%	1.0%	10.0%	
	民間工事がほとんどである	211	58.0%	48.0%	46.0%	81.0%	10.0%	20.0%	1.0%	2.0%	29.0%	42.0%	9.0%	24.0%	
	民間工事が多い	319	93.0%	93.0%	73.0%	111.0%	27.0%	37.0%	1.0%	12.0%	43.0%	38.0%	9.0%	45.0%	
	公共と民間工事はほぼ同程度	152	40.0%	39.0%	21.0%	44.0%	2.0%	17.0%	8.0%	2.0%	21.0%	27.0%	6.0%	24.0%	
	その他	102	28.0%	28.0%	29.0%	35.0%	17.0%	5.0%	3.0%	6.0%	12.0%	13.0%	5.0%	17.0%	
発注者の属性	不動産業	102	27.5%	27.5%	28.4%	34.3%	16.7%	4.9%	2.9%	5.9%	11.8%	12.7%	4.9%	16.7%	
	住宅メーカー	68	20.6%	18.0%	25.0%	23.0%	8.8%	10.3%	1.5%	1.5%	25.0%	16.2%	2.9%	8.8%	
	卸売	13	8.0%	5.0%	4.0%	5.0%	2.0%	1.0%	1.0%	0.0%	7.7%	15.4%	7.7%	7.7%	
	小売	24	7.0%	7.0%	8.3%	6.0%	1.0%	6.0%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%	0.0%	20.8%	
	金融・保険	6	0.0%	1.0%	0.0%	4.0%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	
	宿泊・飲食	24	8.0%	3.0%	4.0%	6.0%	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	20.8%	0.0%	20.8%	
	医療・福祉	64	22.0%	23.0%	34.4%	21.0%	9.4%	28.1%	3.1%	4.7%	6.3%	10.9%	7.8%	7.8%	
	学校教育	38	12.0%	9.0%	11.0%	13.0%	2.0%	3.0%	0.0%	2.6%	10.5%	10.5%	10.5%	15.8%	
	サービス業(上記以外)	33	6.0%	6.0%	5.0%	14.0%	0.0%	7.0%	1.0%	0.0%	12.1%	18.2%	3.0%	15.2%	
	製造業	151	41.0%	39.0%	20.0%	54.0%	1.0%	17.0%	0.0%	1.3%	12.6%	15.2%	0.7%	18.5%	
	運輸・交通	58	14.0%	8.0%	5.0%	21.0%	2.0%	11.0%	3.0%	5.2%	3.4%	8.6%	1.7%	12.1%	
	情報通信	21	5.0%	5.0%	2.0%	7.0%	0.0%	9.5%	9.5%	0.0%	4.8%	19.0%	4.8%	19.0%	
	電気・ガス・熱供給等	63	23.0%	13.0%	5.0%	30.0%	9.0%	10.0%	3.0%	0.0%	15.9%	17.5%	1.6%	11.1%	
	個人	84	13.0%	34.0%	20.0%	17.0%	7.0%	1.0%	0.0%	1.2%	27.4%	7.1%	1.2%	13.1%	
	その他	192	43.0%	33.0%	32.0%	75.0%	11.0%	23.0%	2.0%	2.0%	47.0%	18.0%	6.0%	23.0%	

「その他」の記述から

1.追加工事・工事内容の変更

改修工事で、工事途中に新たな修理箇所が出てきたため[2~4人/元請工事が主である]

追加工事[10~29人/元請工事が主である]

追加・変更[10~29人/元請工事が主である]

仕様の変更[10~29人/元請工事が主である]

追加工事[10~29人/元請工事が主である]

仕様変更[10~29人/下請工事（一次）が主である]

工事追加に伴い[10~29人/下請工事（一次）が主である]

追加変更による[10~29人/下請工事（二次以降）が主である]

施工量の増加[30~99人/元請工事が主である]

仕様・施工の変更[30~99人/元請工事が主である]

追加工事の発生[30~99人/元請工事が主である]

仕様変更[30~99人/元請工事が主である]

追加工事[30~99人/元請工事が主である]

追加工事の発生[30~99人/元請工事が主である]

追加工事の発生[100~299人/元請工事が主である]

工事数量の増工による工期延長[100~299人/元請工事が主である]

追加工事発生[100~299人/元請工事が主である]

追加工事[100~299人/元請工事が主である]

追加工事[100~299人/元請工事が主である]

設計内容の変更の為[100~299人/元請工事が主である]

変更追加[100~299人/元請工事が主である]

追加工事[100~299人/元請工事が主である]

追加工事[100~299人/下請工事（一次）が主である]

追加の作業[100~299人/下請工事（一次）が主である]

杭数量増加[100~299人/下請工事（一次）が主である]

追加工事の対応[300~499人/下請工事（一次）が主である]

工事内容変更[500~999人/元請工事が主である]

追加工事の受注[500~999人/元請工事が主である]

工事内容変更[500~999人/元請工事が主である]

追加工事の受注[500~999人/元請工事が主である]

追加工事など[500~999人/元請工事が主である]

追加工事[500~999人/下請工事（一次）が主である]

工事内容の一部変更[500~999人/下請工事（一次）が主である]

工事内容の一部変更[500~999人/下請工事（一次）が主である]

追加工事の増加[1,000人以上/元請工事が主である]

仕様の変更[1,000人以上/元請工事が主である]

計画の変更[1,000人以上/元請工事が主である]

追加工種のため[1,000人以上/元請工事が主である]

潮間作業及び施主着棧船舶日程変更のため[1,000人以上/元請工

事が主である]

仕様変更（工事量増加）に伴う変更[1,000人以上/元請工事が主である]

設計変更：擁壁の追加[1,000人以上/元請工事が主である]

追加工事による[1,000人以上/元請工事が主である]

設計変更[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

追加工事による[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

2.前工程の遅延や不備

前工程が遅れた為工期がずれた[5~9人/下請工事（一次）が主である]

前工程遅延による工期変更[5~9人/下請工事（一次）が主である]

建築躯体工事の遅れ[10~29人/下請工事（一次）が主である]

設計漏れの対応[30~99人/元請工事が主である]

元請の工程遅延[100~299人/元請工事が主である]

事前作業の不備[100~299人/下請工事（二次以降）が主である]

元請施工の事故[300~499人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

建築工程の遅れ[300~499人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

着工遅れ、別途機器の搬入のため[500~999人/元請工事が主である]

当社が乗り込み前に発注者にて撤去すべきケーブルが残置されており、当社が解体工事に着手できなかった。[1,000人以上/元請工事が主である]

建築工事の遅延による突貫工事の発生[1,000人以上/下請工事（一次）が主である]

建築工事の遅れ[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

建築工事の遅れ[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

建築工程の遅延[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

3.地盤や地中障害

自然環境[10~29人/元請工事が主である]

解体時に発見されたアスベスト除去工事の追加[10~29人/下請工事（一次）が主である]

掘削時に大量に湧水が発生した[10~29人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

陥没の発生[30~99人/元請工事が主である]

地盤状況による[100~299人/下請工事（一次）が主である]

アスベスト除去[300~499人/元請工事が主である]

地中障害物撤去[1,000人以上/元請工事が主である]

地中障害[1,000人以上/元請工事が主である]

地中障害[1,000人以上/下請工事（一次）が主である]

4.施主・発注者の都合

元請の意向[1人/下請工事（一次）が主である]

建築業者側の勝手な都合[5~9人/下請工事(二次以降)が主である]

施主の工期短縮要望[10~29人/元請工事が主である]

施主の希望[10~29人/元請工事が主である]

注文者の意思決定の遅延[10~29人/元請工事が主である]

施主の都合[10~29人/下請工事(一次)が主である]

施主の都合[10~29人/下請工事(一次)が主である]

コロナのためオープンを延期[10~29人/下請工事(二次以降)が主である]

注文者による[30~99人/元請工事が主である]

施主都合[30~99人/下請工事(一次)が主である]

施主死亡により、一時中断[30~99人/下請工事(一次)が主である]

施主がオープン日を早めに設定[30~99人/下請工事(一次)が主である]

お客様営業日の都合[100~299人/元請工事が主である]

改修工事による施設の都合[100~299人/元請工事が主である]

施主都合による[500~999人/下請工事(一次)が主である]

注文者の都合[1,000人以上/元請工事が主である]

注文者運営都合[1,000人以上/元請工事が主である]

発注者から倉庫稼働を1か月前倒しする要望があったため[1,000人以上/元請工事が主である]

発注者都合[1,000人以上/元請工事が主である]

発注者都合[1,000人以上/元請工事が主である]

注文者の都合[1,000人以上/元請工事が主である]

施主の都合による[1,000人以上/元請工事が主である]

施主の意向[1,000人以上/元請工事が主である]

注文者都合による変更[1,000人以上/下請工事(一次)が主である]

5.その他

当初の工期設定[10~29人/元請工事が主である]

コロナが発生した為[10~29人/下請工事(一次)が主である]

工程管理見通しの甘さ[10~29人/下請工事(一次)が主である]

第三者(学生)を優先したため[30~99人/元請工事が主である]

書類提出後、発注者が県外にある親会社に確認をする度に遅れが生じたため。[30~99人/元請工事が主である]

植生工事が真夏になり施工不良の可能性が高くなり気温が下がり雨の降る秋まで協議の上、延ばしてもらった。[30~99人/元請工事が主である]

主要工種の増額[30~99人/元請工事が主である]

自然保護(鳥類)によるもの[30~99人/元請工事が主である]

納入機器の納入遅延による[30~99人/下請工事(一次)が主である]

予算合わずコスト見直し[100~299人/元請工事が主である]

リフォームの着工を梅雨明けにして欲しいとの要望及び施主のこだわりが強く、中程度の品質を理解してもらえなかった為。[100~299人/元請工事が主である]

補助金の交付が年度半ばに決定され、設計されている建設工事を完成する事が出来ない為[100~299人/元請工事が主である]

追加変更時に対する工期延長を提案[100~299人/元請工事が主である]

建物入居企業との調整[100~299人/元請工事が主である]

補助金の交付が年度半ばに決定され、設計されている建設工事を完成する事が出来ない為[100~299人/元請工事が主である]

建設計画の曖昧さ[100~299人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

役所許可が下りなかった[300~499人/元請工事が主である]

客先の理由 オープン時期の変更[500~999人/元請工事が主である]

報告書作成期間を見込んだ[500~999人/元請工事が主である]

報告書の作成[500~999人/元請工事が主である]


販売状況による1日程度の変更[1,000人以上/元請工事が主である]

元々工期が短かった[1,000人以上/元請工事が主である]

販売状況による日程変更(1日程度)[1,000人以上/元請工事が主である]


前倒し完工[1,000人以上/元請工事が主である]

問 4・5-14_変更後の工期に関する評価(S A)

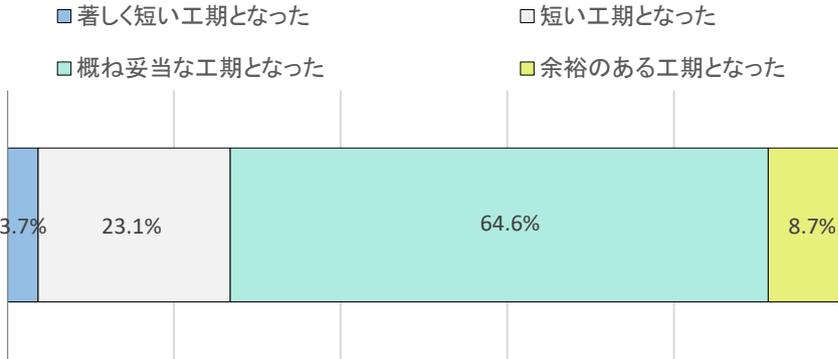


		合計	著しく短い工期となった	短い工期となった	概ね妥当な工期となった	余裕のある工期となった
全体		979	36	226	632	85
		100.0%	3.7%	23.1%	64.6%	8.7%
完工高	5000 万円未満	33	0	10	20	3
		100.0%	0.0%	30.3%	60.6%	9.1%
	5000 万円以上 1 億円未満	49	0	7	36	6
		100.0%	0.0%	14.3%	73.5%	12.2%
	1 億円以上 3 億円未満	142	9	34	86	13
		100.0%	6.3%	23.9%	60.6%	9.2%
	3 億円以上 5 億円未満	85	3	28	43	11
		100.0%	3.5%	32.9%	50.6%	12.9%
	5 億円以上 10 億円未満	143	7	30	95	11
	100.0%	4.9%	21.0%	66.4%	7.7%	
請負階層	10 億円以上 30 億円未満	201	7	46	125	23
		100.0%	3.5%	22.9%	62.2%	11.4%
	30 億円以上 50 億円未満	57	4	10	39	4
		100.0%	7.0%	17.5%	68.4%	7.0%
	50 億円以上	269	6	61	188	14
	100.0%	2.2%	22.7%	69.9%	5.2%	
公共の 割合・民間 工事	元請工事が主	431	8	73	311	39
		100.0%	1.9%	16.9%	72.2%	9.0%
	下請工事 (一次) が主	338	19	102	190	27
		100.0%	5.6%	30.2%	56.2%	8.0%
発注者の 属性	下請工事 (二次以降) が主	55	5	23	18	9
		100.0%	9.1%	41.8%	32.7%	16.4%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	155	4	28	113	10
		100.0%	2.6%	18.1%	72.9%	6.5%
	公共工事が ほとんどである	96	1	12	71	12
		100.0%	1.0%	12.5%	74.0%	12.5%
	公共工事が多い	201	7	39	142	13
		100.0%	3.5%	19.4%	70.6%	6.5%
	民間工事が ほとんどである	211	7	63	124	17
		100.0%	3.3%	29.9%	58.8%	8.1%
民間工事が多い	319	17	82	195	25	
	100.0%	5.3%	25.7%	61.1%	7.8%	
公共と民間工事は ほぼ同程度	152	4	30	100	18	
	100.0%	2.6%	19.7%	65.8%	11.8%	
発注者の 属性	不動産業	102	2	36	58	6
		100.0%	2.0%	35.3%	56.9%	5.9%
	住宅メーカー	68	3	23	40	2
		100.0%	4.4%	33.8%	58.8%	2.9%
	卸売	13	1	1	10	1
		100.0%	7.7%	7.7%	76.9%	7.7%
	小売	24	0	10	13	1
		100.0%	0.0%	41.7%	54.2%	4.2%
	金融・保険	6	1	1	4	0
		100.0%	16.7%	16.7%	66.7%	0.0%
	宿泊・飲食	24	1	11	8	4
		100.0%	4.2%	45.8%	33.3%	16.7%
	医療・福祉	64	9	21	30	4
		100.0%	14.1%	32.8%	46.9%	6.3%
	学校教育	38	2	6	22	8
		100.0%	5.3%	15.8%	57.9%	21.1%
	サービス業 (上記以外)	33	2	9	20	2
	100.0%	6.1%	27.3%	60.6%	6.1%	
製造業	151	7	33	93	18	
	100.0%	4.6%	21.9%	61.6%	11.9%	
運輸・交通	58	1	10	45	2	
	100.0%	1.7%	17.2%	77.6%	3.4%	
情報通信	21	1	3	17	0	
	100.0%	4.8%	14.3%	81.0%	0.0%	
電気・ガス・熱供給等	63	0	8	50	5	
	100.0%	0.0%	12.7%	79.4%	7.9%	
個人	84	2	12	62	8	
	100.0%	2.4%	14.3%	73.8%	9.5%	
その他	192	2	32	137	21	
	100.0%	1.0%	16.7%	71.4%	10.9%	

問 4・5-15_工期変更に対して工事費は増加したか(S A)

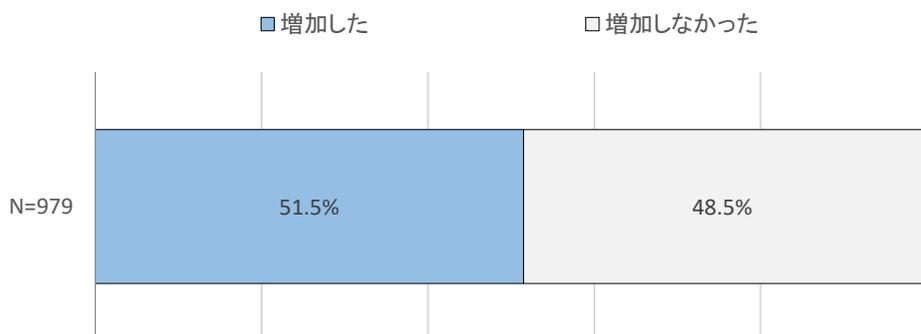

		合計	増加した	増加しなかった	
全体		979 100.0%	504 51.5%	475 48.5%	
完工高	5000 万円未満	33 100.0%	10 30.3%	23 69.7%	
	5000 万円以上 1 億円未満	49 100.0%	20 40.8%	29 59.2%	
	1 億円以上 3 億円未満	142 100.0%	43 30.3%	99 69.7%	
	3 億円以上 5 億円未満	85 100.0%	40 47.1%	45 52.9%	
	5 億円以上 10 億円未満	143 100.0%	75 52.4%	68 47.6%	
	10 億円以上 30 億円未満	201 100.0%	104 51.7%	97 48.3%	
	30 億円以上 50 億円未満	57 100.0%	36 63.2%	21 36.8%	
	50 億円以上	269 100.0%	176 65.4%	93 34.6%	
	請負階層	元請工事が主	431 100.0%	240 55.7%	191 44.3%
		下請工事 (一次) が主	338 100.0%	157 46.4%	181 53.6%
下請工事 (二次以降) が主		55 100.0%	35 63.6%	20 36.4%	
元請・下請工事は ほぼ同程度		155 100.0%	72 46.5%	83 53.5%	
公共・民間 の割合 工事	公共工事が ほとんどである	96 100.0%	34 35.4%	62 64.6%	
	公共工事が多い	201 100.0%	111 55.2%	90 44.8%	
	民間工事が ほとんどである	211 100.0%	115 54.5%	96 45.5%	
	民間工事が多い	319 100.0%	182 57.1%	137 42.9%	
発注者の 属性	公共と民間工事は ほぼ同程度	152 100.0%	62 40.8%	90 59.2%	
	不動産業	102 100.0%	69 67.6%	33 32.4%	
	住宅メーカー	68 100.0%	27 39.7%	41 60.3%	
	卸売	13 100.0%	8 61.5%	5 38.5%	
	小売	24 100.0%	12 50.0%	12 50.0%	
	金融・保険	6 100.0%	1 16.7%	5 83.3%	
	宿泊・飲食	24 100.0%	11 45.8%	13 54.2%	
	医療・福祉	64 100.0%	38 59.4%	26 40.6%	
	学校教育	38 100.0%	19 50.0%	19 50.0%	
	サービス業 (上記以外)	33 100.0%	15 45.5%	18 54.5%	
	製造業	151 100.0%	77 51.0%	74 49.0%	
	運輸・交通	58 100.0%	32 55.2%	26 44.8%	
	情報通信	21 100.0%	11 52.4%	10 47.6%	
	電気・ガス・熱供給等	63 100.0%	41 65.1%	22 34.9%	
	個人	84 100.0%	32 38.1%	52 61.9%	
	その他	192 100.0%	100 52.1%	92 47.9%	

問 4・5-16_工事費が増加した要因(MA)

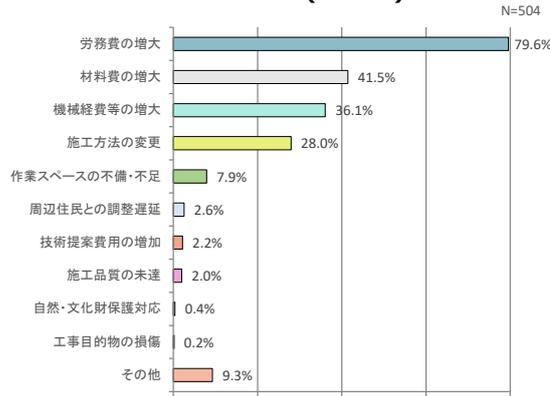

	合計	労務費の増大	機械経費等の増大	材料費の増大	施工方法の変更	作業スペースの不備・不足	周辺住民との調整遅延	自然・文化財保護対応	技術提案費用の増加	施工品質の未達	工事目的物の損傷	その他	
全体	504 100.0%	401 79.6%	182 36.1%	209 41.5%	141 28.0%	40 7.9%	13 2.6%	2 0.4%	11 2.2%	10 2.0%	1 0.2%	47 9.3%	
完工高	5000万円未満	10 100.0%	9 90.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 10.0%	
	5000万円以上 1億円未満	20 100.0%	16 80.0%	10 50.0%	6 30.0%	5 25.0%	2 10.0%	1 5.0%	2 10.0%	2 10.0%	0 0.0%	1 5.0%	
	1億円以上 3億円未満	43 100.0%	38 88.4%	11 25.6%	23 53.5%	18 41.9%	3 7.0%	1 2.3%	1 2.3%	2 4.7%	0 0.0%	1 2.3%	
	3億円以上 5億円未満	40 100.0%	37 92.5%	9 22.5%	18 45.0%	13 32.5%	4 10.0%	1 2.5%	2 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.5%	
	5億円以上 10億円未満	75 100.0%	62 82.7%	21 28.0%	33 44.0%	22 29.3%	2 2.7%	0 0.0%	1 1.3%	1 1.3%	0 0.0%	3 4.0%	
	10億円以上 30億円未満	104 100.0%	85 81.7%	36 34.6%	48 46.2%	32 30.8%	8 7.7%	4 3.8%	0 0.0%	2 1.9%	1 1.0%	0 0.0%	7 6.7%
	30億円以上 50億円未満	36 100.0%	30 83.3%	18 50.0%	16 44.4%	4 11.1%	1 2.8%	2 5.6%	0 0.0%	0 0.0%	4 11.1%	0 0.0%	2 5.6%
	50億円以上	176 100.0%	124 70.5%	77 43.8%	65 36.9%	47 26.7%	19 10.8%	4 2.3%	0 0.0%	3 1.7%	0 0.0%	1 0.6%	31 17.6%
	請負階層	元請工事が主	240 100.0%	176 73.3%	107 44.6%	98 40.8%	75 31.3%	13 5.4%	9 3.8%	2 0.8%	5 2.1%	1 0.4%	24 10.0%
		下請工事 (一次)が主	157 100.0%	138 87.9%	56 35.7%	67 42.7%	41 26.1%	18 11.5%	2 1.3%	4 2.5%	6 3.8%	0 0.0%	9 5.7%
下請工事 (二次以降)が主		35 100.0%	34 97.1%	4 11.4%	15 42.9%	8 22.9%	6 17.1%	1 2.9%	1 2.9%	2 5.7%	0 0.0%	0 0.0%	
元請・下請工事は ほぼ同程度		72 100.0%	53 73.6%	15 20.8%	29 40.3%	17 23.6%	3 4.2%	1 1.4%	0 0.0%	1 1.4%	1 0.0%	0 0.0%	14 19.4%
公共・民間工事	公共工事が ほとんどである	34 100.0%	24 70.6%	14 41.2%	14 41.2%	13 38.2%	4 11.8%	2 5.9%	1 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	3 8.8%	
	公共工事が多い	111 100.0%	80 72.1%	55 49.5%	42 37.8%	34 30.6%	1 0.9%	4 3.6%	2 1.8%	1 0.9%	1 0.9%	14 12.6%	
	民間工事が ほとんどである	115 100.0%	98 85.2%	28 24.3%	47 40.9%	30 26.1%	8 7.0%	0 0.0%	5 4.3%	3 2.6%	0 0.0%	8 7.0%	
	民間工事が多い	182 100.0%	152 83.5%	71 39.0%	84 46.2%	49 26.9%	21 11.5%	6 3.3%	4 2.2%	5 2.7%	0 0.0%	15 8.2%	
	公共と民間工事は ほぼ同程度	62 100.0%	47 75.8%	14 22.6%	22 35.5%	15 24.2%	6 9.7%	1 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	7 11.3%
発注者の属性	不動産業	69 100.0%	53 76.8%	22 31.9%	21 30.4%	19 27.5%	5 7.2%	6 8.7%	0 0.0%	0 0.0%	4 5.8%	0 0.0%	10 14.5%
	住宅メーカー	27 100.0%	22 81.5%	7 25.9%	10 37.0%	7 25.9%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 3.7%
	卸売	8 100.0%	7 87.5%	4 50.0%	5 62.5%	3 37.5%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	0 0.0%	1 12.5%
	小売	12 100.0%	9 75.0%	4 33.3%	4 33.3%	3 25.0%	1 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 25.0%
	金融・保険	1 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	宿泊・飲食	11 100.0%	10 90.9%	2 18.2%	5 45.5%	4 36.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	医療・福祉	38 100.0%	33 86.8%	11 28.9%	20 52.6%	8 21.1%	3 7.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.6%	1 2.6%	0 0.0%	2 5.3%
	学校教育	19 100.0%	15 78.9%	8 42.1%	7 36.8%	5 26.3%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	0 0.0%	0 0.0%	3 15.8%
	サービス業 (上記以外)	15 100.0%	13 86.7%	5 33.3%	8 53.3%	3 20.0%	4 26.7%	0 0.0%	0 0.0%	1 6.7%	1 6.7%	0 0.0%	2 13.3%
	製造業	77 100.0%	62 80.5%	29 37.7%	28 36.4%	19 24.7%	7 9.1%	1 1.3%	0 0.0%	2 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	8 10.4%
	運輸・交通	32 100.0%	18 56.3%	17 53.1%	11 34.4%	11 34.4%	4 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.1%	0 0.0%	1 3.1%	1 3.1%
	情報通信	11 100.0%	9 81.8%	4 36.4%	4 36.4%	7 63.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	2 18.2%
	電気・ガス・熱供給等	41 100.0%	37 90.2%	20 48.8%	23 56.1%	15 36.6%	2 4.9%	2 4.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 7.3%
	個人	32 100.0%	26 81.3%	6 18.8%	16 50.0%	9 28.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.1%	1 3.1%	0 0.0%	2 6.3%
	その他	100 100.0%	76 76.0%	38 38.0%	41 41.0%	25 25.0%	8 8.0%	2 2.0%	2 2.0%	2 2.0%	1 1.0%	0 0.0%	9 9.0%

「その他」の記述から

1.追加工事・工事内容の変更にもなった費用の増大

追加工事[10～29人/元請工事が主である]

追加工事[10～29人/元請工事が主である]

工種（地盤改良工）の追加[10～29人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

施工工種の追加[30～99人/元請工事が主である]

施工量の増加[30～99人/元請工事が主である]

追加工事分[30～99人/元請工事が主である]

追加工事による増加[30～99人/元請工事が主である]

除雪費用[30～99人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

工事数量の増工による増額[100～299人/元請工事が主である]

追加工事分の資材・労務費・経費の増大[100～299人/元請工事が主である]

工事が追加になった[100～299人/元請工事が主である]

工事が追加になった[100～299人/元請工事が主である]

追加作業[100～299人/下請工事（一次）が主である]

追加 アスベスト除去[300～499人/元請工事が主である]

施主の追加工事要望[300～499人/下請工事（一次）が主である]

追加工事の受注[500～999人/元請工事が主である]

追加工事の受注[500～999人/元請工事が主である]

工事内容の一部変更[500～999人/下請工事（一次）が主である]

工事内容の一部変更[500～999人/下請工事（一次）が主である]

追加工事・仕様変更[1,000人以上/元請工事が主である]

追加工事・仕様変更[1,000人以上/元請工事が主である]

2.現場管理費の増大

人件費[100～299人/元請工事が主である]

人件費 各種経費（事務所費、通信費等基本料金）[100～299人/

下請工事（一次）が主である]

人件費[100～299人/下請工事（一次）が主である]

現場管理費（人件費、仮設事務所賃貸費等）[100～299人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

現場経費（人件費、仮設事務所賃貸費等）[100～299人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

現場経費の増[300～499人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

現場管理費の増大[300～499人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

現場経費の増[300～499人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

人件費[500～999人/元請工事が主である]

現場管理費の増大[500～999人/元請工事が主である]

経費（人件費等）[1,000人以上/元請工事が主である]

現場事務所維持運営費[1,000人以上/下請工事（一次）が主である]

経費、人件費の増大[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

建築工事の遅れに伴う増員[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

現場管理費：経費、施工以外の人件費等[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

3.その他

燃料費[10～29人/元請工事が主である]

クラスター発生[30～99人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

契約外の工事だった[100～299人/元請工事が主である]


待機[100～299人/下請工事（一次）が主である]

前施工業者の工程遅れの影響[100～299人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

建築工事の遅れに伴う増員[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

問 4・5-17_増加した工事費に対し交渉は認められたか(S A)


- 交渉を行い、想定した増加費用が認められた
- 交渉を行い、想定した増加費用の一部が認められた
- 交渉したが認められなかった
- 交渉しなかった

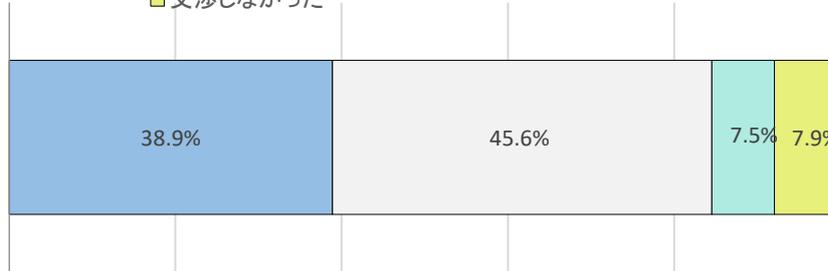

		合計	交渉を行い、想定した増加費用が認められた	交渉を行い、想定した増加費用の一部が認められた	交渉したが認められなかった	交渉しなかった	
全体		504 100.0%	196 38.9%	230 45.6%	38 7.5%	40 7.9%	
完工高	5000万円未満	10 100.0%	4 40.0%	2 20.0%	3 30.0%	1 10.0%	
	5000万円以上 1億円未満	20 100.0%	8 40.0%	4 20.0%	3 15.0%	5 25.0%	
	1億円以上 3億円未満	43 100.0%	19 44.2%	19 44.2%	1 2.3%	4 9.3%	
	3億円以上 5億円未満	40 100.0%	11 27.5%	20 50.0%	3 7.5%	6 15.0%	
	5億円以上 10億円未満	75 100.0%	26 34.7%	36 48.0%	9 12.0%	4 5.3%	
	10億円以上 30億円未満	104 100.0%	45 43.3%	48 46.2%	6 5.8%	5 4.8%	
	30億円以上 50億円未満	36 100.0%	14 38.9%	20 55.6%	0 0.0%	2 5.6%	
	50億円以上	176 100.0%	69 39.2%	81 46.0%	13 7.4%	13 7.4%	
	請負階層	元請工事が主	240 100.0%	110 45.8%	99 41.3%	12 5.0%	19 7.9%
		下請工事 (一次)が主	157 100.0%	56 35.7%	72 45.9%	17 10.8%	12 7.6%
下請工事 (二次以降)が主		35 100.0%	9 25.7%	22 62.9%	3 8.6%	1 2.9%	
元請・下請工事は ほぼ同程度		72 100.0%	21 29.2%	37 51.4%	6 8.3%	8 11.1%	
公共・民間工事	公共工事が ほとんどである	34 100.0%	24 70.6%	8 23.5%	0 0.0%	2 5.9%	
	公共工事が多い	111 100.0%	45 40.5%	51 45.9%	6 5.4%	9 8.1%	
	民間工事が ほとんどである	115 100.0%	38 33.0%	58 50.4%	10 8.7%	9 7.8%	
	民間工事が多い	182 100.0%	74 40.7%	76 41.8%	16 8.8%	16 8.8%	
	公共と民間工事は ほぼ同程度	62 100.0%	15 24.2%	37 59.7%	6 9.7%	4 6.5%	
発注者の属性	不動産業	69 100.0%	27 39.1%	31 44.9%	5 7.2%	6 8.7%	
	住宅メーカー	27 100.0%	6 22.2%	10 37.0%	6 22.2%	5 18.5%	
	卸売	8 100.0%	1 12.5%	7 87.5%	0 0.0%	0 0.0%	
	小売	12 100.0%	5 41.7%	7 58.3%	0 0.0%	0 0.0%	
	金融・保険	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	
	宿泊・飲食	11 100.0%	2 18.2%	7 63.6%	1 9.1%	1 9.1%	
	医療・福祉	38 100.0%	8 21.1%	23 60.5%	6 15.8%	1 2.6%	
	学校教育	19 100.0%	7 36.8%	10 52.6%	1 5.3%	1 5.3%	
	サービス業 (上記以外)	15 100.0%	4 26.7%	9 60.0%	2 13.3%	0 0.0%	
	製造業	77 100.0%	28 36.4%	41 53.2%	0 0.0%	8 10.4%	
	運輸・交通	32 100.0%	19 59.4%	11 34.4%	2 6.3%	0 0.0%	
	情報通信	11 100.0%	7 63.6%	3 27.3%	1 9.1%	0 0.0%	
	電気・ガス・熱供給等	41 100.0%	23 56.1%	12 29.3%	3 7.3%	3 7.3%	
	個人	32 100.0%	13 40.6%	9 28.1%	2 6.3%	8 25.0%	
	その他	100 100.0%	44 44.0%	45 45.0%	6 6.0%	5 5.0%	

問 4・5-18_最終的に利益は確保できたか(S A)

■ 想定利益は確保できた □ 想定利益をやや下回った ■ 想定利益をかなり下回った
■ 赤字となった ■ わからない

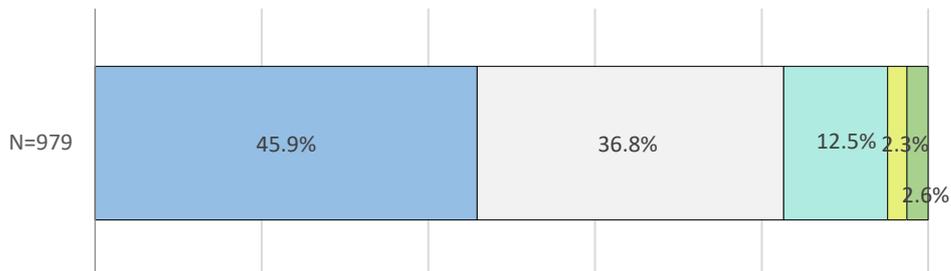


		合計	想定利益は確保できた	想定利益をやや下回った	想定利益をかなり下回った	赤字となった	わからない
全体		979	449	360	122	23	25
		100.0%	45.9%	36.8%	12.5%	2.3%	2.6%
完工高	5000万円未満	33	13	15	4	0	1
		100.0%	39.4%	45.5%	12.1%	0.0%	3.0%
	5000万円以上 1億円未満	49	21	19	5	2	2
		100.0%	42.9%	38.8%	10.2%	4.1%	4.1%
	1億円以上 3億円未満	142	65	55	19	0	3
		100.0%	45.8%	38.7%	13.4%	0.0%	2.1%
	3億円以上 5億円未満	85	29	46	8	1	1
		100.0%	34.1%	54.1%	9.4%	1.2%	1.2%
	5億円以上 10億円未満	143	66	49	21	5	2
	100.0%	46.2%	34.3%	14.7%	3.5%	1.4%	
請負階層	10億円以上 30億円未満	201	79	83	26	4	9
		100.0%	39.3%	41.3%	12.9%	2.0%	4.5%
	30億円以上 50億円未満	57	21	22	9	2	3
		100.0%	36.8%	38.6%	15.8%	3.5%	5.3%
	50億円以上	269	155	71	30	9	4
		100.0%	57.6%	26.4%	11.2%	3.3%	1.5%
	元請工事が主	431	229	140	44	9	9
		100.0%	53.1%	32.5%	10.2%	2.1%	2.1%
	下請工事 (一次)が主	338	136	130	49	10	13
	100.0%	40.2%	38.5%	14.5%	3.0%	3.8%	
公共の割合・民間工事	下請工事 (二次以降)が主	55	20	24	9	2	0
		100.0%	36.4%	43.6%	16.4%	3.6%	0.0%
	元請・下請工事は ほぼ同程度	155	64	66	20	2	3
		100.0%	41.3%	42.6%	12.9%	1.3%	1.9%
	公共工事が ほとんどである	96	49	36	10	0	1
		100.0%	51.0%	37.5%	10.4%	0.0%	1.0%
	公共工事が多い	201	103	65	19	7	7
		100.0%	51.2%	32.3%	9.5%	3.5%	3.5%
	民間工事が ほとんどである	211	94	68	33	8	8
	100.0%	44.5%	32.2%	15.6%	3.8%	3.8%	
発注者の属性	民間工事が多い	319	141	117	48	5	8
		100.0%	44.2%	36.7%	15.0%	1.6%	2.5%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	152	62	74	12	3	1
		100.0%	40.8%	48.7%	7.9%	2.0%	0.7%
	不動産業	102	47	40	11	3	1
		100.0%	46.1%	39.2%	10.8%	2.9%	1.0%
	住宅メーカー	68	25	32	10	0	1
		100.0%	36.8%	47.1%	14.7%	0.0%	1.5%
	卸売	13	9	2	2	0	0
		100.0%	69.2%	15.4%	15.4%	0.0%	0.0%
	小売	24	10	11	2	0	1
		100.0%	41.7%	45.8%	8.3%	0.0%	4.2%
	金融・保険	6	4	1	0	1	0
		100.0%	66.7%	16.7%	0.0%	16.7%	0.0%
	宿泊・飲食	24	7	10	3	1	3
		100.0%	29.2%	41.7%	12.5%	4.2%	12.5%
医療・福祉	64	14	23	22	3	2	
	100.0%	21.9%	35.9%	34.4%	4.7%	3.1%	
学校教育	38	18	14	5	0	1	
	100.0%	47.4%	36.8%	13.2%	0.0%	2.6%	
サービス業 (上記以外)	33	12	10	10	0	1	
	100.0%	36.4%	30.3%	30.3%	0.0%	3.0%	
製造業	151	84	49	12	3	3	
	100.0%	55.6%	32.5%	7.9%	2.0%	2.0%	
運輸・交通	58	33	16	5	2	2	
	100.0%	56.9%	27.6%	8.6%	3.4%	3.4%	
情報通信	21	11	6	2	1	1	
	100.0%	52.4%	28.6%	9.5%	4.8%	4.8%	
電気・ガス・熱供給等	63	32	26	4	1	0	
	100.0%	50.8%	41.3%	6.3%	1.6%	0.0%	
個人	84	40	31	11	1	1	
	100.0%	47.6%	36.9%	13.1%	1.2%	1.2%	
その他	192	90	73	18	6	5	
	100.0%	46.9%	38.0%	9.4%	3.1%	2.6%	

適正工期確保や生産性向上に向けた取組

問 6-1_中建審「工期に関する基準」の周知について(SA)


おおよその内容を知っている
 聞いたことはあるが内容はわからない
 知らない

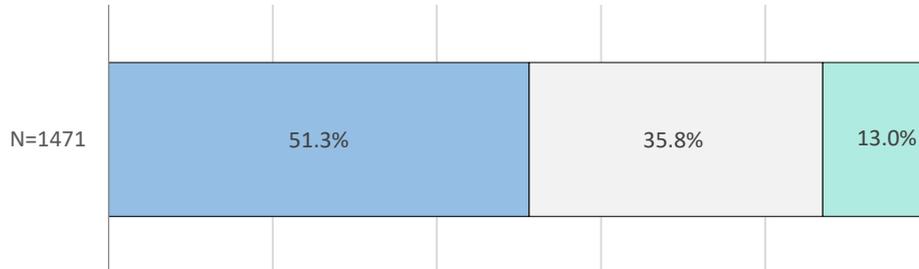

		合計	おおよその内容を知っている	聞いたことはあるが内容はわからない	知らない
全体		1471 100.0%	754 51.3%	526 35.8%	191 13.0%
完工高	5000 万円未満	63 100.0%	12 19.0%	32 50.8%	19 30.2%
	5000 万円以上 1 億円未満	90 100.0%	28 31.1%	30 33.3%	32 35.6%
	1 億円以上 3 億円未満	264 100.0%	84 31.8%	123 46.6%	57 21.6%
	3 億円以上 5 億円未満	168 100.0%	71 42.3%	72 42.9%	25 14.9%
	5 億円以上 10 億円未満	242 100.0%	124 51.2%	93 38.4%	25 10.3%
	10 億円以上 30 億円未満	318 100.0%	195 61.3%	104 32.7%	19 6.0%
	30 億円以上 50 億円未満	80 100.0%	54 67.5%	24 30.0%	2 2.5%
	50 億円以上	246 100.0%	186 75.6%	48 19.5%	12 4.9%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	450 60.6%	238 32.1%
下請工事 (一次) が主		451 100.0%	184 40.8%	179 39.7%	88 19.5%
下請工事 (二次以降) が主		78 100.0%	23 29.5%	30 38.5%	25 32.1%
元請・下請工事は ほぼ同程度		200 100.0%	97 48.5%	79 39.5%	24 12.0%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	143 61.6%	76 32.8%	13 5.6%
	公共工事が多い	379 100.0%	232 61.2%	115 30.3%	32 8.4%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	96 37.2%	102 39.5%	60 23.3%
	民間工事が多い	408 100.0%	194 47.5%	159 39.0%	55 13.5%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	89 45.9%	74 38.1%	31 16.0%


問 6-2_工期の適正な設定に関する状況に変化はあったか(S A)

- 適正な工期の工事受注が増えている 短い工期の工事受注が増えている
 あまり大きな変化はない

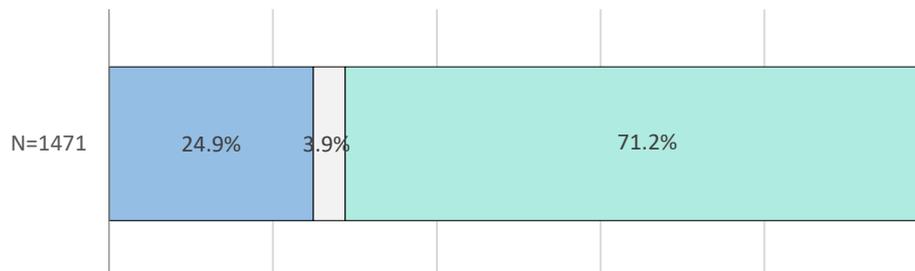

		合計	適正な工期の工事受注が増えている	短い工期の工事受注が増えている	あまり大きな変化はない
全体		1471 100.0%	367 24.9%	57 3.9%	1047 71.2%
完工高	5000 万円未満	63 100.0%	20 31.7%	5 7.9%	38 60.3%
	5000 万円以上 1 億円未満	90 100.0%	23 25.6%	2 2.2%	65 72.2%
	1 億円以上 3 億円未満	264 100.0%	63 23.9%	9 3.4%	192 72.7%
	3 億円以上 5 億円未満	168 100.0%	38 22.6%	7 4.2%	123 73.2%
	5 億円以上 10 億円未満	242 100.0%	63 26.0%	14 5.8%	165 68.2%
	10 億円以上 30 億円未満	318 100.0%	82 25.8%	13 4.1%	223 70.1%
	30 億円以上 50 億円未満	80 100.0%	24 30.0%	0 0.0%	56 70.0%
	50 億円以上	246 100.0%	54 22.0%	7 2.8%	185 75.2%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	203 27.4%	21 2.8%
下請工事 (一次) が主		451 100.0%	102 22.6%	19 4.2%	330 73.2%
下請工事 (二次以降) が主		78 100.0%	15 19.2%	9 11.5%	54 69.2%
元請・下請工事は ほぼ同程度		200 100.0%	47 23.5%	8 4.0%	145 72.5%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	86 37.1%	2 0.9%	144 62.1%
	公共工事が多い	379 100.0%	109 28.8%	11 2.9%	259 68.3%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	52 20.2%	16 6.2%	190 73.6%
	民間工事が多い	408 100.0%	86 21.1%	18 4.4%	304 74.5%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	34 17.5%	10 5.2%	150 77.3%

問 6-3_適正な工期設定の確保のために必要なことは何か(MA)

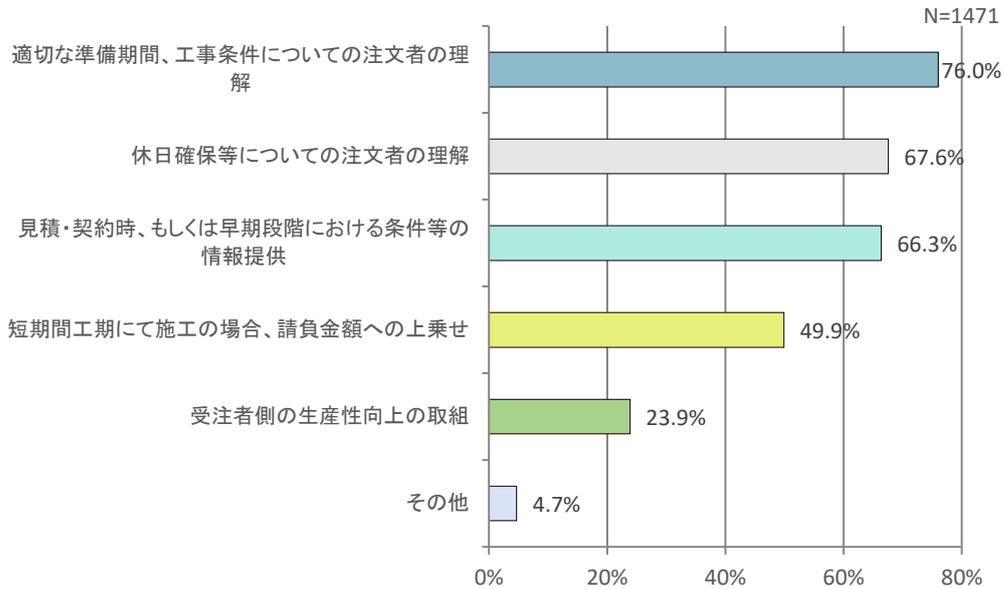

		合計	見積・契約時、もしくは早期段階における条件等の情報提供	適切な準備期間、工事条件についての注文者の理解	休日確保等についての注文者の理解	短期間工期にて施工の場合、請負金額への上乗せ	受注者側の生産性向上の取組	その他
全体		1471	976	1118	994	734	351	69
		100.0%	66.3%	76.0%	67.6%	49.9%	23.9%	4.7%
完工高	5000万円未満	63	40	47	31	23	6	2
		100.0%	63.5%	74.6%	49.2%	36.5%	9.5%	3.2%
	5000万円以上 1億円未満	90	57	59	51	47	18	4
		100.0%	63.3%	65.6%	56.7%	52.2%	20.0%	4.4%
	1億円以上 3億円未満	264	172	198	165	136	57	13
		100.0%	65.2%	75.0%	62.5%	51.5%	21.6%	4.9%
	3億円以上 5億円未満	168	117	122	99	95	31	5
		100.0%	69.6%	72.6%	58.9%	56.5%	18.5%	3.0%
5億円以上 10億円未満	242	153	166	149	100	55	12	
	100.0%	63.2%	68.6%	61.6%	41.3%	22.7%	5.0%	
10億円以上 30億円未満	318	216	256	229	162	77	11	
	100.0%	67.9%	80.5%	72.0%	50.9%	24.2%	3.5%	
30億円以上 50億円未満	80	48	67	58	37	20	7	
	100.0%	60.0%	83.8%	72.5%	46.3%	25.0%	8.8%	
50億円以上	246	173	203	212	134	87	15	
	100.0%	70.3%	82.5%	86.2%	54.5%	35.4%	6.1%	
請負階層	元請工事が主	742	493	597	515	348	182	29
		100.0%	66.4%	80.5%	69.4%	46.9%	24.5%	3.9%
	下請工事 (一次)が主	451	301	330	288	237	103	24
		100.0%	66.7%	73.2%	63.9%	52.5%	22.8%	5.3%
下請工事 (二次以降)が主	78	55	46	52	55	18	9	
	100.0%	70.5%	59.0%	66.7%	70.5%	23.1%	11.5%	
元請・下請工事は ほぼ同程度	200	127	145	139	94	48	7	
	100.0%	63.5%	72.5%	69.5%	47.0%	24.0%	3.5%	
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232	161	173	146	101	55	8
		100.0%	69.4%	74.6%	62.9%	43.5%	23.7%	3.4%
	公共工事が多い	379	244	286	248	173	79	17
		100.0%	64.4%	75.5%	65.4%	45.6%	20.8%	4.5%
	民間工事が ほとんどである	258	167	193	179	135	68	12
	100.0%	64.7%	74.8%	69.4%	52.3%	26.4%	4.7%	
民間工事が多い	408	272	311	287	227	112	26	
	100.0%	66.7%	76.2%	70.3%	55.6%	27.5%	6.4%	
公共と民間工事は ほぼ同程度	194	132	155	134	98	37	6	
	100.0%	68.0%	79.9%	69.1%	50.5%	19.1%	3.1%	

「その他」の記述から

1. 施主・発注者の理解

受注者側が適正な労務単価で発注してくれること[5~9人/元請工事が主である]

設計会社のスムーズな対応[10~29人/元請工事が主である]

発注者側の理解[10~29人/下請工事（二次以降）が主である]

下請に押し付けようとする考え方の改め[30~99人/下請工事（一次）が主である]

元請業者の適正価格での工事受注および建設業全体の作業員の確保[30~99人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

設計者への周知[100~299人/元請工事が主である]

施主およびゼネコンによる設備工事試運転調整期間の十分な確保への理解[100~299人/下請工事（一次）が主である]

発注者側の理解[500~999人/下請工事（一次）が主である]

2. 短い工期などへの罰則・法整備、現実的な工程管理

適正な発注時期の構築。[5~9人/元請工事が主である]

設備業が休日に施工しないような工程管理をすること[5~9人/下請工事（一次）が主である]

適切な工程管理の確保、順守[5~9人/下請工事（一次）が主である]

建築側の勝手な都合ばかりでなく設備工事も余裕ある工程にして頂きたい。[5~9人/下請工事（二次以降）が主である]

発注者側への短工期契約禁止（助成金を出す場合の条件に加えるなど）[10~29人/下請工事（一次）が主である]

変更追加をすれば工期を伸ばす。

前工程の期日を守る。[10~29人/下請工事（一次）が主である]

全ての工事を週休2日制にて施工されること。[10~29人/下請工事（一次）が主である]

冬に仕上げ工事をしない[10~29人/下請工事（一次）が主である]

各工程（特に建築）の遅延をなくす[10~29人/下請工事（二次以降）が主である]

工事業者の工程調整と工程通りの施工[10~29人/下請工事（二次以降）が主である]

工程に余裕のある前工程からの徹底した工程管理。[10~29人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

国は各自治体に週休2日制の理解を深め適切な工期の設定をうながす努力をすること[30~99人/元請工事が主である]

工期設定を何度も行わない事。（工程の変更が大きいと元も子も無い為。）[30~99人/下請工事（一次）が主である]

年末、年度末に完成時期を集中させない工事発注[30~99人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

官公庁の竣工日ありきの工期設定をやめてもらう[100~299人/元請工事が主である]

発注官公庁の工期設定（早期着工）[100~299人/元請工事が主である]

工期算出方法の統一化[100~299人/元請工事が主である]

発注者への強い指導[500~999人/元請工事が主である]

材料納期を考慮した注文書工期の設定[500~999人/元請工事が主である]

施主側の法整備[500~999人/下請工事（一次）が主である]

4週8休と祭日を前提とした工期設定の法制化、罰則の制定[500~999人/下請工事（二次以降）が主である]

無理な工期設定に対する発注者、元請への罰則[1,000人以上/元請工事が主である]

入札・設計施工分離方式における適正工期の交渉、適正な設計スケジュールの確保[1,000人以上/元請工事が主である]

設計制度の向上および工事内容変更に対する工期の確保[1,000人以上/下請工事（一次）が主である]

設計変更による工期・増額の配慮[1,000人以上/下請工事（一次）が主である]

3. 人材確保・育成、労務費の増加

人材の確保[2~4人/下請工事（一次）が主である]

作業員の能力向上[10~29人/元請工事が主である]

下請け労務者の労務単価が低いと、週休二日は成り立たない。[10~29人/元請工事が主である]

職人不足による前工程の遅れ[10~29人/下請工事（一次）が主である]

4週8休の工期が適正であれば日給月額額の減少になるので単価の上乗せ[10~29人/下請工事（一次）が主である]

少子高齢化による作業員の減少と作業員の高齢化による作業効率の低下の現実を反映する[10~29人/下請工事（一次）が主である]

日給労働者の月給への移行又は週休2日制とした賃金の上乗せ[30~99人/元請工事が主である]

交通誘導員の適正配置並びに確保[30~99人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

作業員の年収増額[100~299人/下請工事（一次）が主である]

4. その他

中央と地方請け負い企業との標準化の是正。（地方には地方なりの問題が山積するcf若年層の地方離れで職人不足、育成困難高齢化、暴風雪による諸経費の加算、請負数の中央との格差、等、中央発注標準工期での統一性は疑問）[2~4人/下請工事（一次）が主である]

工事が10件以上同時に動いているので1件の工事だけうまくいっても休日の調整ができない[5~9人/元請工事が主である]

自治体の補助金を受ける事業における、着工時期の見直し（着工が遅いのにも年度末完工を迫らない）[10~29人/元請工事が主である]

コロナの終息[10~29人/元請工事が主である]

設計段階で仮設工事の検討を業者を交えて検討してほしい。[10~29人/元請工事が主である]

長い工期があっても、降雪時期に工事を行いたくないので、降雪時期前の休日の確保が困難[10~29人/元請工事が主である]

新工法の検討・受け入れ
機械・設備の充実[10～29人／下請工事（一次）が主である]

下請けで週休二日制が定着できていない[10～29人／下請工事（一次）が主である]

公共工事における単年度予算の変更の試み[10～29人／下請工事（一次）が主である]

高速道路修繕工事の在り方の検討[10～29人／下請工事（一次）が主である]

DX化による情報共有[10～29人／下請工事（二次以降）が主である]

そもそも予定通りに行くことなどないという考えを持つこと[10～29人／下請工事（二次以降）が主である]

予算。全ては予算による。十分な予算があれば、職人にもたくさん休ませれるし、職人も休む事に嫌悪感を持たなくなる。[30～99人／元請工事が主である]

設計段階での現場調査、支障物件等の調整など。[30～99人／元請工事が主である]

週休二日制について下請け業者の理解と協力[30～99人／元請工事が主である]

建築民間工事（公共工事含む）の週休2日を実現しないと業界全体の改善に繋がらないと思います[30～99人／元請工事が主である]

工期の短縮はゼネコンが恣意的に行っている。後期遅延による違約

金の廃止と設備工事業者の地位向上が行われない現状は変化しません。[30～99人／下請工事（二次以降）が主である]

回答4の『施工せざる負えない場合』が無くなるよう意識改革が必要と感じる。[30～99人／元請・下請工事はほぼ同程度である]

受注者側の理解[100～299人／元請工事が主である]

設計段階での関連業種との調整と設計変更時の早期展開[100～299人／元請工事が主である]

エレベーターは設備工事なので、建築関連工事で、着工時期が遅れる場合がある[100～299人／元請工事が主である]

条件変更が発生した場合の適切な対応[100～299人／元請工事が主である]

気象・海象における実稼働[100～299人／下請工事（一次）が主である]


建設業界全体として足並みをそろえる。[1,000人以上／元請工事が主である]

担当者、作業員不足の理解[1,000人以上／元請・下請工事はほぼ同程度である]

条件変更が発生した場合の適切な対応[100～299人／元請工事が主である]

気象・海象における実稼働[100～299人／下請工事（一次）が主である]

問 6-4_長時間労働の是正や週休 2 日の確保に向けて自ら推進している取組(M A)

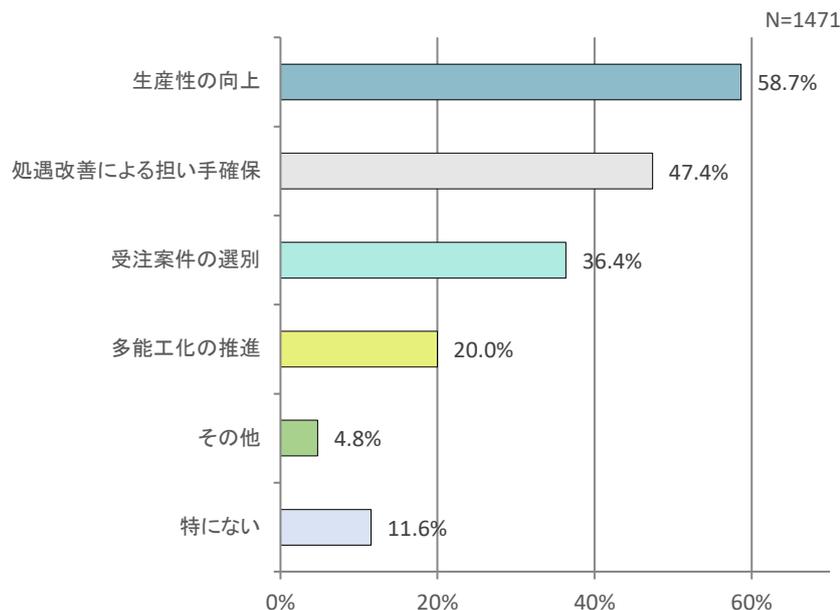

		合計	生産性の向上	多能工化の推進	処遇改善による担い手確保	受注案件の選別	その他	特にない
全体		1471 100.0%	863 58.7%	294 20.0%	697 47.4%	535 36.4%	70 4.8%	170 11.6%
完工高	5000 万円未満	63 100.0%	24 38.1%	11 17.5%	26 41.3%	15 23.8%	1 1.6%	17 27.0%
	5000 万円以上 1 億円未満	90 100.0%	37 41.1%	14 15.6%	44 48.9%	27 30.0%	4 4.4%	14 15.6%
	1 億円以上 3 億円未満	264 100.0%	122 46.2%	50 18.9%	138 52.3%	88 33.3%	9 3.4%	46 17.4%
	3 億円以上 5 億円未満	168 100.0%	84 50.0%	37 22.0%	88 52.4%	66 39.3%	7 4.2%	15 8.9%
	5 億円以上 10 億円未満	242 100.0%	138 57.0%	53 21.9%	113 46.7%	79 32.6%	6 2.5%	32 13.2%
	10 億円以上 30 億円未満	318 100.0%	196 61.6%	70 22.0%	150 47.2%	129 40.6%	10 3.1%	27 8.5%
	30 億円以上 50 億円未満	80 100.0%	53 66.3%	15 18.8%	42 52.5%	27 33.8%	3 3.8%	12 15.0%
	50 億円以上	246 100.0%	209 85.0%	44 17.9%	96 39.0%	104 42.3%	30 12.2%	7 2.8%
	請負階層	元請工事が主	742 100.0%	455 61.3%	144 19.4%	325 43.8%	281 37.9%	33 4.4%
下請工事 (一次) が主		451 100.0%	249 55.2%	90 20.0%	238 52.8%	155 34.4%	21 4.7%	54 12.0%
下請工事 (二次以降) が主		78 100.0%	38 48.7%	12 15.4%	40 51.3%	25 32.1%	6 7.7%	12 15.4%
元請・下請工事は ほぼ同程度		200 100.0%	121 60.5%	48 24.0%	94 47.0%	74 37.0%	10 5.0%	22 11.0%
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232 100.0%	134 57.8%	55 23.7%	105 45.3%	74 31.9%	8 3.4%	28 12.1%
	公共工事が多い	379 100.0%	223 58.8%	73 19.3%	179 47.2%	134 35.4%	8 2.1%	48 12.7%
	民間工事が ほとんどである	258 100.0%	142 55.0%	53 20.5%	122 47.3%	89 34.5%	18 7.0%	35 13.6%
	民間工事が多い	408 100.0%	261 64.0%	72 17.6%	185 45.3%	169 41.4%	28 6.9%	40 9.8%
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194 100.0%	103 53.1%	41 21.1%	106 54.6%	69 35.6%	8 4.1%	19 9.8%

「その他」の記述から

1.協力会社や人材の確保、育成

人材不足の是正[2~4人/下請工事(一次)が主である]

新規入職者の獲得と教育[5~9人/下請工事(一次)が主である]

求人募集をかけている。[5~9人/下請工事(二次以降)が主である]

従業員の増員[5~9人/下請工事(二次以降)が主である]

人材確保[10~29人/下請工事(一次)が主である]

協力業者への外注[10~29人/下請工事(一次)が主である]

技術者の採用活動[30~99人/元請工事が主である]

必要人材の確保、採用[30~99人/元請工事が主である]

人員の増員を考えて求人を行っている[30~99人/元請工事が主である]

職員増による、一人当たり業務量の負担軽減[30~99人/元請工事が主である]

配置職員の増員[100~299人/元請工事が主である]

高齢者人材の活用[100~299人/元請工事が主である]

現場支援部署の設置[300~499人/元請工事が主である]

複数人担当体制[300~499人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

交代制により確保[300~499人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

多人数での現場管理[500~999人/下請工事(一次)が主である]

技能者の能力向上(生産性の向上を目的)[1,000人以上/元請工事が主である]

現業支援体制の強化[1,000人以上/元請工事が主である]

アウトソーシングの利用[1,000人以上/元請工事が主である]

職員の増員による交代出勤。[1,000人以上/元請工事が主である]

支援チームによる支援[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

アウトソーシング、オフサイド化の推進[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

2.ノー残業デーや定休日の設定、柔軟な勤務形態の導入

福利厚生・人員体制の改善[2~4人/下請工事(一次)が主である]

変形労働時間による年間通じての週休二日制の確保[10~29人/下請工事(一次)が主である]

ノー残業デーの推進(注文者・発注者への協力依頼)[10~29人/下請工事(一次)が主である]

定休日の設定[10~29人/下請工事(一次)が主である]

冬場は暗くなるのが早いので、早上がりをしている。[10~29人/下請工事(一次)が主である]

週休2日を実施している[10~29人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

4週8休の達成を指示している。[30~99人/元請工事が主である]

週休2日確保に向けた就業規則の改定[30~99人/元請工事が主である]

原則、第一土曜日 作業所閉鎖[100~299人/元請工事が主である]

各従業員休日取得日数を管理し取得が少ない個人へ休日取得指導[100~299人/元請工事が主である]

作業所全休日の設定、ノー残業デーの実施[100~299人/元請工事が主である]

毎月超過労働時間と有給取得状況を確認し、社内で協力調整して特定の担当者だけに負荷がかかることを無いうように努力するよう呼び掛けている。[100~299人/下請工事(一次)が主である]

振替休日の推奨[100~299人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

ノー残業デーの推奨、有給休暇取得に向けた社内での管理、可視化。[500~999人/元請工事が主である]

有給休暇取得の義務化と推進[1,000人以上/元請工事が主である]

交代制での休日取得[1,000人以上/下請工事(一次)が主である]

3. ICT 化など業務負担の軽減

生産性向上ソフトの導入[10~29人/元請工事が主である]

ICTツール等による情報共有による対応の迅速化[10~29人/下請工事(二次以降)が主である]

屋外広告物点検業務のドローン利用について勉強中である。また、業務管理ソフトや LINEWORKS の導入による情報共有一元化と、iPad による勤怠管理システムの導入によって労働時間の可視化を進めている。[10~29人/下請工事(二次以降)が主である]

業務のロボット化[30~99人/元請工事が主である]

ズーム等による会議で、労働時間の短縮を目指している[100~299人/元請工事が主である]

ICTの活用、現場員の増員[100~299人/元請工事が主である]

ICT(情報通信技術)の活用[500~999人/下請工事(二次以降)が主である]

リモートによる支援、店社からのバックアップ[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]

4.その他

顧客の選別[5~9人/元請工事が主である]

基本給見直し・勤怠システム導入[10~29人/元請工事が主である]

経費節減と元請への値上げ交渉(有給休暇の費用確保の説明)[10~29人/下請工事(一次)が主である]

職人の手当[10~29人/下請工事(一次)が主である]

業界での陳情(県、地元元請)[10~29人/下請工事(一次)が主である]
考えられる事は、全て取り組んでいる[10~29人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

休日を踏まえた工程計画の検討[30~99人/元請工事が主である]

適正な工程確保[30~99人/元請工事が主である]

休日数の確保を見込んだ工期の設定[30~99人/元請工事が主である]

適正な工期設定の申し入れ。[30~99人/下請工事(一次)が主である]

交代制[30~99人/下請工事(一次)が主である]

協力業者との交渉[100~299人/元請工事が主である]

計画段階での工程調整[100~299人/元請工事が主である]

休暇取得に向けて施工計画の立案[100~299人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

施工現場への内勤支援[300~499人/元請工事が主である]

工程調整[300~499人/元請・下請工事はほぼ同程度である]


適正工期の確保等[1,000人以上/元請工事が主である]

設計施工一貫方式におけるフロントローディング[1,000人以上/元請工事が主である]

業務の社内平準化[1,000人以上/下請工事(一次)が主である]

「働き方改革プロジェクト」による啓蒙・情報共有[1,000人以上/下請工事(一次)が主である]

問 6-5_取り組んでいる生産性向上に資する取組(MA)

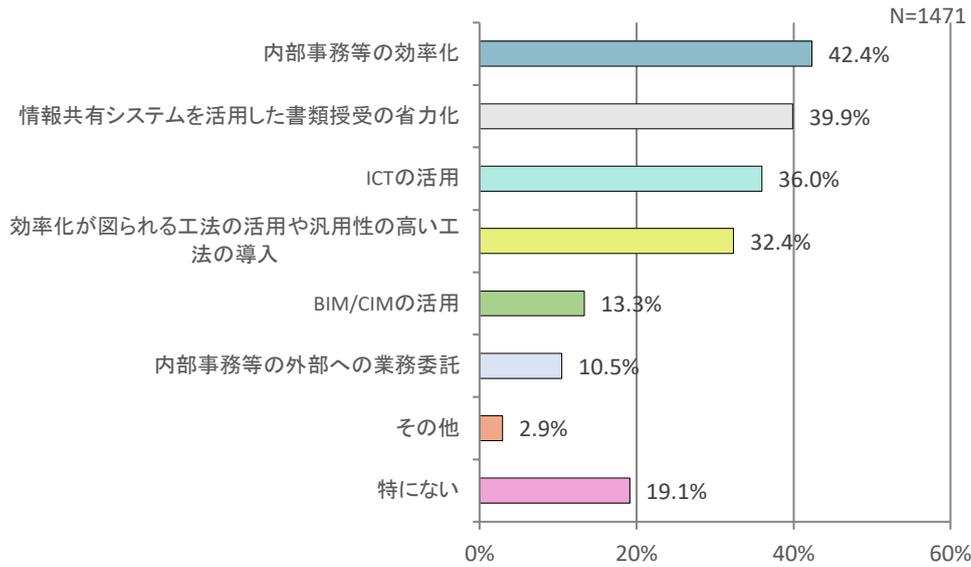

		合計	ICTの活用	BIM/CIMの活用	内部事務等の効率化	情報共有システムを活用した書類授受の省力化	工法活用や汎用性の高い工法の導入	内部事務等の外部への業務委託	その他	特にない
全体		1471	529	196	623	587	476	154	43	281
完工高	5000万円未満	63	12	2	14	12	19	4	1	24
	5000万円以上 1億円未満	90	15	2	19	22	31	3	2	33
	1億円以上 3億円未満	264	50	9	76	73	84	9	10	79
	3億円以上 5億円未満	168	38	5	76	69	44	12	3	34
	5億円以上 10億円未満	242	72	5	102	93	72	20	3	46
	10億円以上 30億円未満	318	133	43	148	136	91	26	10	44
	30億円以上 50億円未満	80	42	11	32	34	29	5	5	14
	50億円以上	246	167	119	156	148	106	75	9	7
請負階層	元請工事が主	742	337	130	336	313	198	88	16	124
	下請工事が主 (一次)が主	451	103	36	174	167	173	33	15	106
	下請工事が主 (二次以降)が主	78	14	4	24	23	32	7	3	19
	元請・下請工事は ほぼ同程度	200	75	26	89	84	73	26	9	32
公共・民間工事の割合	公共工事が ほとんどである	232	115	17	79	102	56	19	7	40
	公共工事が多い	379	154	47	166	156	107	31	7	71
	民間工事が ほとんどである	258	69	31	108	104	91	31	4	59
	民間工事が多い	408	134	75	192	161	157	59	20	70
	公共と民間工事は ほぼ同程度	194	57	26	78	64	65	14	5	41

「その他」の記述から

1.人材の確保、育成

新規入職者の獲得と教育[5~9人/下請工事(一次)が主である]

自社職人の育成[5~9人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

中途技術者(即戦力)の採用[30~99人/元請工事が主である]

社員の意識改革[30~99人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

職員の意識改革[30~99人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

現場採用の事務員[100~299人/元請工事が主である]

新規入職者の獲得と教育[5~9人/下請工事(一次)が主である]

自社職人の育成[5~9人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

中途技術者(即戦力)の採用[30~99人/元請工事が主である]

社員の意識改革[30~99人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

2.充実した設備の利用、導入

加工機械設備投資[10~29人/下請工事(一次)が主である]

オートCADの導入、残業の抑制[10~29人/下請工事(一次)が主である]

先端設備の導入[10~29人/下請工事(一次)が主である]

新設備の導入[10~29人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

工事写真ソフトの導入[30~99人/元請工事が主である]

工事管理ソフト・機材の導入[30~99人/下請工事(一次)が主である]

設備の自動化、ロボットの増強[30~99人/下請工事(一次)が主である]

機械や施工方法改善による省人化[100~299人/下請工事(一次)が主である]

土木部では、ICTの活用を行っている。[100~299人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

インターネット上で共有できる管理ソフトの利用[500~999人/元請工事が主である]

施工管理ソフトの導入、便利なツールの活用、それらの活用頻度を上げる教育[500~999人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

高効率機械の採用等[1,000人以上/元請工事が主である]

3.分業や外注など業務負荷の分散

社長を含む役員が残業して作業を行う[1人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

建設ディレクター養成による書類作成業務と施工の分離[10~29人/元請工事が主である]

仕事の分担[10~29人/下請工事(二次以降)が主である]

協力業者の充実を図る[10~29人/元請・下請工事はほぼ同程度である]

測量等の外部への業務委託[30~99人/元請工事が主である]

協力業者の理解、協力要請[1,000人以上/元請工事が主である]

施工管理における非コア業務のアウトソーシング[1,000人以上/

元請工事が主である]

各業務の分担化、職員(派遣含む)の増員[1,000人以上/下請工事(一次)が主である]

4.その他

現場の報告連絡相談を緊密に行っている。毎日全員で工程会議を行っている。[5~9人/元請工事が主である]

製作作業・取付業務の効率化及びその検討[5~9人/下請工事(二次以降)が主である]

新技術の活用[10~29人/元請工事が主である]

施工計画(人員・使用材の量の計画)[10~29人/下請工事(一次)が主である]

元請、設計監理者へのVE案の提案[10~29人/下請工事(一次)が主である]

元請施工計画時の打合せの実施[10~29人/下請工事(一次)が主である]

工期がない現場の仕事は受けない[10~29人/下請工事(一次)が主である]

従来の施工作业工程を見直し、身体的負担を少しでも軽くするためのマニュアル作成[10~29人/下請工事(二次以降)が主である]

事前アセンブリ[30~99人/元請工事が主である]

女性の現場活躍[30~99人/元請工事が主である]

社内施工検討会での検討[100~299人/元請工事が主である]

改善提案活動の再徹底[100~299人/元請工事が主である]

他事業所における好事例の展開[1,000人以上/元請・下請工事はほぼ同程度である]
